
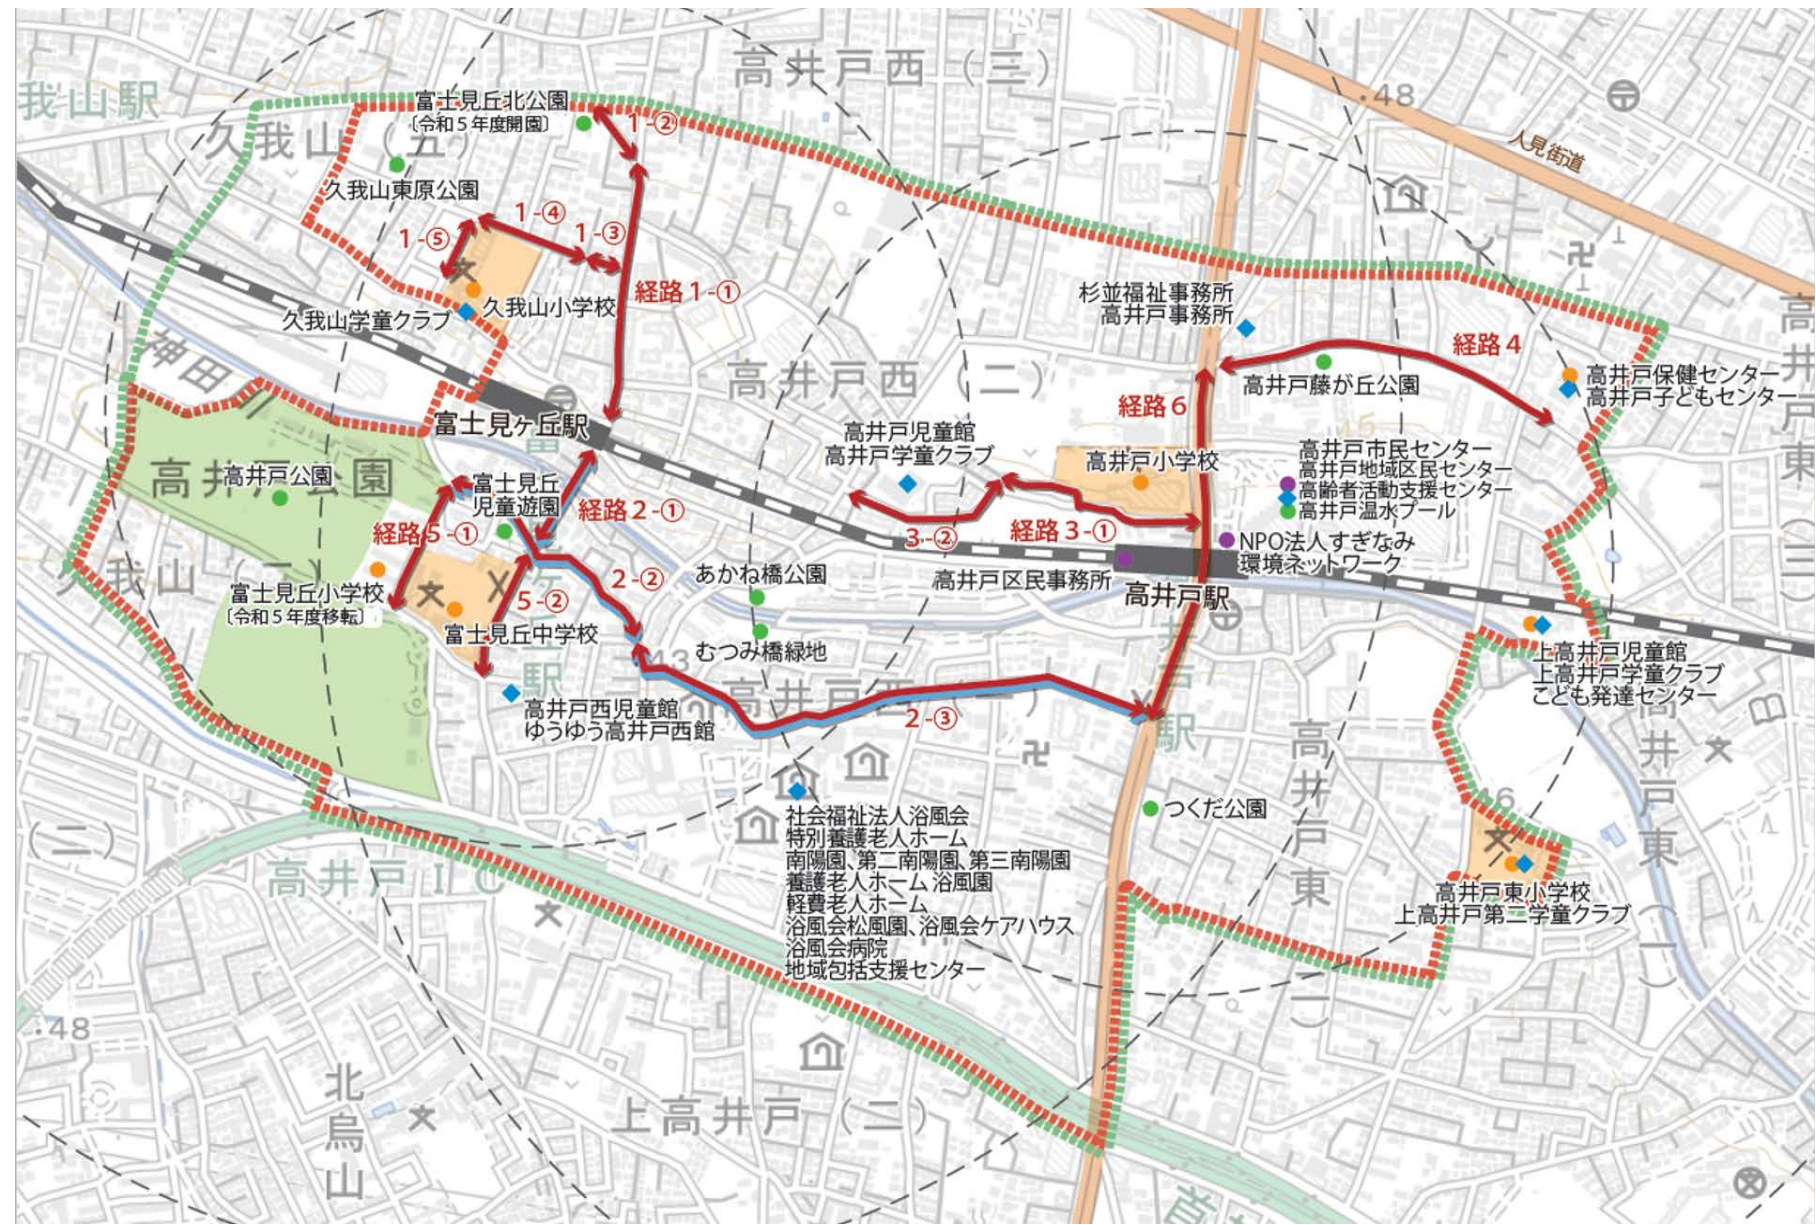


3. 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区

[地区区域]



[生活関連施設]

| 施設種別     |    | 施設名                                                               |                                                                      |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 鉄道駅      |    | 富士見ヶ丘駅                                                            | 高井戸駅                                                                 |
| ●教育・文化施設 | 学校 | 久我山小学校                                                            | 高井戸東小学校                                                              |
|          |    | 富士見丘中学校                                                           | 富士見丘小学校〔令和5年移転〕                                                      |
|          |    | 高井戸小学校                                                            |                                                                      |
| ●官公庁     |    | 高井戸区民事務所<br>高井戸地域区民センター<br>NPO 法人すぎなみ環境ネットワーク                     |                                                                      |
| ◆保健・福祉施設 |    | 久我山学童クラブ<br>こども発達センター<br>高井戸学童クラブ<br>上高井戸児童館<br>高井戸児童館<br>高井戸西児童館 | 高井戸子どもセンター<br>高齢者活動支援センター<br>高井戸保健センター<br>杉並福祉事務所高井戸事務所<br>ゆうゆう高井戸西館 |
| ●公園・運動施設 |    | 久我山東原公園<br>富士見丘児童遊園<br>あかね橋公園<br>むつみ橋緑地<br>高井戸藤が丘公園               | つくだ公園<br>富士見丘北公園<br>高井戸公園<br>高井戸温水プール                                |

※特定事業対象施設

[生活関連経路]

| 経路   | 路線名           | 生活関連施設                                                                        | 備考   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 経路 1 | ①区道 2133-1 号線 | 富士見ヶ丘駅、富士見丘北公園、久我山小学校                                                         |      |
|      | ②区道 1350 号線   |                                                                               |      |
|      | ③区道 1709 号線   |                                                                               |      |
|      | ④区道 2051 号線   |                                                                               |      |
|      | ⑤区道 2374 号線   |                                                                               |      |
| 経路 2 | ①区道 2133-1 号線 | 富士見ヶ丘駅、高井戸公園、富士見丘児童遊園                                                         | 特定道路 |
|      | ②区道 1340 号線   |                                                                               | 特定道路 |
|      | ③区道 1864 号線   |                                                                               | 特定道路 |
| 経路 3 | ①区道 1356 号線   | 高井戸駅、高井戸児童館、高井戸小学校                                                            |      |
|      | ②区道 2584 号線   |                                                                               |      |
| 経路 4 | ①区道 1865 号線   | 高井戸駅、高井戸保健センター<br>高井戸こどもセンター                                                  |      |
| 経路 5 | ①区道 1340 号線   | 富士見丘中学校、富士見丘小学校                                                               |      |
|      | ②区道 2133-1 号線 |                                                                               |      |
| 経路 6 | ①環状 8 号線      | 高井戸駅、NPO 法人すぎなみ環境ネットワーク、高井戸小学校、高井戸地域区民センター、高井戸活動支援センター、高井戸温水プール、杉並福祉事務所高井戸事務所 | 都道   |

| 対象地区  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |      | 特定事業                                        | 公共交通特定事業           | 事業主体 | 京王電鉄(株)     |            |      |    |    |    |    |    |     |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月9日      |               |                                                                           |  |
|-------|-----------------|------|---------------------------------------------|--------------------|------|-------------|------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| カテゴリー | 分類              | 整備対象 | 事業内容                                        | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度） |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況          |               |                                                                           |  |
|       |                 |      |                                             |                    |      |             | 計画         | 前期   |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |           |               |               |                                                                           |  |
|       |                 |      |                                             |                    |      |             |            | 調達方法 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12       | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）  |  |
| 鉄道駅   | トイレ             | 高井戸駅 | バリアフリースイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新               | 1カ所                |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。                                                      |  |
| 鉄道駅   | トイレ             | 高井戸駅 | 利用者マナーの啓発                                   | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | バリアフリースイレのマナー啓発ポスターの掲出を実施。                                                |  |
| 鉄道駅   | ホーム             | 高井戸駅 | CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施     | 1面2線               |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。                                                 |  |
| 鉄道駅   | ホーム             | 高井戸駅 | JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新               | 1面2線               |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。                                          |  |
| 鉄道駅   | ホーム             | 高井戸駅 | 乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置      | 1面2線               |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 2025年度に可動式ホーム柵の整備を完了する。<br>可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。           |  |
| 鉄道駅   | ホーム             | 高井戸駅 | ホームドアの設置                                    | 1面2線               |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 2025年度に可動式ホーム柵の整備を完了する。<br>可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。           |  |
| 鉄道駅   | 教育啓発            | 高井戸駅 | サービス介助士等の資格の取得を推進                           | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 鉄道部門従業員に取得させていた「サービス介助士」を「ユニバーサルマナー検定（鉄道）」に切り替え、定期異動者などに対して今後も取得推進を継続する。  |  |
| 鉄道駅   | 教育啓発            | 高井戸駅 | 駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 障がいをお持ちの方にご協力頂き、ご案内方法について机上訓練や実地教育を実施している。                                |  |
| 鉄道駅   | 券売機             | 高井戸駅 | 券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置                        | 2カ所                |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 自動券売機2台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。                                             |  |
| 鉄道駅   | 車両              | 高井戸駅 | 車両更新（車両新造・車両全面改良時）にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 2・9編成              |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 1列車1以上の車いすスペース、案内表示を全2・9編成設置済。<br>1列車2以上の車いすスペースは1・5編成設置済（H30改訂）、全面改修で対応。 |  |
| 鉄道駅   | 車両              | 高井戸駅 | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 2・9編成              |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。                                                      |  |
| 鉄道駅   | 情報伝達            | 高井戸駅 | ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供               | 随時                 |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | ホームページに「バリアフリー化の取り組み」として掲載している。                                           |  |
| 鉄道駅   | 情報伝達            | 高井戸駅 | 出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等                        | 随時                 |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |  |
| 鉄道駅   | 情報伝達            | 高井戸駅 | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新                   | 随時                 |      | －<br>自己資金   | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |  |
| 鉄道駅   | 情報伝達            | 高井戸駅 | 接続する交通機関との案内を強化                             | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |  |
| 鉄道駅   | 情報伝達            | 高井戸駅 | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示                       | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | ヘルプマークのステッカーを整備している。                                                      |  |
| 鉄道駅   | 人的対応            | 高井戸駅 | 「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施         | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 1             | 完了            | 令和5年5月「5類感染症」移行に伴い感染防止対策は終了した。                                            |  |
| 鉄道駅   | 人的対応            | 高井戸駅 | ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化             | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 朝・タラッシュにも対応するアルバイト社員を配置している。                                              |  |
| 鉄道駅   | 人的対応            | 高井戸駅 | 案内や応対する職員の充実                                | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | 駅の利用実態に合わせて、適切な人員を配置している。                                                 |  |
| 鉄道駅   | 通路              | 高井戸駅 | 工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新               | 随時                 |      | －<br>－      | 計画<br>実績   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 3             | 継続            | バリアフリー化された経路を確保している。                                                      |  |

| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                                                                             | 特定事業                                        | 公共交通特定事業           | 事業主体 | 京王電鉄(株)     |      |            |    |    |    |    |    |    |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月9日 |               |                                                                           |                                                                          |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------|-------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象                                                                        | 事業内容                                        | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円） | 調達方法 | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |    |     |           |          | 進捗状況          |                                                                           |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      |             |      | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      |             |      |            | 実績 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11       | R12      | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                                                             | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |  |
| 鉄道駅                   | トイレ             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | バリアフリートイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新               | 1カ所                |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。                                                      |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | トイレ             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 利用者マナーの啓発                                   | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | バリアフリートイレのマナー啓発ポスターの掲出を実施。                                                |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | ホーム             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施     | 1面2線               |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。                                                 |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | ホーム             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新               | 1面2線               |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。                                          |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | ホーム             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置      | 1面2線               |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 2025年度に可動式ホーム柵の整備を完了する。<br>可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。           |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | ホーム             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | ホームドアの設置                                    | 1面2線               |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 2025年度に可動式ホーム柵の整備を完了する。<br>可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。           |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 補助金・自己資金    | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 教育啓発            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | サービス介助士等の資格の取得を推進                           | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 鉄道部門従業員に取得させていた「サービス介助士」を「ユニバーサルマナー検定（鉄道）」に切り替え、定期異動者などに対して今後も取得推進を継続する。  |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 教育啓発            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 障がいをお持ちの方にご協力頂き、ご案内方法について机上訓練や実地教育を実施している。                                |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 券売機             | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置                        | 2カ所                |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 自動券売機2台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。                                             |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 車両              | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 車両更新（車両新造・車両全面改良時）にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 2・9編成              |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 1列車1以上の車いすスペース、案内表示を全2・9編成設置済。<br>1列車2以上の車いすスペースは1・5編成設置済（H30改訂）、全面改修で対応。 |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 車両              | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 2・9編成              |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。                                                      |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 情報伝達            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供               | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | ホームページに「バリアフリー化の取り組み」として掲載している。                                           |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 情報伝達            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等                        | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 情報伝達            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新                   | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | 自己資金        | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 情報伝達            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 接続する交通機関との案内を強化                             | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 整備を完了しており、適時更新している。                                                       |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 情報伝達            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示                       | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | ヘルプマークのステッカーを整備している。                                                      |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 人的対応            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施         | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 1        | 完了            | 令和5年5月「5類感染症」移行に伴い感染防止対策は終了した。                                            |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 人的対応            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化             | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 朝・タラッシュにも対応するアルバイト社員を配置している。                                              |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 人的対応            | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 案内や応対する職員の充実                                | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 駅の利用実態に合わせて、適切な人員を配置している。                                                 |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 鉄道駅                   | 通路              | 富士見ヶ丘駅                                                                      | 工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新               | 随時                 |      | －           | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | バリアフリー化された経路を確保している。                                                      |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                                             |                                             |                    |      | －           | 実績   |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 | ホームドア設置およびホームと車両床面の段差・隙間を縮小する対策について、井の頭線は2027年度まで、京王線は2030年代前半までに全駅の整備を進める。 |                                             |                    |      |             |      |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                                           |                                                                          |  |

| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |       |                                     | 特定事業               | 公共交通特定事業      | 事業主体        | 京王バス㈱      |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 作成（変更）年月日     | 令和7年4月14日     |                                                                          |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象  | 事業内容                                | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関          | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |               |                                                                          |
|                       |                 |       |                                     |                    |               |             | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |       |               |               |                                                                          |
|                       |                 |       |                                     |                    |               | 調達方法        |            | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |
| バス                    | 教育啓発            | 地区内全域 | 「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施 | 随時                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 感染防止対策について緩和した。引き続き「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づいた対応を行うよう教育する。                |
| バス                    | 教育啓発            | 地区内全域 | 乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施     | 随時                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。                                              |
| バス                    | 教育啓発            | 地区内全域 | 必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内                 | 随時                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。                                       |
| バス                    | 車両              | 地区内全域 | 全ての車両をノンステップバス車両に代替                 | 1台                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了            | R5年6月経年劣化のためリフト付きツーステップバスが廃車となり、全ての車両がノンステップバスとなった。                      |
| バス                    | 情報伝達            | 地区内全域 | ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知            | 毎年                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。                                             |
| バス                    | 情報伝達            | 地区内全域 | リアルタイム混雑情報提供システムの導入                 | 全車両                | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | 混雑状況を把握する方法など検討を進める。                                                     |
| バス                    | 情報伝達            | 地区内全域 | 多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示     | 各停留所               | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 2             | 整備中           | 現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。                                    |
| バス                    | 情報伝達            | 地区内全域 | 聴覚障害者用の筆談器具を常備                      | 全乗務員               | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 2             | 整備中           | 全乗務員が筆記用具を携行。                                                            |
| バス                    | 情報伝達            | 地区内全域 | 分かりやすい行き先のアナウンスを実施                  | 随時                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。                                                  |
| バス                    | 停留所             | 地区内全域 | 視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去            | 随時                 | —             | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。                                                |
| バス                    | 停留所             | 地区内全域 | 上屋やベンチを順次設置                         | 可能な箇所              | 道路管理者および交通管理者 | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | 歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。         |
| バス                    | 停留所             | 地区内全域 | 道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施    | 随時                 | 道路管理者および交通管理者 | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 道路管理者および交通管理者の駐車対策において実施していただいた。また、工事等で道路占用申請があった場合は当社にも連絡するよう指示いただいた。   |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |       |                                     |                    |               |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |

|                       |                 |            |         |                    |            |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |
|-----------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|---------------|
| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |            | 特定事業    | 道路特定事業             | 事業主体       | 東京都第三建設事務所  |            |    |    |    |    |    |     |     |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月9日      |               |
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象       | 事業内容    | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関       | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     | 進捗状況      |               |               |
|                       |                 |            |         |                    |            |             | 前期         |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |           |               |               |
|                       |                 |            |         |                    |            | 調達方法        | 計画         | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降     | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 |
| 実績                    |                 |            |         |                    |            |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |
| 都道                    |                 | 経路6（環状8号線） | 無電柱化の整備 | 経路6と<br>同延長        | 道路管理者（東京都） |             | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     | 2         | 整備中           | R18年度完了予定     |
|                       |                 |            |         |                    |            |             | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |            |         |                    |            |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |

| 対象地区                  |    | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区        |              | 特定事業               | 道路特定事業                   | 事業主体        | 杉並区（杉並土木事務所）                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    | 作成（変更）年月日                        |  | 令和7年5月7日                                                                 |  |
|-----------------------|----|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|----|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| カテゴリー                 | 分類 | 整備対象                   | 事業内容         | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関                     | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度）                                                                            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    | 進捗状況                             |  |                                                                          |  |
|                       |    |                        |              |                    |                          | 調達方法        | 前期                                                                                    |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |
|                       |    |                        |              |                    |                          |             | 計画                                                                                    | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 |    | 3：継続<br>4：未整備                    |  | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |  |
| 区道                    |    | 経路1-①                  | 舗装の適切な維持管理   | 320m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路1-②                  | 舗装の適切な維持管理   | 80m                | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路1-③                  | 舗装の適切な維持管理   | 50m                | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路1-④                  | 舗装の適切な維持管理   | 140m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路1-⑤                  | 舗装の適切な維持管理   | 75m                | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路2-①                  | 舗装の適切な維持管理   | 130m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路2-②                  | 舗装の適切な維持管理   | 300m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路2-③                  | 自転車走行空間の新規整備 | 635m               | 道路管理者（杉並区）、交通管理者（高井戸警察署） |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了 | 635m整備実施済                        |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路2-③                  | 舗装の適切な維持管理   | 635m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路3-①                  | 自転車走行空間の新規整備 | 270m               | 道路管理者（杉並区）、交通管理者（高井戸警察署） |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了 | 270m整備実施済                        |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路3-①                  | 舗装の適切な維持管理   | 270m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路3-②                  | 自転車走行空間の新規整備 | 200m               | 道路管理者（杉並区）、交通管理者（高井戸警察署） |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了 | 200m整備実施済                        |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路3-②                  | 舗装の適切な維持管理   | 200m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 区道                    |    | 経路4                    | 舗装の適切な維持管理   | 430m               | 道路管理者（杉並区）               |             | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。 |  |                                                                          |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |    |                        |              |                    |                          |             |                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |
| 整備状況                  |    |                        |              |                    |                          |             |                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |
| 事業内容                  |    | 経路2-③ 自転車走行空間の新規整備     |              |                    |                          | 写<br>真      |  |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |
| 実施箇所                  |    | 杉並区高井戸西1丁目12番先（写真撮影箇所） |              |                    |                          |             |                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |
| 説 明                   |    | 経路2-③に自転車走行空間を整備した     |              |                    |                          |             |                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                  |  |                                                                          |  |

|      |                       |      |                                                                                     |      |              |           |          |
|------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区       | 特定事業 | 道路特定事業                                                                              | 事業主体 | 杉並区（杉並土木事務所） | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月7日 |
| 事業内容 | 経路3-① 自転車走行空間の新規整備    | 写真   |  |      |              |           |          |
| 実施箇所 | 杉並区高井戸西2丁目3番先（写真撮影箇所） |      |                                                                                     |      |              |           |          |
| 説明   | 経路3-①に自転車走行空間を整備した    |      |                                                                                     |      |              |           |          |
| 事業内容 | 経路3-② 自転車走行空間の新規整備    | 写真   |  |      |              |           |          |
| 実施箇所 | 杉並区高井戸西2丁目1番先（写真撮影箇所） |      |                                                                                     |      |              |           |          |
| 説明   | 経路3-②に自転車走行空間を整備した    |      |                                                                                     |      |              |           |          |

| 対象地区                  |    | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                                            | 特定事業               | 道路特定事業                                  | 事業主体        | 杉並区（土木計画課） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 作成（変更）年月日     |     | 令和7年5月13日                                                                                                        |  |
|-----------------------|----|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| カテゴリー                 | 分類 | 整備対象            | 事業内容                                       | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関                                    | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |     |                                                                                                                  |  |
|                       |    |                 |                                            |                    |                                         | 調達方法        | 前期         |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |
|                       |    |                 |                                            |                    |                                         |             | 計画         | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 |     | 3：継続<br>4：未整備                                                                                                    |  |
| 実績                    |    |                 |                                            |                    |                                         |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |
| 区道                    |    | 経路2 -②          | 一部区間において歩車分離                               | 延長：約120m           | 道路管理者<br>（杉並区）<br>交通管理者<br>（高井戸警察署）     | 計画          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了  | 富士見丘通りの西側区間について、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備済。                                                                           |  |
|                       |    |                 |                                            |                    |                                         | 実績          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |
| 区道                    |    | 経路5 -①          | 歩車分離                                       | 延長：約170m           | 道路管理者<br>（杉並区）<br>交通管理者<br>（高井戸警察署）     | 計画          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 2             | 整備中 | 北側区間（延長：約100m）については、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備済。<br>南側区間（延長：約70m）については、富士見丘中学校整備にあわせてR7年度以降に整備予定。                      |  |
|                       |    |                 |                                            |                    |                                         | 実績          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |
| 区道                    |    | 経路5 -②          | 富士見ヶ丘中学校の改築にあわせた、主要生活道路（優先整備路線）の整備による歩道の設置 | 延長：約175m           | 道路管理者<br>（東京都・杉並区）<br>交通管理者<br>（高井戸警察署） | 計画          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備 | 富士見丘中学校整備にあわせて学校側に道路拡幅整備を令和8年度以降に行う。<br>学校敷の道路後退部分は、道路区域に指定済。<br>拡幅整備による新たな道路形態（歩道幅・車道幅等）について、警察と住宅課(区営住宅部)と協議中。 |  |
|                       |    |                 |                                            |                    |                                         | 実績          |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |    |                 |                                            |                    |                                         |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |     |                                                                                                                  |  |

| 対象地区  |            | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                                    | 特定事業               | 都市公園特定事業 | 事業主体        | 杉並区（みどり公園課） |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  | 作成（変更）年月日     |                                                                           | 令和7年5月9日 |  |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| カテゴリー | 分類         | 整備対象            | 事業内容                               | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関     | 事業費<br>（千円） | 調達方法        | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 進捗状況                                             |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             |             | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     | R13<br>以降 |                                                  |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             |             |            | 実績 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |           | 1：完了<br>2：整備中                                    | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済み」等、可能な限り詳細に記載） |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | あかね橋公園          | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | あかね橋公園          | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | あかね橋公園          | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | あかね橋公園          | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 人的対応       | あかね橋公園          | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | つくだ公園           | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | つくだ公園           | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | つくだ公園           | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | つくだ公園           | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 人的対応       | つくだ公園           | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | むつみ橋緑地          | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | むつみ橋緑地          | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | むつみ橋緑地          | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | むつみ橋緑地          | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 人的対応       | むつみ橋緑地          | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | 久我山東原公園         | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | 久我山東原公園         | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | 久我山東原公園         | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | 久我山東原公園         | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 人的対応       | 久我山東原公園         | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | 高井戸藤が丘公園        | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | 高井戸藤が丘公園        | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 情報伝達       | 高井戸藤が丘公園        | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 施設の適切な維持管理 | 高井戸藤が丘公園        | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |
| 公園    | 人的対応       | 高井戸藤が丘公園        | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |          |             | 計画          |            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3   | 継続        | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |               |                                                                           |          |  |
|       |            |                 |                                    |                    |          |             | 実績          |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |                                                  |               |                                                                           |          |  |

| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                          | 特定事業                               | 都市公園特定事業           | 事業主体 | 杉並区（みどり公園課） |      |            |    |    |    |    |    |    |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月9日 |               |                                                  |                                                                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------|-------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象                     | 事業内容                               | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円） | 調達方法 | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |    |     |           |          | 進捗状況          |                                                  |                                                                          |
|                       |                 |                          |                                    |                    |      |             |      | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |           |          |               |                                                  |                                                                          |
|                       |                 |                          |                                    |                    |      |             |      |            | 実績 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11       | R12      | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                                    | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |
| 公園                    | 情報伝達            | 富士見丘児童遊園                 | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |                                                                          |
| 公園                    | 施設の適切な維持管理      | 富士見丘児童遊園                 | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |                                                                          |
| 公園                    | 情報伝達            | 富士見丘児童遊園                 | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |                                                                          |
| 公園                    | 施設の適切な維持管理      | 富士見丘児童遊園                 | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |                                                                          |
| 公園                    | 人的対応            | 富士見丘児童遊園                 | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |                                                                          |
| 公園                    | 施設の適切な維持管理      | 富士見丘児童遊園                 | 分かりやすいトイレの案内表示を適切に維持管理             | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 定期的に表示の状態を点検し、破損や色あせなどがないか確認する。                  |                                                                          |
| 公園                    | 情報伝達            | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知 | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。 |                                                                          |
| 公園                    | バリアフリートイレの整備    | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | バリアフリートイレ（オストメイト、ベビーベッド付）の設置       | 1箇所                |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 1        | 完了            | 令和6年3月に開園                                        |                                                                          |
| 公園                    | 施設の適切な維持管理      | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理              | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。          |                                                                          |
| 公園                    | 情報伝達            | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | 案内板等による自転車利用者へのマナー啓発               | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。                        |                                                                          |
| 公園                    | 施設の適切な維持管理      | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | 公園内における定期的な点検・補修                   | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。          |                                                                          |
| 公園                    | 安全な歩行空間の確保      | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | 車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備             | 約70m               |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 1        | 完了            | 令和6年3月に開園                                        |                                                                          |
| 公園                    | 出入口の段差改良        | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | 出入口の段差を解消                          | 4箇所                |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 1        | 完了            | 令和6年3月に開園                                        |                                                                          |
| 公園                    | 情報伝達            | 富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕 | 定期的に不法な占用物件を排除                     | 随時                 |      |             | 計画   |            |    |    |    |    |    |    |     |           | 3        | 継続            | 日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。                    |                                                                          |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |                          |                                    |                    |      |             |      |            |    |    |    |    |    |    |     |           |          |               |                                                  |                                                                          |

|                       |                                                                                                                                                      |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区                                                                                                                                      |                           | 特定事業                                     | 都市公園特定事業           |      | 事業主体        |                                                                                                                                                                             | 東京都建設局東部公園緑地事務所 |    |    |    |    |     |     |     |       |               | 作成（変更）年月日                                 |                                                                          | 令和7年4月17日 |  |
| カテゴリー                 | 分類                                                                                                                                                   | 整備対象                      | 事業内容                                     | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度）                                                                                                                                                                  |                 |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |                                           |                                                                          |           |  |
|                       |                                                                                                                                                      |                           |                                          |                    |      |             | 計画                                                                                                                                                                          | 前期              |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
|                       |                                                                                                                                                      |                           |                                          |                    |      | 調達方法        |                                                                                                                                                                             | R5              | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                             | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |           |  |
| 公園                    | 施設整備                                                                                                                                                 | 高井戸公園                     | バリアフリーに配慮したトイレの新規整備                      | 1棟                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 1     | 完了            | 令和5年度車椅子対応トイレ付トイレ整備完了<br>令和6年度アプローチ園路整備完了 |                                                                          |           |  |
| 公園                    | 施設整備                                                                                                                                                 | 高井戸公園                     | 公園の新規整備・園地整備にあわせた建物の出入口のバリアフリー化          | 1棟                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 1     | 完了            | 令和5年度管理棟整備完了<br>令和6年度アプローチ園路整備完了          |                                                                          |           |  |
| 公園                    | 施設整備                                                                                                                                                 | 高井戸公園                     | 公園の新規整備・園内整備にあわせた管理棟、テニスコート、球戯場等のバリアフリー化 | 各出入口               |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 1     | 完了            | 令和6年度南地区西側エリアの特定公園施設への出入口整備完了             |                                                                          |           |  |
| 公園                    |                                                                                                                                                      | 高井戸公園                     | 困っている利用者への職員の接遇向上                        | 随時                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 職員間の情報共有化により利用者ニーズの把握に努めている               |                                                                          |           |  |
| 公園                    |                                                                                                                                                      | 高井戸公園                     | 施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信                 | 随時                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 高井戸公園ホームページにバリアフリールートを示したマップを掲載           |                                                                          |           |  |
| 公園                    |                                                                                                                                                      | 高井戸公園                     | 職員のバリアフリー教育、研修の実施                        | 随時                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 必要に応じ研修を実施している                            |                                                                          |           |  |
| 公園                    |                                                                                                                                                      | 高井戸公園                     | 窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応                    | 随時                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 筆談用具を用意しサポートが必要な方に対しては個別に対応を取っている         |                                                                          |           |  |
| 公園                    | 施設整備                                                                                                                                                 | 高井戸公園                     | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置                     | 2基                 |      |             | 計画                                                                                                                                                                          |                 |    |    |    |    |     |     |     | 1     | 完了            | 整備事業の進捗に合わせて設置完了                          |                                                                          |           |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                                                                                                                                                      | 福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき整備 |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 整備状況                  |                                                                                                                                                      |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 事業内容                  | バリアフリーに配慮したトイレの新規整備                                                                                                                                  |                           |                                          |                    |      | 写<br>真      |   |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 実施箇所                  | 1棟                                                                                                                                                   |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 説<br>明                | ・車椅子使用者用便房を設置し、様式トイレ、オストメイト、ベビーチェア、ベビーシート、フィッティングボード、L型手摺、はね上げ手摺等を配置した。<br>・トイレの位置を知らせるための音声案内を設置した。<br>・入口上部には男女及び車椅子使用者便房の機能を図記号（ピクトグラム）で見やすく表示した。 |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 事業内容                  | 公園の新規整備・園地整備にあわせた建物の出入口のバリアフリー化                                                                                                                      |                           |                                          |                    |      | 写<br>真      |   |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 実施箇所                  | 1棟                                                                                                                                                   |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |
| 説<br>明                | ・主要園路（プロムナード）から管理事務所へのアプローチは有効幅及び勾配を整備基準に適合するよう整備した。<br>・管理事務所の正面玄関は自動扉とし、前後に高低差が無く車椅子使用者が容易に通過できるようにした。                                             |                           |                                          |                    |      |             |                                                                                                                                                                             |                 |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                           |                                                                          |           |  |

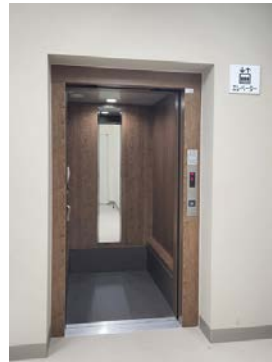
|      |                                                                                                  |      |          |      |                 |                                                                                                                                                                         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区                                                                                  | 特定事業 | 都市公園特定事業 | 事業主体 | 東京都建設局東部公園緑地事務所 | 作成（変更）年月日                                                                                                                                                               | 令和7年4月17日 |
| 事業内容 | 公園の新規整備・園内整備にあわせた管理棟、テニスコート、球戯場等のバリアフリー化                                                         |      |          |      | 写 真             |   |           |
| 実施箇所 | 各出入口                                                                                             |      |          |      |                 |                                                                                                                                                                         |           |
| 説 明  | ・テニスコートの出入口はプロムナードから高低差の無い構造とした。<br>・球技場の出入口はプロムナードから同じレベルの箇所を設けたほか、階段を設置した箇所には点字付きの手摺を設けた。      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                                         |           |
| 事業内容 | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置                                                                             |      |          |      | 写 真             |   |           |
| 実施箇所 | 2基                                                                                               |      |          |      |                 |                                                                                                                                                                         |           |
| 説 明  | ・公園の要所に案内板を設置し、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示するとともに、バリアフリーマップに点字表示を設けた。<br>・案内板の表示は英語表記及び絵文字（ピクトグラム）を併用した。 |      |          |      |                 |                                                                                                                                                                         |           |

|      |                 |      |         |      |                  |           |           |
|------|-----------------|------|---------|------|------------------|-----------|-----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（教育委員会 学校整備課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年4月30日 |
|------|-----------------|------|---------|------|------------------|-----------|-----------|

| カテゴリー | 分類   | 整備対象                   | 事業内容                                   | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円)         | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |               |                                                                                    |
|-------|------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |                        |                                        |                    |      |                     | 調達方法       | 計画 | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |       | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）           |
|       |      |                        |                                        |                    |      |                     |            |    | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 久我山小学校                 | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費の一部       | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続<br>・学校による随時修理等実施                             |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 久我山小学校                 | 大規模改修にあわせた施設のバリアフリー化を実施                | 学校全体               |      | 長寿命化改修事業の一部         | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 2             | 整備中           | ・令和6年度バリアフリースイレ整備                                                                  |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 高井戸小学校<br>〔令和5,6年増築工事〕 | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費、増築事業費の一部 | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続<br>・学校による随時修理等実施<br>・増築棟バリアフリー整備             |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 高井戸小学校<br>〔令和5,6年増築工事〕 | 手すりに点字案内を設置                            | 階段                 |      | 増築事業費の一部            | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 2             | 整備中           | ・増築棟階段に整備                                                                          |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 高井戸東小学校                | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費の一部       | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続<br>・学校による随時修理等実施                             |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 高井戸東小学校                | 手すりに点字案内を設置                            | 階段                 |      | 未定                  | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | ・大規模改修工事等に合わせて実施予定                                                                 |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 高井戸東小学校                | 分かりやすいトイレの案内表示の設置                      | 昇降口                |      | 未定                  | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | ・大規模改修工事等に合わせて実施予定                                                                 |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 富士見丘小学校<br>〔令和5年移転〕    | 移転改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合） | 学校全体               |      | 改築事業の一部             | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了            | 令和5年度、校舎移転改築<br>・段差のない昇降口・エレベーターの整備(2基)<br>・バリアフリースイレの整備(4箇所)・階段手摺の整備整備及び点字案内(3箇所) |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金及び国庫補助金         | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 富士見丘小学校<br>〔令和5年移転〕    | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費の一部       | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続<br>・学校による随時修理等実施                             |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 富士見丘中学校〔移転前〕           | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費の一部       | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1             | 完了            | ・移転により、校舎解体                                                                        |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 富士見丘中学校〔移転後〕           | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 随時                 |      | 学校運営・維持管理費の一部       | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続<br>・学校による随時修理等実施                             |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金                | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |
| 公共施設  | 区立学校 | 富士見丘中学校〔移転後〕           | 改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）   | 学校全体               |      | 改築事業の一部             | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | ・改築工事により整備中                                                                        |
|       |      |                        |                                        |                    |      | 自己資金及び国庫補助金         | 実績         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |  |
|-----------------------|--|


| 整備状況 |                             |     |                                                                                       |                                                                                       |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 大規模改修にあわせた施設のバリアフリー化を実施     | 写 真 | バリアフリースイレ                                                                             |                                                                                       |
| 実施箇所 | 久我山小学校 学校全体                 |     | 階段手摺点字                                                                                |                                                                                       |
| 説 明  | ・バリアフリースイレの整備<br>・階段手摺の点字案内 |     |  |  |

|      |                                               |      |         |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区                               | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（教育委員会 学校整備課）                                                                    | 作成（変更）年月日                                                                           | 令和7年4月30日                                                                           |                                                                                     |
| 整備状況 |                                               |      |         |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 事業内容 | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修<br>手すりに点字案内を設置      |      |         | 写 真  | バリアフリースイレ                                                                           | エレベーター                                                                              | 階段手摺                                                                                | 手摺点字                                                                                |
| 実施箇所 | 高井戸小学校 増築棟                                    |      |         |      |  |  |  |  |
| 説 明  | ・バリアフリースイレの整備<br>・エレベーターの整備<br>・階段手摺の整備及び点字案内 |      |         |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|      |                 |      |         |      |          |           |           |
|------|-----------------|------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（区民課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年4月10日 |
|------|-----------------|------|---------|------|----------|-----------|-----------|

| カテゴリー | 分類   | 整備対象                   | 事業内容                            | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |               |                                                                          |
|-------|------|------------------------|---------------------------------|--------------------|------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |      |                        |                                 |                    |      |             | 計画<br>実績   | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |       |               |               |                                                                          |
|       |      |                        |                                 |                    |      | 調達方法        |            | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>(進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載) |
| 公共施設  | 情報伝達 | 高井戸区民事務所（京王リ<br>トナード内） | コミュニケーションボードや筆談機器等の設置           | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | ローカウンターへ設置済。双方から声掛けが可能な状況。                                               |
|       |      |                        |                                 |                    |      | —           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  | 教育啓発 | 高井戸区民事務所（京王リ<br>トナード内） | 研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育<br>を推進 | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |      |                        |                                 |                    |      | —           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  | 情報伝達 | 高井戸区民事務所（京王リ<br>トナード内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等<br>に掲載 | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |      |                        |                                 |                    |      | —           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |  |
|-----------------------|--|

| 整備状況 |                                                                         |     |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | コミュニケーションボードや筆談器具等の設置                                                   | 写 真 |   |
| 実施箇所 | 高井戸区民事務所内ローカウンター                                                        |     |                                                                                       |
| 説 明  | ・高井戸区民事務所内のカウンターに設置している。<br>・「筆談ボード」を見えるよう配置することで聴覚障害者でも対応が可能なことを示している。 |     |                                                                                       |
| 事業内容 | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載                                             | 写 真 |  |
| 実施箇所 | 区公式ホームページ                                                               |     |                                                                                       |
| 説 明  | 施設案内のページ冒頭に、バリアフリー対応状況をアイコンで表示した。<br>今後も施設利用者への周知を図るため、表示を継続していく。       |     |                                                                                       |

|                       |                 |                             |                            |                    |      |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                             | 特定事業                       | 建築物特定事業            | 事業主体 | 杉並区（地域課）    |            |    |    |    |    |    |     |     |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年4月14日     |                                                               |                                                                          |  |
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象                        | 事業内容                       | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 進捗状況          |                                                               |                                                                          |  |
|                       |                 |                             |                            |                    |      |             | 前期         |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |
|                       |                 |                             |                            |                    |      | 調達方法        | 計画         | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降     | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                                                 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |  |
| 実績                    |                 |                             |                            |                    |      |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |
| 公共施設                  |                 | 高井戸地域区民センター<br>（高井戸市民センター内） | 施設を定期的に点検・補修               | 随時                 | －    | －           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     | 3         | 継続            | 目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。 |                                                                          |  |
|                       |                 |                             |                            |                    |      | －           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |
| 公共施設                  |                 | 高井戸地域区民センター<br>（高井戸市民センター内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載 | 随時                 | －    | －           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     | 3         | 継続            | バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。                            |                                                                          |  |
|                       |                 |                             |                            |                    |      | －           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |                             |                            |                    |      |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |                                                               |                                                                          |  |

|      |                 |      |         |      |             |           |          |
|------|-----------------|------|---------|------|-------------|-----------|----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（高齢者施策課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月2日 |
|------|-----------------|------|---------|------|-------------|-----------|----------|

| カテゴリー | 分類 | 整備対象                       | 事業内容                        | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関         | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               | 進捗状況                                                                     |                                                                                 |  |
|-------|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |    |                            |                             |                    |              |             | 計画<br>実績   | 前期 |    |    | 中期 |     |     | 後期  |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | R5          |            | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13<br>以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>(進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載) |                                                                                 |  |
| 公共施設  | 施設 | ゆうゆう高井戸西館                  | 研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進 | 随時                 | 受託運営法人       | —           | 計画         |    |    |    |    |     |     |     |           |               | 3             | 継続                                                                       | 研修やゆうゆう館利用者への対応のなかで、バリアフリーの理解を進めている。                                            |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | —           | 実績         |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |
| 公共施設  | 施設 | ゆうゆう高井戸西館                  | 施設を定期的に点検・補修                | 随時                 | 受託運営法人       | —           | 計画         |    |    |    |    |     |     |     |           |               | 3             | 継続                                                                       | 日常の点検でゆうゆう館職員が確認。修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応をしている。令和6年度は、トイレ棚修理を行った。                |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | —           | 実績         |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |
| 公共施設  |    | 高齢者活動支援センター<br>(高井戸市民センター) | 研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進 | 随時                 | 施設管理者（指定管理者） | —           | 計画         |    |    |    |    |     |     |     |           |               | 3             | 継続                                                                       | 研修や施設利用者へのへの対応のなかで、バリアフリーの理解を進めている。オストメイト設置トイレについてや体の不自由な方への対応方法についてなど研修を行っている。 |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | —           | 実績         |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |
| 公共施設  | 施設 | 高齢者活動支援センター<br>(高井戸市民センター) | 施設を定期的に点検・補修                | 随時                 | 施設管理者（指定管理者） | —           | 計画         |    |    |    |    |     |     |     |           |               | 3             | 継続                                                                       | 日常の点検により指定管理者が確認し、修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応を行っている。6年度の点検では補修・修繕等が必要な箇所はなかった。      |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | —           | 実績         |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |
| 公共施設  |    | 高齢者活動支援センター<br>(高井戸市民センター) | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載  | 随時                 | 施設管理者（指定管理者） | —           | 計画         |    |    |    |    |     |     |     |           |               | 3             | 継続                                                                       | 区ホームページにバリアフリー対応状況を掲載している。区民センターホームページに行事・イベント情報を載せ、多くの方が簡単に情報を手に入れられるよう配慮している。 |  |
|       |    |                            |                             |                    |              | —           | 実績         |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |                                                                                 |  |


|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ゆうゆう高井戸西館の建物は昭和48年に建築され築50年を超えており老朽化が進んでいる。</li><li>・ 当事者へは聞き取りにより意見聴取を行っている。</li></ul> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 整備状況 |                                 |     |                                                                                                                                                                             |  |
|------|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業内容 | 施設等におけるバリアフリー情報のホームページ掲載        | 写 真 |   |  |
| 実施箇所 | 区公式ホームページ                       |     |                                                                                                                                                                             |  |
| 説 明  | 区公式ホームページの施設案内にバリアフリー情報を掲載している。 |     |                                                                                                                                                                             |  |

|      |                 |      |         |      |              |           |          |
|------|-----------------|------|---------|------|--------------|-----------|----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（スポーツ振興課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月2日 |
|------|-----------------|------|---------|------|--------------|-----------|----------|

| カテゴリー | 分類 | 整備対象                 | 事業内容                        | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 進捗状況  |               |                                                        |
|-------|----|----------------------|-----------------------------|--------------------|------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|--------------------------------------------------------|
|       |    |                      |                             |                    |      |             | 計画<br>実績   | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |       |               |                                                        |
|       |    |                      |                             |                    |      | 調達方法        |            | 計画 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸温水プール（高井戸市民センター内） | 研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進 | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 通常業務の中で、身体が不自由な方（車いすや杖使用）が来館された際の対処法について教育を行っている。      |
| 公共施設  |    | 高井戸温水プール（高井戸市民センター内） | 施設を定期的に点検・補修                | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | ろ過器・天井照明・壁の塗装・プール備品等の年次点検の実施。<br>購入備品：プール監視台・ビート板・ヌードル |
| 公共施設  |    | 高井戸温水プール（高井戸市民センター内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載  | 随時                 | —    | —           | 計画         |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | バリアフリー対応状況の記載。                                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |  |
|-----------------------|--|

| 整備状況 |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | スタッフに対するバリアフリー教育の実施                                                                                                                   | 写 真 |     |
| 実施箇所 |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                             |
| 説 明  | 車いすのご利用者様や杖をついたご利用者様、一人でお着替えが難しい小学生のお子様への対応等を共有し、臨機応変に対応できるよう休館日研修を行っている。また、積極的にお声かけをするように教育しており、身体が不自由な方でも快適に温水プールをご利用いただけるように努めている。 | 写 真 |   |
| 事業内容 | 年次点検の実施                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                             |
| 実施箇所 | プール場内・備品                                                                                                                              | 写 真 |   |
| 事業内容 | 施設内のバリアフリー情報をホームページに掲載                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                             |
| 実施箇所 |                                                                                                                                       | 写 真 |   |
| 説 明  | 区ホームページにバリアフリー対応状況の記載をいただいている。また、高井戸温水プールホームページではプール予定表・教室情報・変更事項等を掲載し、ご利用者様が情報を手に入れやすいようにしている。                                       |     |                                                                                                                                                                             |

|      |                 |      |         |      |             |           |           |
|------|-----------------|------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（児童青少年課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月19日 |
|------|-----------------|------|---------|------|-------------|-----------|-----------|

| カテゴリー | 分類 | 整備対象              | 事業内容                          | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円) | 調達方法 | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |               |                                                                          |
|-------|----|-------------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------|------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |    |                   |                               |                    |      |             |      | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |       | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |
|       |    |                   |                               |                    |      |             |      |            | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 久我山学童クラブ（久我山小学校内） | 研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進 | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 久我山学童クラブ（久我山小学校内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載   | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸学童クラブ（高井戸児童館内） | 研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進 | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸学童クラブ（高井戸児童館内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載   | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸学童クラブ（高井戸児童館内） | 大規模改修、移転等にあわせた施設のバリアフリー化を実施   |                    | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | 施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸児童館            | 研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進 | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸児童館            | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載   | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸児童館            | 大規模改修、移転等にあわせた施設のバリアフリー化を実施   |                    | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | 施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸西児童館           | 研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進 | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸西児童館           | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載   | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸西児童館           | 大規模改修、移転等にあわせた施設のバリアフリー化を実施   |                    | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 4             | 未整備           | 施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 上高井戸児童館           | 研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進 | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | 研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。                                       |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 上高井戸児童館           | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載   | 随時                 | -    | 0           | 計画   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |                   |                               |                    |      | -           | 実績   |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |               |                                                                          |


|                       |  |
|-----------------------|--|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |  |
|-----------------------|--|

|                       |    |                         |                             |                    |           |             |             |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
|-----------------------|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 対象地区                  |    | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区         |                             | 特定事業               | 建築物特定事業   | 事業主体        | 杉並区（障害者施策課） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 作成（変更）年月日     |    | 令和7年5月8日                                                                          |  |
| カテゴリー                 | 分類 | 整備対象                    | 事業内容                        | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関      | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度）  |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |    |                                                                                   |  |
|                       |    |                         |                             |                    |           |             | 前期          |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
|                       |    |                         |                             |                    |           | 調達方法        | 計画          | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 |    | 3：継続<br>4：未整備                                                                     |  |
| 実績                    |    |                         |                             |                    |           |             |             |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
| 公共施設                  |    | こども発達センター<br>（上高井戸児童館内） | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載  | 随時                 | －         | －           | 計画          |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                                       |  |
|                       |    |                         |                             |                    |           | －           | 実績          |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
| 公共施設                  |    | こども発達センター<br>（上高井戸児童館内） | 車イス操作など、児童館利用者への啓発事業の実施     | 年1回                | 上高井戸児童館   | －           | 計画          |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | こども発達センターの専門職員が上高井戸児童館へ出張し、低学年の児童に対して車いすの操作を体験できるイベントを行った。                        |  |
|                       |    |                         |                             |                    |           | －           | 実績          |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
| 公共施設                  |    | こども発達センター（上高井戸児童館内）     | 障害者施設利用者と児童館利用者による交流イベントの実施 | 年1回                | 近隣乳幼児関係施設 | －           | 計画          |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 3             | 継続 | 障害のある、なしに関わらず、子どもが楽しめる遊びを提供し、こども発達センター利用者と来所者が一緒に楽しむイベント（コンサート）を上高井戸児童館と協力して実施した。 |  |
|                       |    |                         |                             |                    |           | －           | 実績          |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |    |                         |                             |                    |           |             |             |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |    |                                                                                   |  |

|      |                 |      |         |      |               |           |           |
|------|-----------------|------|---------|------|---------------|-----------|-----------|
| 対象地区 | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 | 特定事業 | 建築物特定事業 | 事業主体 | 杉並区（地域子育て支援課） | 作成（変更）年月日 | 令和7年4月30日 |
|------|-----------------|------|---------|------|---------------|-----------|-----------|

| カテゴリー | 分類 | 整備対象       | 事業内容                             | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 進捗状況          |               |                                                                          |
|-------|----|------------|----------------------------------|--------------------|------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |    |            |                                  |                    |      |             | 計画         | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |           |               |               |                                                                          |
|       |    |            |                                  |                    |      | 調達方法        |            | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13<br>以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>(進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載) |
| 公共施設  |    | 高井戸子どもセンター | エレベーターがないため、2階へ上がれない方の保健センターへの案内 | 随時                 | -    | -           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 3             | 継続            | 案内方法等を職員にフィードバックし、妊婦等の案内を行った。                                            |
|       |    |            |                                  |                    |      | -           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸子どもセンター | バリアフリースイレの適正な利用案内                | 随時                 | -    | -           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 3             | 継続            | 案内方法等を職員にフィードバックし、適切に案内を行った。                                             |
|       |    |            |                                  |                    |      | -           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |
| 公共施設  |    | 高井戸子どもセンター | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載       | 随時                 | -    | -           | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 3             | 継続            | バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。                                              |
|       |    |            |                                  |                    |      | -           | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |  |
|-----------------------|--|

| 整備状況 |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | エレベーターがないため、2階へ上がれない方の保健センターへの案内 | 写 真 |     |
| 実施箇所 | 高井戸保健センター1階入口                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 説 明  | 妊婦や階段を利用できない利用者への案内              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 事業内容 | バリアフリースイレの適正な利用案内                | 写 真 |                                                                                                                                                                          |
| 実施箇所 | 高井戸保健センター1階入口                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 説 明  | バリアフリースイレ入口に案内表示が設置されている。        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |           | 特定事業                       | 建築物特定事業            | 事業主体 | 杉並区（保健所保健サービス課） |            |    |    |    |    |    |     |     |     | 作成（変更）年月日 | 令和7年5月8日      |               |                                                                          |
|-----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象      | 事業内容                       | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円）     | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 進捗状況          |               |                                                                          |
|                       |                 |           |                            |                    |      |                 | 調達方法       | 前期 |    |    | 中期 |    |     | 後期  |     |           |               |               |                                                                          |
|                       |                 |           |                            |                    |      | 計画              |            | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13<br>以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備 | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |
| 公共施設                  |                 | 高井戸保健センター | エントランスのスロープに手すりを設置         |                    | —    | —               | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 1             | 完了            | エントランスのスロープには1本しか設置されていなかったが、あらたに1本を高さを変えて増設した。                          |
| 公共施設                  |                 | 高井戸保健センター | エントランスのタイルを滑りにくい素材に改善      |                    | —    | —               | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 1             | 完了            | エントランス及び階段部分のタイルを、滑りにくい素材に改善した。                                          |
| 公共施設                  |                 | 高井戸保健センター | エントランスの階段部分にも手すりを設置        |                    | —    | —               | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 1             | 完了            | エントランスのスロープにしか手すりを設置していなかったが、あらたに階段部分にも手すりを設置した。                         |
| 公共施設                  |                 | 高井戸保健センター | 施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載 |                    | —    | —               | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     |           | 3             | 継続            | 引き続きバリアフリー情報をホームページに掲載する。                                                |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |           |                            |                    |      |                 |            |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |               |                                                                          |

|       |    |                   |                                  |                    |                                 |             |              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |           |               |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象地区  |    | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区   |                                  | 特定事業               | 建築物特定事業                         | 事業主体        | 杉並区（杉並福祉事務所） |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 作成（変更）年月日 |               | 令和7年5月14日 |               |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カテゴリー | 分類 | 整備対象              | 事業内容                             | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関                            | 事業費<br>（千円） | 事業予定期間（年度）   |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 進捗状況      |               |           |               |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |                   |                                  |                    |                                 | 調達方法        | 計画           | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |           |               |           |               |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |                   |                                  |                    |                                 |             |              | 実績 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降     | 1：完了<br>2：整備中 |           | 3：継続<br>4：未整備 |  | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共施設  |    | 杉並福祉事務所<br>高井戸事務所 | 建物前面道路(区道)の歩行者道路に設置してある電柱を敷地内に移設 | 1箇所                | ・道路管理者（杉並区）<br>・NTT東日本（電柱設置事業者） | 0           | 計画           |    |    |    |    |    |    |     |     |     |           |               |           |               |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                 |                                             |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                                             | 特定事業                     | 建築物特定事業            | 事業主体 | NPO法人すぎなみ環境ネットワーク |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 作成（変更）年月日 |       | 令和7年4月11日     |                                                         |               |
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象                                        | 事業内容                     | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関 | 事業費<br>（千円）       | 事業予定期間（年度）                                                                            |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況  |               |                                                         |               |
|                       |                 |                                             |                          |                    |      |                   | 計画                                                                                    | 前期 |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |           |       |               |                                                         |               |
|                       |                 |                                             |                          |                    |      | 調達方法              |                                                                                       | 実績 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12       | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 |                                                         | 3：継続<br>4：未整備 |
| 公共施設                  |                 | NPO法人すぎなみ環境ネットワーク<br>（環境活動推進センター）           | 施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信 | 随時                 | —    | —                 | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 未整備           | 令和8年度以降対応予定                                             |               |
| 公共施設                  |                 | NPO法人すぎなみ環境ネットワーク<br>（環境活動推進センター）           | 職員のバリアフリー教育、研修の実施        | 年一回程度              | —    | —                 | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 未整備           | 令和8年度以降対応予定                                             |               |
|                       |                 |                                             |                          |                    |      | —                 | 実績                                                                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 公共施設                  |                 | NPO法人すぎなみ環境ネットワーク<br>（環境活動推進センター）           | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置     | 随時                 | —    | —                 | 計画                                                                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1     | 完了            | カウンターに「多目的トイレ」の場所の表示設置をした。<br>また、コミュニケーションボードや筆談器は設置済み。 |               |
|                       |                 |                                             |                          |                    |      | —                 | 実績                                                                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 |                                             |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 整備状況                  |                 |                                             |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 事業内容                  |                 | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置                        |                          |                    |      | 写<br>真            |   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 実施箇所                  |                 | 杉並区立環境活動推進センター受付カウンター（4階）                   |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 説 明                   |                 | 4階の杉並区立環境活動推進センター受付カウンターに案内板と筆談ボードを常設しています。 |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 事業内容                  |                 | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置                        |                          |                    |      | 写<br>真            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 実施箇所                  |                 | リサイクルひろば高井戸（1階）の販売カウンター                     |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 説 明                   |                 | 1階リサイクルひろば高井戸の販売カウンターに案内板と筆談ボードを常設しています。    |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 事業内容                  |                 | 誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置                        |                          |                    |      | 写<br>真            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 実施箇所                  |                 | 1階エレベーター乗り場横                                |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |
| 説 明                   |                 | 1階エレベーター乗り場横に、多目的トイレの案内を掲示しています。            |                          |                    |      |                   |                                                                                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |               |                                                         |               |

|                       |                 |                                                              |                |                    |          |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                                              |                                                                          |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 対象地区                  | 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区 |                                                              |                | 特定事業               | 交通安全特定事業 | 事業主体        | 高井戸警察署     |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 作成（変更）年月日     | 令和7年5月15日                                                    |                                                                          |  |
| カテゴリー                 | 分類              | 整備対象                                                         | 事業内容           | 実施頻度<br>箇所数<br>延長等 | 関係機関     | 事業費<br>(千円) | 事業予定期間（年度） |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 進捗状況          |                                                              |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                              |                |                    |          |             | 前期         |    |    | 中期 |    |    | 後期  |     |     |       |               |                                                              |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                              |                |                    |          | 調達方法        | 計画         | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13以降 | 1：完了<br>2：整備中 | 3：継続<br>4：未整備                                                | 具体的な実施内容や変更点、進捗状況<br>関係機関との協議状況<br>（進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載） |  |
| 実績                    |                 |                                                              |                |                    |          |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                                              |                                                                          |  |
| 交通安全                  |                 | 生活関連経路                                                       | 音響式信号機の設置・維持管理 | 随時                 |          |             | 計画         |    |    |    |    |    |     |     |     | 3     | 継続            | 杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和7年度に交通安全特定事業計画の策定を行う。その事業計画に基づき、事業を推進する。 |                                                                          |  |
|                       |                 |                                                              |                |                    |          |             | 実績         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                                              |                                                                          |  |
| 事業実施に際して<br>配慮すべき重要事項 |                 | 杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和7年度に交通安全特定事業計画の策定を行う。その事業計画に基づき、事業を推進する。 |                |                    |          |             |            |    |    |    |    |    |     |     |     |       |               |                                                              |                                                                          |  |
