
## 4. 方南町駅周辺地区

## [地区区域]

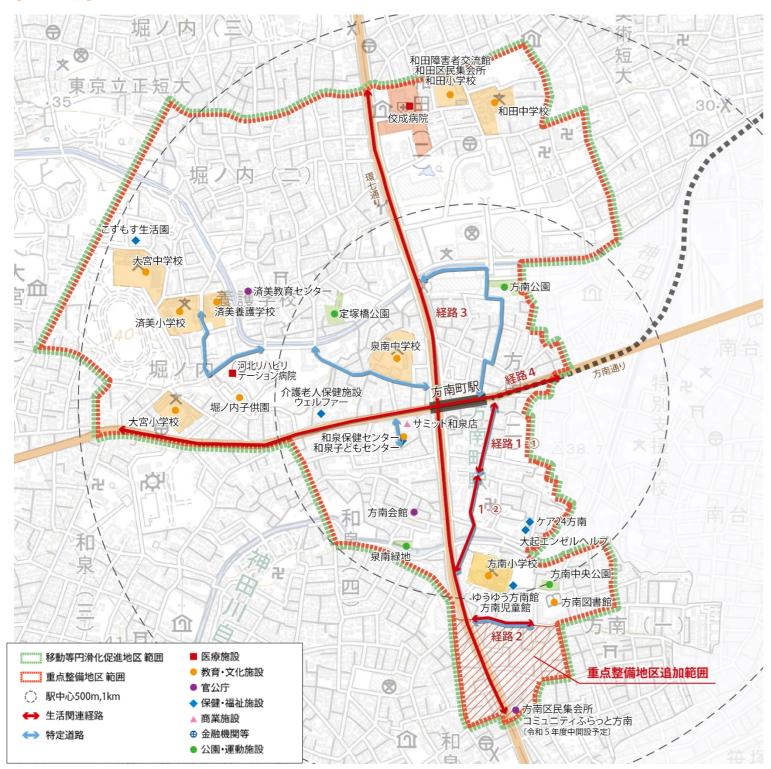

## [生活関連施設]

施	設種別		施設名
鉄道駅		方南町駅	
■医療施設	ž	杏林大学医学部付属杉並病院	
●教育・ 文化	学校	方南小学校 和田小学校 済美小学校	泉南中学校 和田中学校 大宮中学校
施設	文化施設	方南図書館	
●官公庁	•	方南区民集会所 方南会館	コミュニティふらっと方南
◆保健・福	ā祉施設	方南児童館 和泉保健センター	和泉子どもセンター 介護老人保健施設ウェルファー
▲商業施設	ž	サミット和泉店	
●公園・週	重動施設	方南公園 定塚橋公園	泉南緑地 方南中央公園

※特定事業対象施設

## [生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
<b>≪又□欠 -1</b>	①区道 689 号線	方南小学校	特定道路
経路 1	②区道 688 号線	万用小子校 	特定道路
経路2	①区道 1855 号線	方南図書館	特定道路
経路3	① 環状7号線	方南町駅、方南区民集会所、佼成病院	都道 特定道路
経路4	①方南通り	方南町駅、大宮小学校	都道 特定道路

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業		事業主体				東京地下	下鉄(株)					作成(変更)年月日	令和7年5月9日
					実施頻度		事業費 (千円)		事前期	業予定期	期間(年月	隻)	後期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R	8 R9	R10 R11	1 1 1 2 1 2 1		記了 3:継続 整備中 4:未整備	(進捗は「進捗率○・	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	サービス介助士等の資	資格の取得を推進	随時	公益財団法人 日本ケアフィット 共育機構	_ _	計画実績						3	継続	令和7年3月31日時点で ※未取得者については	新宿駅務管区社員取得率99%。 今年度中に取得予定。
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	駅職員を対象とした技	接遇等の研修・教育の実施	随時	-	_ _	計画実績						3	継続	令和6年度の教育につい	いては、令和6年9月に実施した。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	ホームページを利用し 知・提供	したバリアフリーに関する情報の周	随時	-	<del>-</del>	計画実績						3	継続	東京メトロ公式ホームへ	ページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	出口案内標識・ホーム	ム柱巻案内標識の更新等	必要数	-	<del>-</del>	計画		•	実施済み	,		1	完了	サインリニューアルを写 など)の拡充やEV案内	実施し、以前の案内標識に比べ、図記号(ピクトやナンバリング の強化を行った。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	触知案内図等、より 新	わかりやすい案内サインの維持更	随時	-	<u> </u>	計画						3	継続	基本的な設置は完了して 時行っている。	ており、表記内容の変更に伴う改修や汚損棄損に伴う修繕は、随
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	接続する交通機関との	の案内を強化	随時	_	<u> </u>	計画実績						3	継続	基本的な設置は完了して 改修は、随時行っている	ており設置数を増やすなどは未計画だが、表記内容の変更に伴う る。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	優先席周辺等にヘルフ	プマークのポスターの掲示	随時	-	<u> </u>	計画実績						3	継続	令和2年11月4日より駅	構内のポスター枠に掲出中。
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	「公共交通事業者に向 く感染防止対策の実施	向けた接遇ガイドライン」に基づ 施	随時	_	_ _	計画実績						1	完了	新型コロナウイルスが!	5 類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	案内や応対する職員の	の充実	随時	-	1	計画実績						3	★ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		したインターホンやタブレットを使用したインターホンの設置 リ、ご案内の拡充を図っていく。

対象地区	方面	有町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業		事業主体				東京都	交通局					作成(変更)年月日 令和7年4月9日
カテゴリー	分類	整備対象		事業內容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円) 調達方法	計画	前期 R5 R6		期間(年 中期 R8 R9		後期 11 R12		完了 3:継続 整備中 4:未整備	
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に く感染防止対策の実施	向けた接遇ガイドライン」に基づ 施	随時	-	<u> </u>	計画						1	完了	(進捗は「進捗率○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載) 「業種別ガイドライン」の廃止に伴い、対応は完了しております。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象とした。 修・教育の実施	ベビーカー利用者への接遇等の研	随時	-	-	計画						3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や	章害者等を座席へ案内	随時	-	-	計画						3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。
バス	車両	地区内全域	バス車内にコミュニケの設置	ケーションーボードや筆談器具等	全車両	-	<u> </u>	計画	•		実施済	み		1	完了	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。
バス	車両	地区内全域	バリアフリー整備ガイ	イドラインへの適合	全車両	-	_ _	計画実績			実施済	み		1	完了	全車両適合済みです。
バス	車両	地区内全域	ベビーカーの固定ベル	ルトの導入	全車両	-	-	計画			実施済	み		1	完了	ベビーカーの固定ベルトを全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	リフト付バスまたはこ	スロープ付きのバスの導入	全車両	-	_ _	計画実績			実施済	み		1	完了	リフト付きバスまたはスローブ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、 全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確信	保及び固定方法の周知	全車両	-	_ _	計画実績			実施済	み		1	完了	リフト付きバスまたはスローブ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、 全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	車いす利用者が利用	しやすい降車ボタンの設置	全車両	-	<u> </u>	計画実績			実施済	み		1	完了	リフト付きバスまたはスローブ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、 全車両に導入しています。
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションサ- 改善	ービスの導入及びサービスの維持	随時	-	- -	計画実績						3	継続	ホームページ上で、時刻表やバス接近表示等の運行情報サービスを提供しています。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用	用して、バリアフリー情報を周知	随時	-	-	計画						3	継続	ホームページ上で、バス施設や車両に関するバリアフリー情報を公開しています。
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステ クの普及及び啓発	テッカーを掲示によるヘルプマー	随時	東京都福祉局	-	計画実績						3	継続	東京都福祉局の取組に協力し、平成25年7月から営業所でのヘルプマークの配付及びバス車内や営業所におけるポスター掲示等の普及啓発を行っています。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバー 所の案内表示	ーサルデザインに対応したバス停留	随時	-	<u> </u>	計画			実施済	み		1	完了	4ヶ国語表記の標柱を設置しています。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆記	用具や筆談具を常備	随時	-	<u> </u>	計画実績			実施済	み		1	完了	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先の	のアナウンスを実施	随時	-	<del>-</del>	計画						3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導プロ、	ック上における障害物等の除去	随時	-	<del>-</del>	計画実績						3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次	<b>心</b> 置	随時	-	-	計画						3	継続	今後も上屋やベンチが設置可能な停留所の中から、利用状況等を勘案し、順次設置を 進めています。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理 法駐車対策を実施	理者と連携し、バス停留所への違	随時	-		計画						3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体		東京都交通局	作成(変更)年月日	令和7年4月9日
						整備状況			
事業に	内容	ヘルプマークの普及及び啓発	5						
実施能	箇所	都営バスの各営業所・支所							
說	田田			「るとともに、営業所内や車内におい ハルプマークを配布しました。	ってポスターを掲示し、普及に努めています。	写真			
事業に	内容	交通サポートマネージャー研	修への参加及び協力						
実施能	箇所	交通局研修所・深川営業所							
說	明				約者への理解を深めることを目的とした「交通 使用した実技演習が行われ、計7名の職員が参	写真			

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業		事業主体				京王バス	(株)					作成(変更)年月日	令和7年4月14日
					実施頻度		事業費 (千円)		前其	事業予定期	間 (年度)中期	後期					進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R8	R9 R10	R11 R12	R13 1 以降 2	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	(進捗は「進捗率(	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に く感染防止対策等の	向けた接遇ガイドライン」に基づ 実施	随時	_	-	計画						3 維	迷続	感染防止対策について ン」に基づいた対応を	「緩和した。引き続き「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライ を行うよう教育する。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象とした 修・教育の実施	ベビーカー利用者への接遇等の研	随時	_	-	計画実績						3 維	迷続	全乗務員が3年に1回の	の頻度で受講する定期研修にて実施。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や	障害者等を座席へ案内	随時	-	-	計画実績						3 維	迷続	転倒事故防止の観点が	いら、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンス	テップバス車両に代替	1台	-	-	計画実績						1 第	F: [	R5年6月経年劣化のた ステップバスとなった	めリフト付きツーステップバスが廃車となり、全ての車両がノン -。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活	用して、バリアフリー情報を周知	毎年	-	-	計画						3 組	迷続	移動等円滑化取組計画	到書および報告書をホームページに公表。
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情	報提供システムの導入	全車両	_		計画						4 未	<b>卡整備</b>	混雑状況を把握する方	万法など検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバ 所の案内表示	ーサルデザインに対応したバス停留	各停留所	-	-	計画						2 整	整備中	現在は一部に英語を併	f記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談	器具を常備	全乗務員	-	-	計画実績						2 整	<b></b>	全乗務員が筆記用具を	·携行。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先	のアナウンスを実施	随時	-	_ _	計画						3 維	迷続	接遇教育のほか定期的	りな覆面調査などにより確認。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブ	ロック上における障害物等の除去	随時	-	-	計画						3 組	迷続	旅客サービス向上も含	含め、定期的にバス停清掃を実施。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次	設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	-	計画						4 未	<b>卡整備</b>		・幅員があることなど設置が可能であれば検討。 屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管 法駐車対策を実施	理者と連携し、バス停留所への違	随時	道路管理者および交通管理者	_	計画						3 維	迷続		通管理者の駐車対策において実施していただいた。また、工事等で 上場合は当社にも連絡するよう指示いただいた。

対象地区	方i	南町駅周辺地区	特定事業	道路特定事業		事業主体			東京	都第三	建設事務所	沂				作成(変更)年月日	令和7年5月9日
					実施頻度		事業費 (千円)		事前期		期間(年月		後期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 F	R8 R9	R10 F	R11 R12		7 3:継続 前中 4:未整値	苗	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 )○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
都道		経路3(環状7号線)	舗装の適切な維持管	理	適宜	道路管理者(東京都)		計画						3	継続	巡回点検等により損傷	を確認した箇所に対して維持補修を行う。
都道		経路3(環状7号線)	無電柱化の整備		経路3と 同延長	道路管理者(東京都)		計画実績						2	整備中	方南通り以北は当初の 方南通りより南側はR	R 6 年度完了予定から R 8 年度完了予定に変更となった。 10年度完了予定。
都道		経路4 (方南通り)	視覚障害者誘導用ブ	ロックの整備	300 m	道路管理者(東京都)		計画						1	完了	R 5~6年度整備完了	,
都道		経路4(方南通り)	舗装の適切な維持管	理	適宜	道路管理者(東京都)		計画						3	継続	巡回点検等により損傷	を確認した箇所に対して維持補修を行う。
	施に際して、																
							整備状況	7				241	114	(4)		P	
事	業内容	視覚障害者誘導用ブロック <i>の</i>	D整備						No.			3	TE WILL		1		A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O
実	施箇所	経路4 (方南通り)						13			1						A STATE OF THE STA
説	,明	視覚障害者誘導用標示の整備	<b>帯が完了</b>				写真			di.						J. Co.	

対象地区	方面	有町駅周辺地区	特定事業	道路特定事業		事業主体			杉並区	(杉並出	上木事務	听)				作成(変更)年月日	令和7年5月7日
					実施頻度		事業費 (千円)		事業前期	美予定其	別間(年) 中期		後期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R	8 R9	R10 R1	112171		完了 3:継続 整備中 4:未整備	(進捗は「進捗率〇	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
区道		経路1-①	舗装の適切な維持管理	里	190m	道路管理者 (杉並区)		計画実績						3	継続	職員等のパトロールや	P区民要望対応により、適切な維持管理を行った。
区道		経路1-②	舗装の適切な維持管理	<b>T</b>	260m	道路管理者 (杉並区)		計画実績						3	継続	職員等のパトロールや	区民要望対応により、適切な維持管理を行った。
区道		経路2	舗装の適切な維持管理	<b>E</b>	160m	道路管理者 (杉並区)		計画実績						3	継続	職員等のパトロールや	P区民要望対応により、適切な維持管理を行った。
	もに際して き重要事項																

対象地区	方南	南町駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業		事業主体			杉並	図 (みどり	り公園	課)				作成 (変更) 年月日	令和7年5月9日
					実施頻度		事業費(千円)		前期	事業予定期	間(年期		後期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R8	B R9	R10 R1	118171		記了 3:継続 を備中 4:未整備	(進捗は「進捗率〇	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
区道	情報伝達	泉南緑地	イベント利用時におい ベント主催者へ周知	いて、園路の幅員を確保するようイ	随時			計画実績						3	継続	イベント開催前に具体 の状況を確認する。	的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際
区道	施設の適切な維 持管理	泉南緑地	ベンチやトイレ等の原	既存施設の適切な維持管理	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行ってい
区道	情報伝達	泉南緑地	案内板等による自転車	車利用者へのマナー啓発	随時			計画実績						3	継続	駐輪場や公園の入り口	]など、人が通る場所に配置する。
区道	施設の適切な維 持管理	泉南緑地	公園内における定期的	的な点検・補修	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行ってい
区道	人的対応	泉南緑地	定期的に不法な占用物	物件を排除	随時			計画実績						3	継続	日常的な巡回監視を実	R施し、不法占用物件の発見に努めている。
区道	情報伝達	定塚橋公園	イベント利用時におい ベント主催者へ周知	いて、園路の幅員を確保するようイ	随時			計画実績						3	継続	イベント開催前に具体 の状況を確認する。	的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際
区道	施設の適切な維 持管理	定塚橋公園	ベンチやトイレ等の原	既存施設の適切な維持管理	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行ってい
区道	情報伝達	定塚橋公園	案内板等による自転車	車利用者へのマナー啓発	随時			計画実績						3	継続	駐輪場や公園の入り口	1など、人が通る場所に配置する。
区道	施設の適切な維 持管理	定塚橋公園	公園内における定期的	的な点検・補修	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行ってい
区道	人的対応	定塚橋公園	定期的に不法な占用物	物件を排除	随時			計画実績						3	継続	日常的な巡回監視を実	脱施し、不法占用物件の発見に努めている。
区道	情報伝達	方南公園	イベント利用時におい ベント主催者へ周知	いて、園路の幅員を確保するようイ	随時			計画実績						3	継続	イベント開催前に具体 の状況を確認する。	的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際
区道	施設の適切な維 持管理	方南公園	ベンチやトイレ等の原	既存施設の適切な維持管理	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行ってい
区道	情報伝達	方南公園	案内板等による自転車	車利用者へのマナー啓発	随時			計画実績						3	継続	駐輪場や公園の入り口	1など、人が通る場所に配置する。
区道	施設の適切な維 持管理	方南公園	公園内における定期的	的な点検・補修	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行ってい
区道	人的対応	方南公園	定期的に不法な占用物	物件を排除	随時			計画実績						3	継続	日常的な巡回監視を実	R施し、不法占用物件の発見に努めている。
区道	情報伝達	方南中央公園	イベント利用時におい ベント主催者へ周知	いて、園路の幅員を確保するようイ	随時			計画実績						3	継続	イベント開催前に具体 の状況を確認する。	的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際
区道	施設の適切な維 持管理	方南中央公園	ベンチやトイレ等の原	既存施設の適切な維持管理	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	関的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行ってい
区道	情報伝達	方南中央公園	案内板等による自転車	車利用者へのマナー啓発	随時			計画実績						3	継続	駐輪場や公園の入り口	1など、人が通る場所に配置する。
区道	施設の適切な維 持管理	方南中央公園	公園内における定期的	的な点検・補修	随時			計画実績						3	継続	作業計画に基づいて定 る。	期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行ってい
区道	人的対応	方南中央公園	定期的に不法な占用物	物件を排除	随時			計画実績						3	継続	日常的な巡回監視を実	ア施し、不法占用物件の発見に努めている。 
						_					-			_			

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体			杉並[	区(児童青	<b>予少年課)</b>	)					作成(変更)年月日	令和7年5月19日
					実施頻度		事業費(千円)	Г	前期	業予定期	間(年度中期	隻)	後期	l l				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業內容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R8	R9 F	R10 R:	11 R12	/		7 3:継続 備中 4:未整備		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 0%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		方面児童館(学童クラブ)	研修等による利用者( 教育の推進	こ対する職員の心のバリアフリー	随時	-	0	計画実績							3	継続	研修受講やその内容を職	員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		方南児童館(学童クラブ)	施設等におけるバリ! に掲載	アフリー情報を、ホームページ等	随時	-	0 -	計画実績							3	継続	バリアフリー対応状況を	区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		方面児童館(学童クラブ)	大規模改修、移転等( を実施	こあわせた施設のバリアフリー化		-	40,912 子ども・子育て支援整備 交付金、学童クラブ整備 費補助金、自己資金								1	完了	令和6年3月に工事完了	。2階にあった児童館の諸室を1階部分に整備。
	施に際して さ重要事項														-			

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体		<i>i</i>	<b>彡並区(教</b>	育委員	会	学校整備	講課)				作成(変更)年月日 令和7年4月30日
					実施頻度		事業費 (千円)		事前期	業予定		(年度) 中期		後期			進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7	R8	R9 R1	.0 R11			完了 3:継 整備中 4:未	
公共施設	区立学校	済美小学校	移動等円滑化の維持の 修	のため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画実績							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	済美小学校	手すりに点字案内を記	及置	階段		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	済美小学校	分かりやすいトイレの	)案内表示の設置	昇降口		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	泉南中学校	移動等円滑化の維持の 修	つため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画実績							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	泉南中学校	手すりに点字案内を設	九 <b>军</b> 文直	階段		未定 自己資金	計画実績			+				4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	泉南中学校	分かりやすいトイレの	)案内表示の設置	昇降口		未定 自己資金	計画実績			+				4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	大宮中学校	移動等円滑化の維持の 修	つため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画実績							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	大宮中学校	手すりに点字案内を記	改置	階段		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	大宮中学校	分かりやすいトイレの	)案内表示の設置	昇降口		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	方南小学校	移動等円滑化の維持の 修	つため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画実績							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	方南小学校	手すりに点字案内を記	改置	階段		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	和田小学校	移動等円滑化の維持の 修	つため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	和田小学校	手すりに点字案内を設	n.eg X.e	階段		未定 自己資金	計画実績							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	和田小学校	分かりやすいトイレの	)案内表示の設置	昇降口		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	和田中学校	移動等円滑化の維持の 修	つため、定期的な点検と施設の補	随時		学校運営・維持管理費の一部 自己資金	計画実績							3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施
公共施設	区立学校	和田中学校	手すりに点字案内を設	九 <b>四</b> 文直	階段		未定 自己資金	計画実績							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定
公共施設	区立学校	和田中学校	分かりやすいトイレの	)案内表示の設置	昇降口		未定 自己資金	計画							4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定

81

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体			杉並区(教	有委員	会 中央	図書館)				作成(変更)年月日 令和7年5月7日
					実施頻度		事業費 (千円)		事 前期		期間(年中期		後期			進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7	R8 R9	R10 R1	1 R12 R1	3 1:完备 2:整	3:継続 8備中 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		方南図書館	コミュニケーション	ボードや筆談器具等の設置	随時	-	-	計画実績						3	継続	カウンターに筆談ボード1個あり。
公共施設		方南図書館	ユニバーサルデザイ 既存の案内板の見直	ンに対応した案内板の新設や更新、 し	3個所新設	-	-	計画実績						3	継続	案内板の更新を行った。
公共施設		方南図書館	子ども、保護者向け置	バリアフリー図書のコーナーの設	児童コーナー に設置	-	-	計画実績						3	継続	関連資料の補充を行った。
公共施設		方南図書館	施設を定期的に点検	・補修	随時	-	-	計画実績						3	継続	特に補修箇所はなし。
公共施設		方南図書館	施設等におけるバリ 掲載	アフリー情報を、ホームページに	随時	-	-	計画実績						3	継続	実施済
公共施設		方南図書館	自転車利用時のルー	ル・マナーの徹底	9個所設置	-	-	計画実績						3	継続	「自転車を降りてください」の掲示板を作り替えた。 (掲示鬱劣化のため)
公共施設		方南図書館	駐輪場利用及び駐輪 の配慮をお願いする	時の視覚障害者誘導用ブロックへ 案内表示	3個所設置	-	-	計画実績						3	継続	点字プロックの上に自転車を止めない」の掲示鬱を作り替えた (掲示物劣化のため)
	施に際して き重要事項										•		•	•		

対象地区	方	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体			杉並区 (地域課)							作成(変更)年月日	令和7年4月14日
					実施頻度		事業費 (千円)		前		期間(年度中期	() 後	期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業內容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画 実績	R5 R6	6 R7 F	R8 R9 F	R10 R11 R1	7		7 3:継続 前中 4:未整備	(進捗は「進捗率(	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		コミュニティふらっと方南 (令和6年1月5日開館)	施設を定期的に点検	・補修	随時	-	<del>-</del>	計画実績						3	<b>総米統</b>	目視等による日常点検いか確認し、必要に応	や利用者の声を基に、誘導プロック、点字表示などに異常が無 じて修繕を行う。
公共施設		方南会館	施設を定期的に点検	・補修	随時	-	-	計画実績						3	継続	目視等による日常点検いか確認し、必要に応	や利用者の声を基に、誘導プロック、点字表示などに異常が無 じて修繕を行う。
公共施設		方南会館	施設等におけるバリ! 掲載	アフリー情報を、ホームページに	随時	-	-	計画実績						3	継続	バリアフリー対応状況	に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		方南区民集会所 (コミュニティふらっと 方南へ改修)	施設を定期的に点検	・補修	随時	-	-	計画						1	完了		や利用者の声を基に、誘導プロック、点字表示などに異常が無 いて修繕を行う。(令和5年3月31日廃止)
公共施設		(コミュニティふらっと	施設等におけるバリー掲載	アフリー情報を、ホームページに	随時	_	-	計画						1	完了	バリアフリー対応状況 (令和5年3月31日廃山	に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。 E)

対象地区	方	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体	杉並区(地域子育て支援課)							作成(変更)年月日	令和7年4月30日		
					実施頻度		事業費 (千円)		前期	事業予定期 	月間(年 中期		後期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R	8 R9	R10 R11	R12	R13 1: 以降 2:	完了 3:継続 整備中 4:未整	苗	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		和泉子どもセンター (和泉 保健センター内)	バリアフリートイレい	の適正な利用案内	随時	-	-	計画実績						3	継続	案内方法等を職員にこ	フィードバックし、適切に案内を行った。
公共施設			施設等におけるバリ	アフリー情報を、ホームページ等	随時	-	-	計画						3	継続	バリアフリー対応状況	兄を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		和泉子どもセンター (和泉 保健センター内)	筆談ボード等を利用	した案内	随時	-	-	計画						3	継続	筆談ボード等を利用し	した説明ができるように、職員に対し使用方法の確認を行った。
公共施設			裏口に手すりやスロ・ 入口の案内及び介助	ープがないため、スロープがある	随時	-	-	計画						3	継続		に対しては、基本的に手すり・スロープがある正面入口を案内して 望する方に対しては、個別に人的介助による対応を行っている。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項			
		整備状況	
事業内容	バリアフリートイレの適正な利用案内		
実施箇所	和泉保健センター1階		
説 明	バリアフリートイレ入口に案内表示が設置されている。	写真	
事業内容	筆談ボード等を利用した案内		學是語で遊駅
実施箇所	和泉子どもセンター窓口		
説明	筆談ボード等を利用した説明ができるように、窓口に設置している。	写真	事談ホード 事談しますので お申し出ください お申し出ください お申し出ください 表すマークです
事業内容	裏口に手すりやスロープがないため、スロープがある入口の案内及び介助		裏口
実施箇所	和泉保健センター裏口		
説 明	裏口にスロープが設置されていないため、スロープがある入口の案内及び介助が必要。	写真	

対象地区	方ī	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体		杉並区(保健所保健サービス課)							作成(変更)年月日	令和7年5月1日	
					実施頻度		事業費 (千円)	[	事	業予定期	引間(年度) 中期	後	期				進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7 R8	8 R9 R1	0 R11 R1	12 R13 以降	1:完了 2:整備	3:継続 中 4:未整備	(進捗は「進捗率(	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		和泉保健センター	施設等におけるバリス 掲載	アフリー情報を、ホームページに		-	1 1	計画実績						3	継続	引き続きバリアフリー	-情報をホームページに掲載する。
	施に際して べき重要事項																

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主	体	立正佼成会附属佼成病院	作成(変更)年月日	令和7年5月10日

				実施頻度		事業費 (千円)		前	事業予		間(年度 中期	)	後期				進捗状況		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 F	R6 R7	R8	R9 R	10 R11	1 R12	R13 以降	1:完了 2:整備 <sup>。</sup>	3:継続 中 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
民間施設		佼成病院	困っている利用者への職員の接遇向上	完了		_	計画								1	完了	患者サポートセンターを設置		
						_	実績												
民間施設		佼成病院	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	完了		_	計画								1	完了	ホームページ上でカラーユニバーサルデザインの導入を掲載		
20110335300		1547507 3170	MODEL 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 3		_	実績												
民間施設		佼成病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		_	計画								1	完了	委託職員へのバリアフリー教育を実施		
PATHONERA		IX/W/F1Pb	NACCE TO THE SAME	JAZAN		-	実績								1	763	Showed or yyyy SAR CAMB		
民間施設		佼成病院	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	完了		-	計画								1	完了	各窓口にてコミュニケーションボード又は筆談対応		
DOI HOUSE		IXPX/NJL		76.1		_	実績								1	76 3	日からにて「スコーク・フェング・「人は手飲み」が		
民間施設		佼成病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	完了		_	計画								1	完了	開院時よりカラーユニバーサルデザインを導入		
民间應款		IX PX/M P/C	能にてもガガッドすい心臓に対の来れがの故画	76.1		_	実績								1	)C J	研防では リガン・ユーバー グルナッパン と等八		
民間施設		佼成病院	オストメイト対応式トイレの設置	5か所		_	計画								1	完了	開院時よりオストメイト対応トイレを 5 か所設置		
氏비胞故		区以内顶	カスドクイド対ルスドイレの改画	דויות כ		_	実績								1	7C J			
民間施設		佼成病院	車いす専用の駐車スペース設置	3台		_	計画								1	中マ	開吟味とU 古いナ市田の計古フペーフ たり ムム記室		
氏间胞故		汉从州水	半いす寺川の紅半へへ一へ取世	3日		_	実績								1 完了	76 J	開院時より車いす専用の駐車スペースを3台分設置		

事業実施に際して 建物用途が病院という事もあり、2014年の開院当初より、敷地内は段差のないバリアフリーとなっています。 配慮すべき重要事項 なお、令和6年4月1日より運営母体が「杏林大学医学部付属杉並病院」に変更となったことから、令和5年度末時点で完了とする。

HUMAN TO EXTENT	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
		整備状況	
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置		
実施箇所	院内各所		
説明	・当院では、色覚のバリアフリーを目指し、色覚異常を持つ患者さんへ配慮した分かりやすく誘導できるようカラーユニバーサルデザイン(CUD=Color Universal Design)を導入。 ・CUDが国内の病院で採用され、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の認証を取得した初めてのケースとなっています。	写真	四角形の藍色は検査、円形の赤は外来のサインである。 サインは「色」「形」「文字」の明確な使い分けがなされている。 大角形のオレンジは病様のサイン。
事業内容	オストメイト対応式トイレの設置		
実施箇所	外来トイレ他		
説 明	・オストメイトが安心してご利用できるオストメイト対応の多機能トイレを外来トイレ5ヶ所に設置。 ・排泄物の処理、ストーマ装具の洗浄・交換・装着等が可能であり、トイレ入口看板にはオストメイトマークを表示しています。	写真	外来の多機能トイレには、オストメイト対応の汚物流し、おむつ交換台、ヘビーチェア、姿見などを設置。

対象地区	方南町駅周辺地[		特定事業	建築物特定事業	事業主体		立正佼成会附属佼成病院	作成(変更)年月日	令和7年5月10日
						整備状況			
事業内	P容 車いす専用の	主車スペース設	置				The state of the		The state of the s
実施筐	逝所 地下駐車場							登駐車場 必要な人のために 空けておこう でけておこう はない	
設	明現在、地下駐	垣場には計3台車	夏いす電用駐車場を完	6備しています。入口まで段差の無い	安全な環境が整備されている。	写真	JE!	District Participant Control of the	

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体			<b>サ</b> :	ミット材	朱式会社	生				作成(変更)年月日	令和7年4月28日
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円) 調達方法	計画	事 前期 R5 R6	業予定期 R7 R	中其	胡	期 12 R13 以降	3 1:完	了 3:継続 備中 4:未整備	(進捗は「進捗率(	進捗状況 具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 ○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
民間施設		サミット和泉店	困っている利用者への	D職員の接遇向上	随時	-	-	計画						3	継続	お客様に向合う接客を	を心がける
民間施設		サミット和泉店	職員のバリアフリー都	<b>教育、研修の実施</b>	随時	-	-	計画						3	継続	月1回、研修会の実施	i
民間施設		サミット和泉店	窓口でのコミュニケー	-ションボードや筆談対応	1ヶ所	-	-	計画						- 3	継続	サービスカウンターで	での対応
民間施設		サミット和泉店	誰にでも分かりやすい	<b>、施設内の案内板の設置</b>	_	_	- 自己資金	計画						3	継続	R6~R7に改修を計画	したが、オーナー様都合により現在延期となっている。
	施に際して き重要事項																
							整備状況										
事	業内容	困っている利用者への職員の	の接遇向上、職員のバリ	リアフリー教育、研修の実施													
実力	施箇所	本部															
説	BH	月1回、全店の接客部門チー 店舗担当者に対しては、チー			写真												
事	業内容	窓口でのコミュニケーション	ンボードや筆談対応								ı	0					
実力	施箇所	サービスカウンター															
説	明	サービスカウンターにコミ : お困り事があれば、指差して また、ホワイトボードで筆記	でもコミュニケーション				写真										

対象地区	方面	南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業		事業主体			介護老人	保健施	設ウェル	ファー					作成(変更)年月日 令和7年4月10日
					実施頻度		事業費 (千円)		事	業予定	期間(年中期		後期	II II			進捗状況
カテゴリー	分類	整備対象		事業内容	箇所数 延長等	関係機関	調達方法	計画	R5 R6	R7	R8 R9	R10 I	R11 R12			3:継続 中 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率○○%」「△△/○○箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	エレベーターの停止! やすい操作盤の設置	階の音声案内、車いすでも操作し		-	-	計画							1	完了	元々その機能がありました(音声案内と操作しやすい操作盤の設置)
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	バリアフリートイレの りの設置	の整備、オストメイト対応、手す		-	<u> </u>	計画							1	完了	車いす用トイレがあります。手すりも施設内に付いています。
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	困っている利用者への	の職員の接遇向上		-	-	計画実績							4	未整備	進捗率0%
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	施設ホームページ等	でのバリアフリー対応状況の発信		-	-	計画実績							4	未整備	進捗率0%
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	車いす用駐車場の整備	備		-	-	計画実績						$\Box$	1	完了	日頃から車椅子の方用の駐車場となっています。
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	職員のバリアフリー	教育、研修の実施		-	-	計画実績							4	未整備	進捗率0%
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	窓口でのコミュニケー	ーションボードや筆談対応		-	-	計画							3	継続	R6年度末現在、専用のコミュニケーションボードの設置はしていませんが、配慮が必要な方の対応についてはその都度人的対応を行っています。
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	誰にでも分かりやすい	い施設内の案内板の設置		-	-	計画実績							1	完了	各階エレベーター前に設置してあります。

		整備状況	
事業内容	車いす用駐車場の整備		
実施箇所	介護老人保健施設ウェルファー正面玄関前の駐車スペース	-	
説 明	日頃から車椅子の方用の駐車場となっています。	写真	
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置		
実施箇所	介護老人保健施設ウェルファー施設内エレベーター前	-	16898
説 明	各階エレベーター前に設置してあります。	写真	
