

荻窪駅周辺  
サイン整備計画  
【第2期】

令和8年（2026年）3月

杉並区

# 目 次

## 第1章 整備計画【第2期】について

- I. 目的 ..... 1
- II. 対象サイン ..... 1

## 第2章 サイン整備について

- I. 案内・誘導サイン等の整備 ..... 2
  - II. エレベーターサインの整備 ..... 13
  - III. 整備の手順とスケジュール ..... 17
-

# 第1章 整備計画【第2期】について

## I. 目的


荻窪駅周辺サイン基本ルール（以下、基本ルールという。）及び荻窪駅周辺サイン整備計画【第1期】（以下、整備計画【第1期】という。）の整備状況を踏まえ、整備する事項を選定し、実施する整備内容や時期及び役割分担等を明確にし、それらの内容を関係者間で共有することを目的とします。

## II. 対象サイン

荻窪駅周辺のサイン整備については、令和3年3月に中間まとめを作成後に段階的な整備を実施するにあたり、整備計画【第1期】を令和5年3月に作成し、中間まとめで対象としたサインのうち、バリアフリー関連施設を案内する駅構内図をはじめ、上下移動の重要な手段となるエレベーターサインを整備対象として整備を実施しました。

この、荻窪駅周辺サイン整備計画【第2期】（以下、整備計画【第2期】という。）では、中間まとめで対象としたサインのうち整備計画【第1期】で整備対象外としたサインの他、その後に新たに検討したサインについても整備対象とします。

なお、整備計画【第1期】で整備済みのサインについても、必要に応じて表示面の更新を行います。

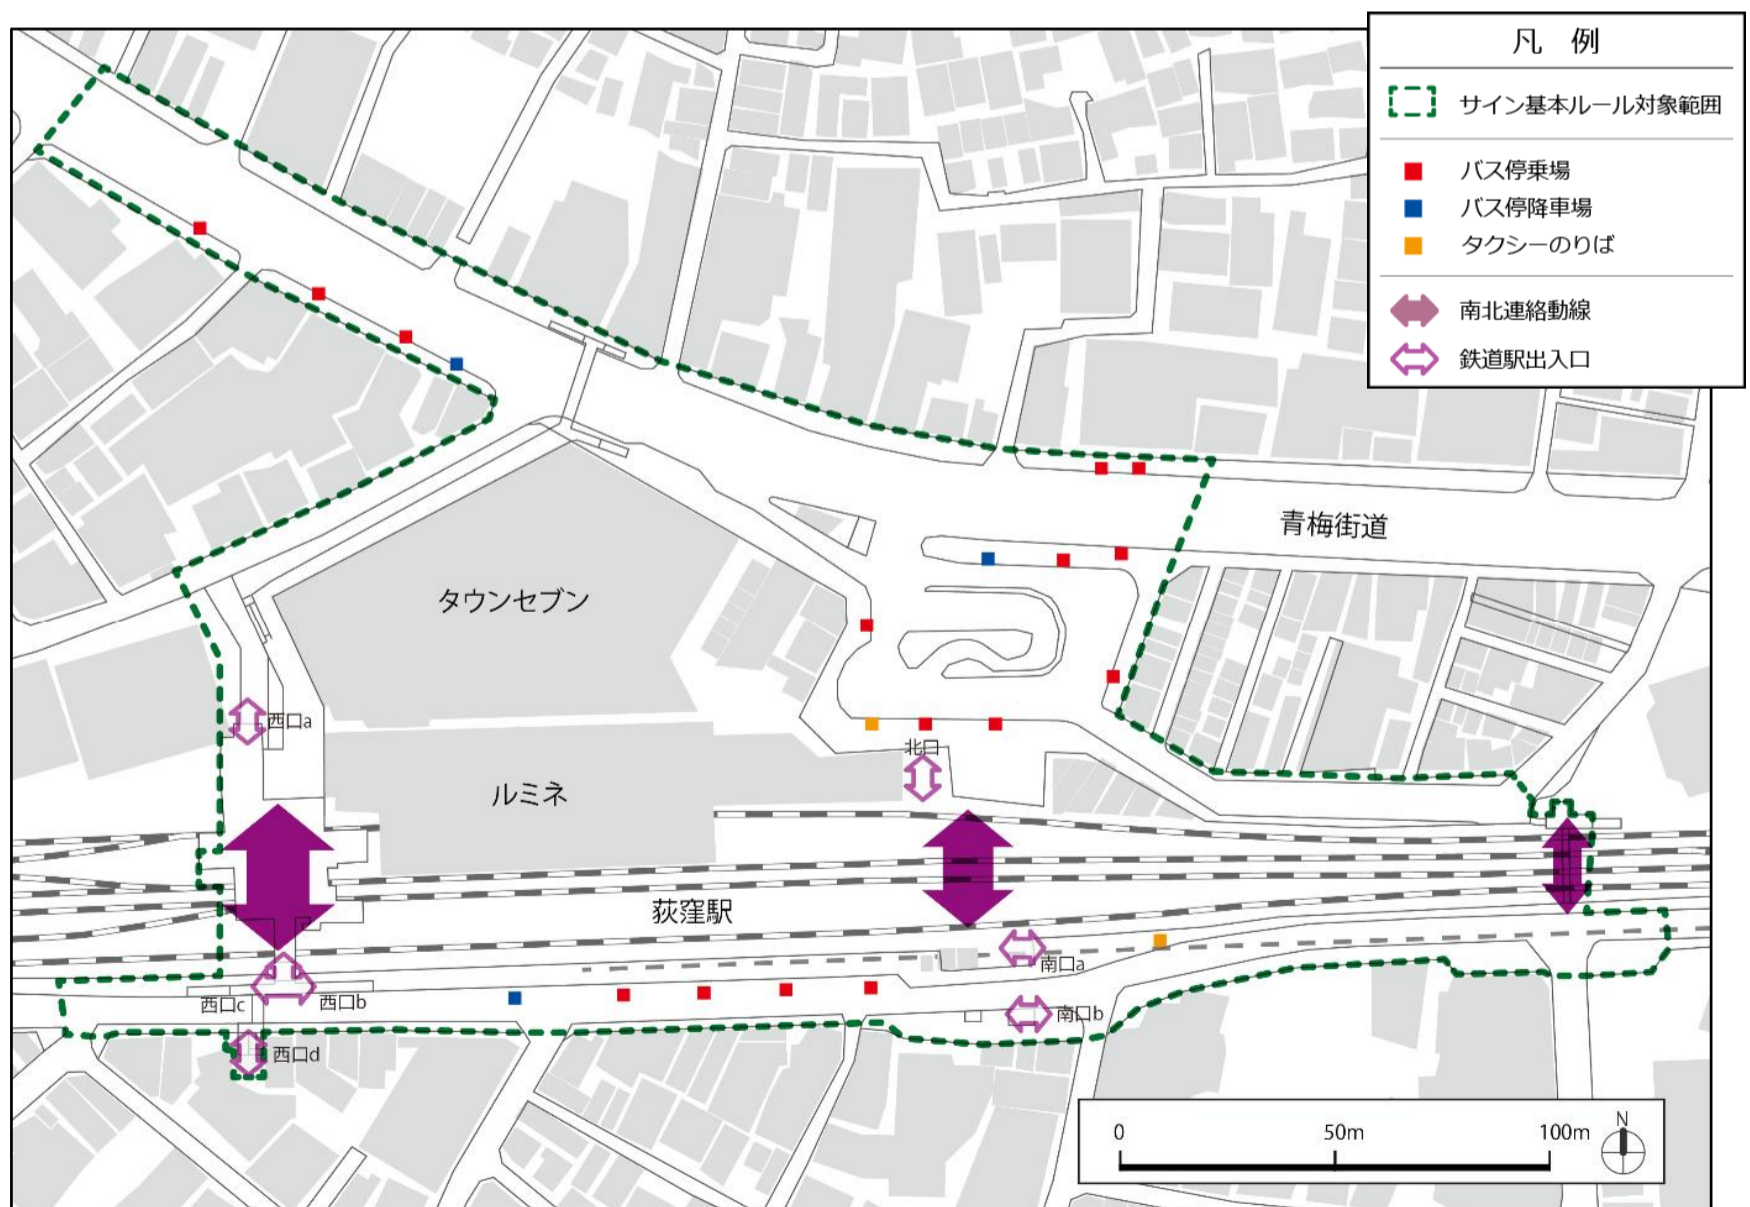

## 第2章 サイン整備について

### I. 案内・誘導サイン等の整備

#### (1) サイン計画

各サインのレイアウトイメージ（表示内容）、整備対象（配置、設置者、種別等）については、次の通りとします。

※更新方法については新規設置、全部更新、部分更新が含まれます。

※全部更新とは、既存サインの表示内容の全ての更新が含まれます。更新方法は、サイン本体の交換、表示面のみ更新が該当します。

※部分更新とは、既存サインの表示内容の一部の更新が含まれます。なお、部分更新に当たっては、表示内容は基本ルールの考え方を原則としますが、既存サインの形状などの状況によっては、基本ルールによらない関係者間の協議による調整を可能とします。


※詳細なサインレイアウトについては、別添資料参照

#### サインレイアウトイメージ

##### ◆指示サイン





##### ◆図解サイン

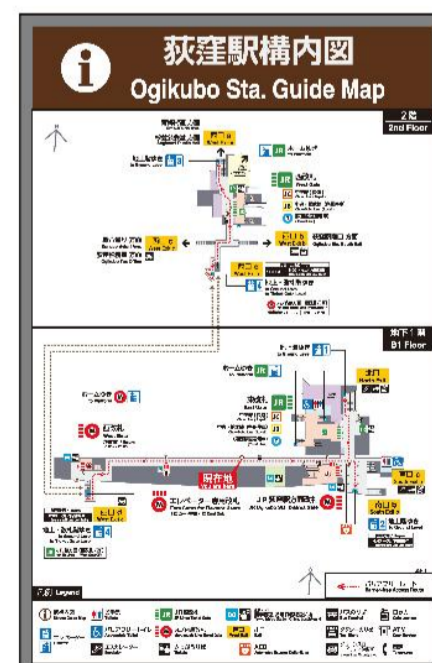

**整備対象**

《位置図／配置イメージ（地下1階・2階）》※EVサインの詳細についてはⅡ章参照

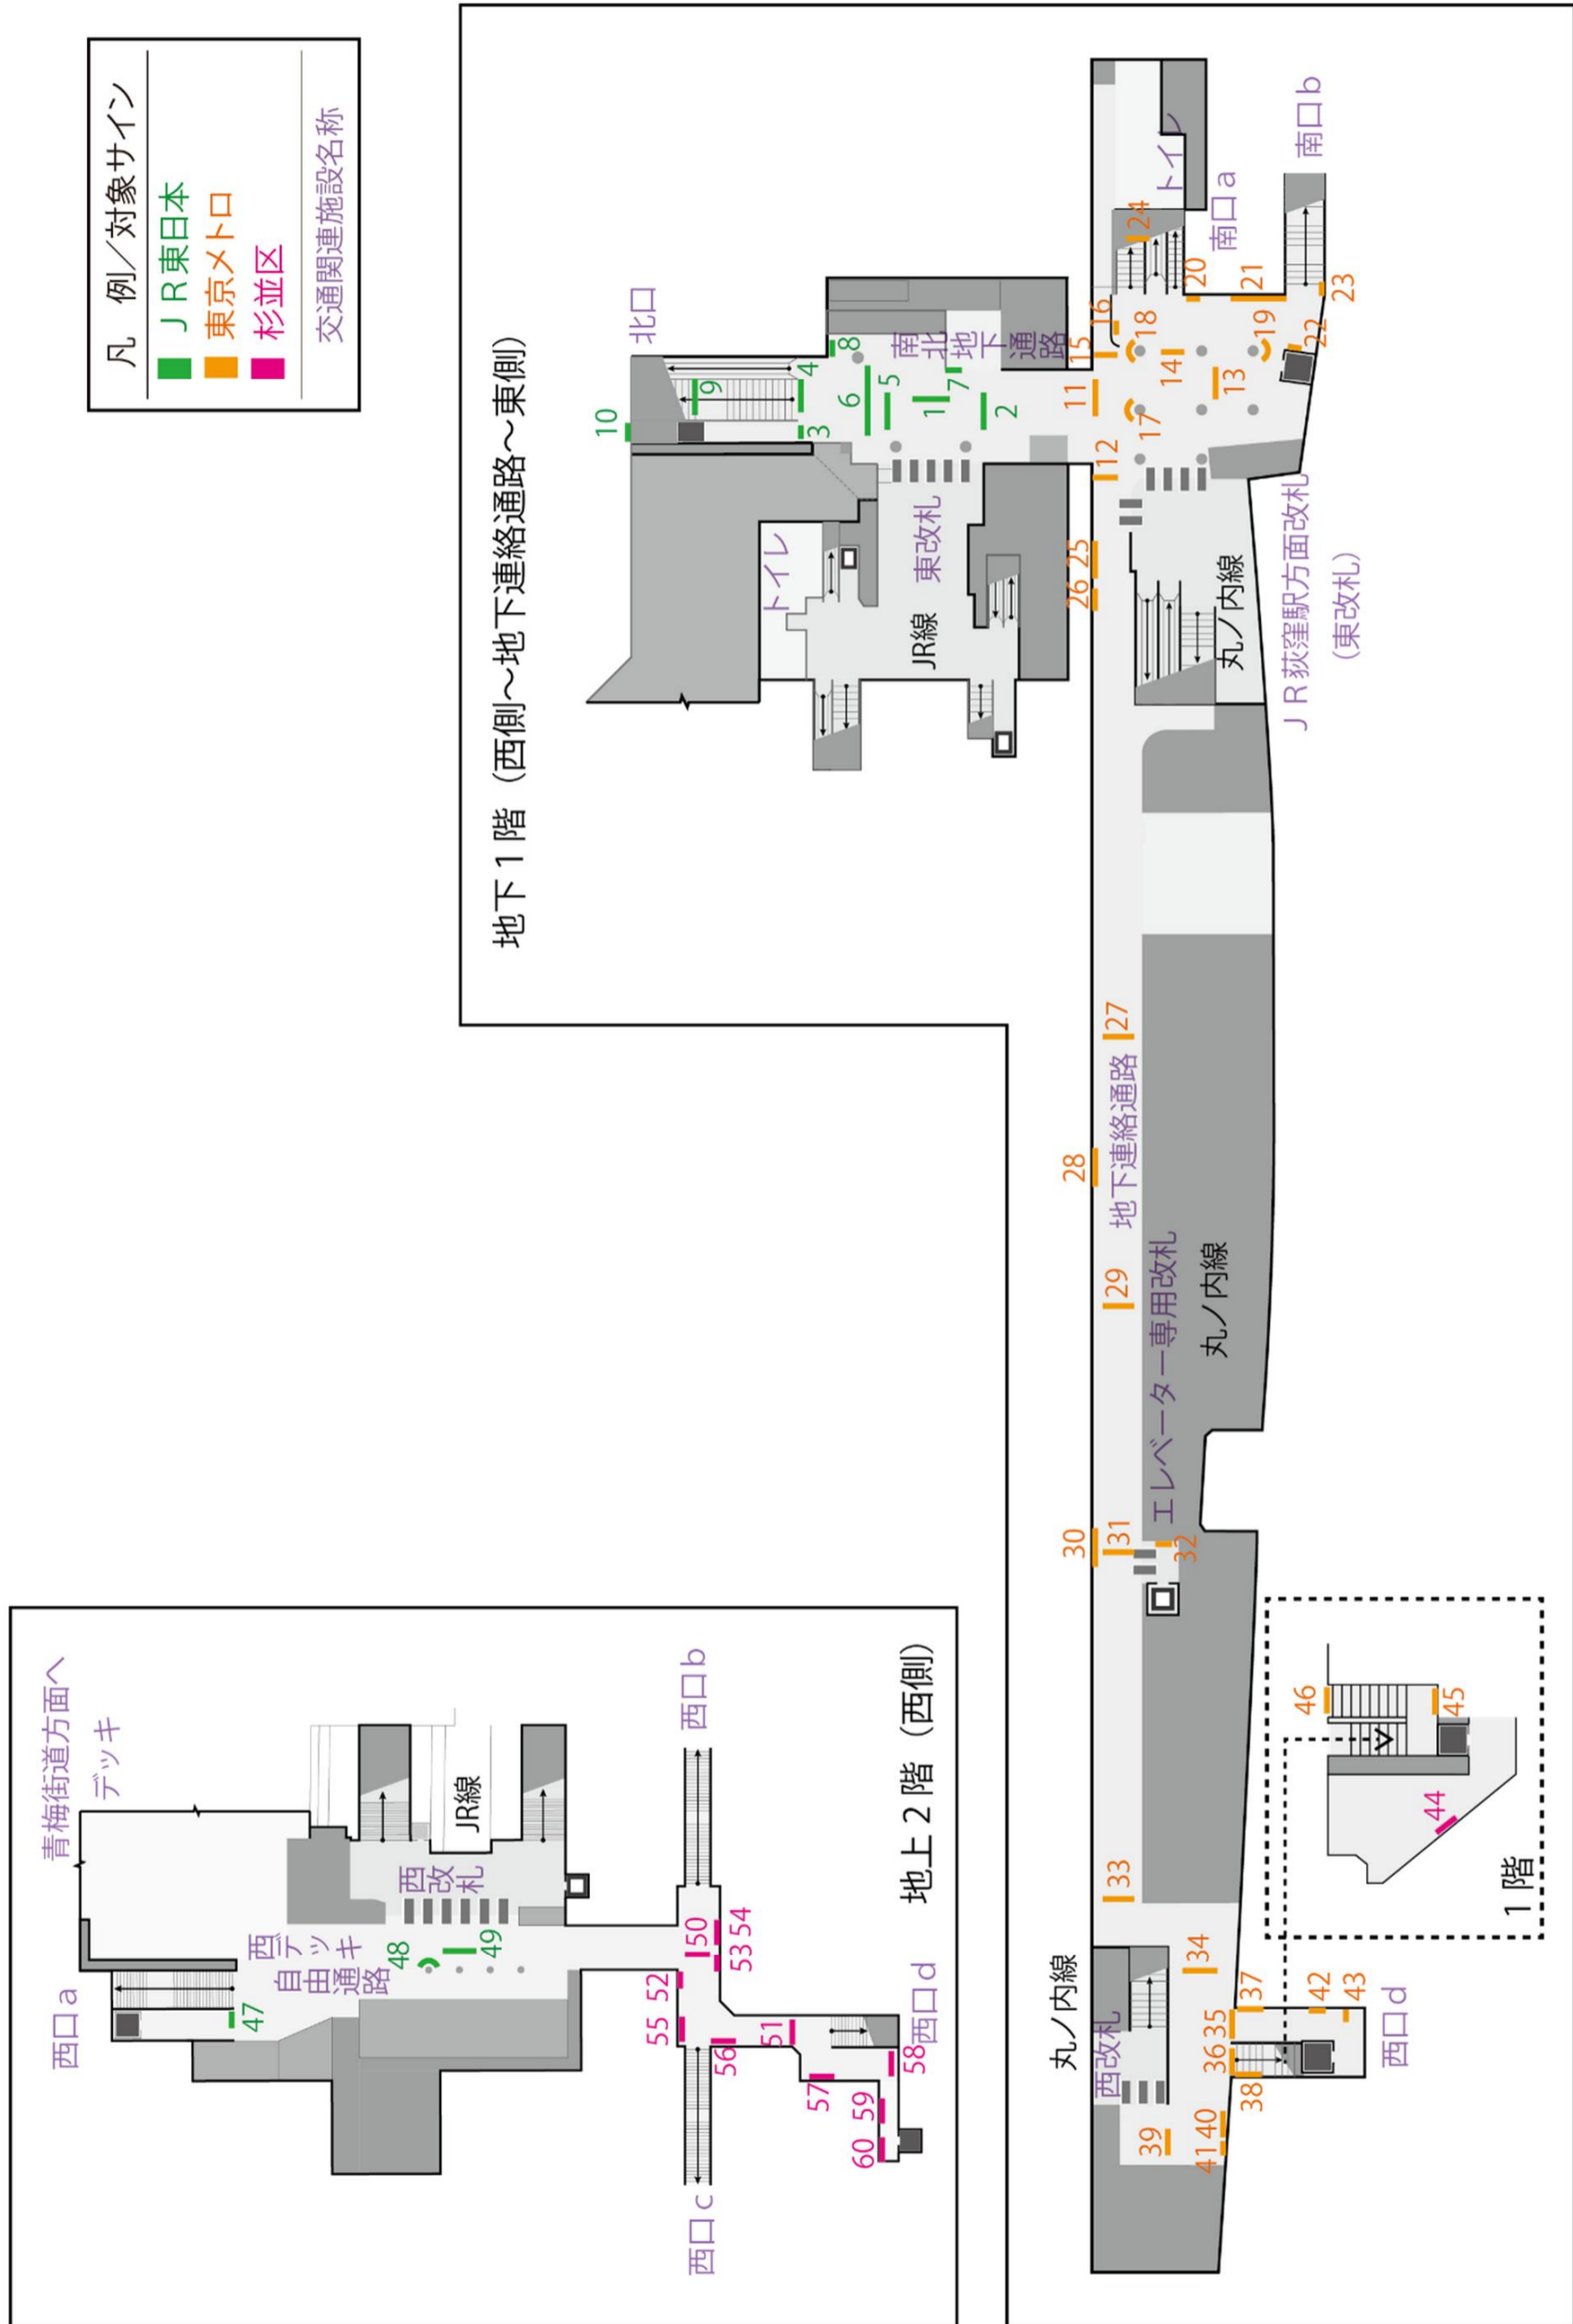

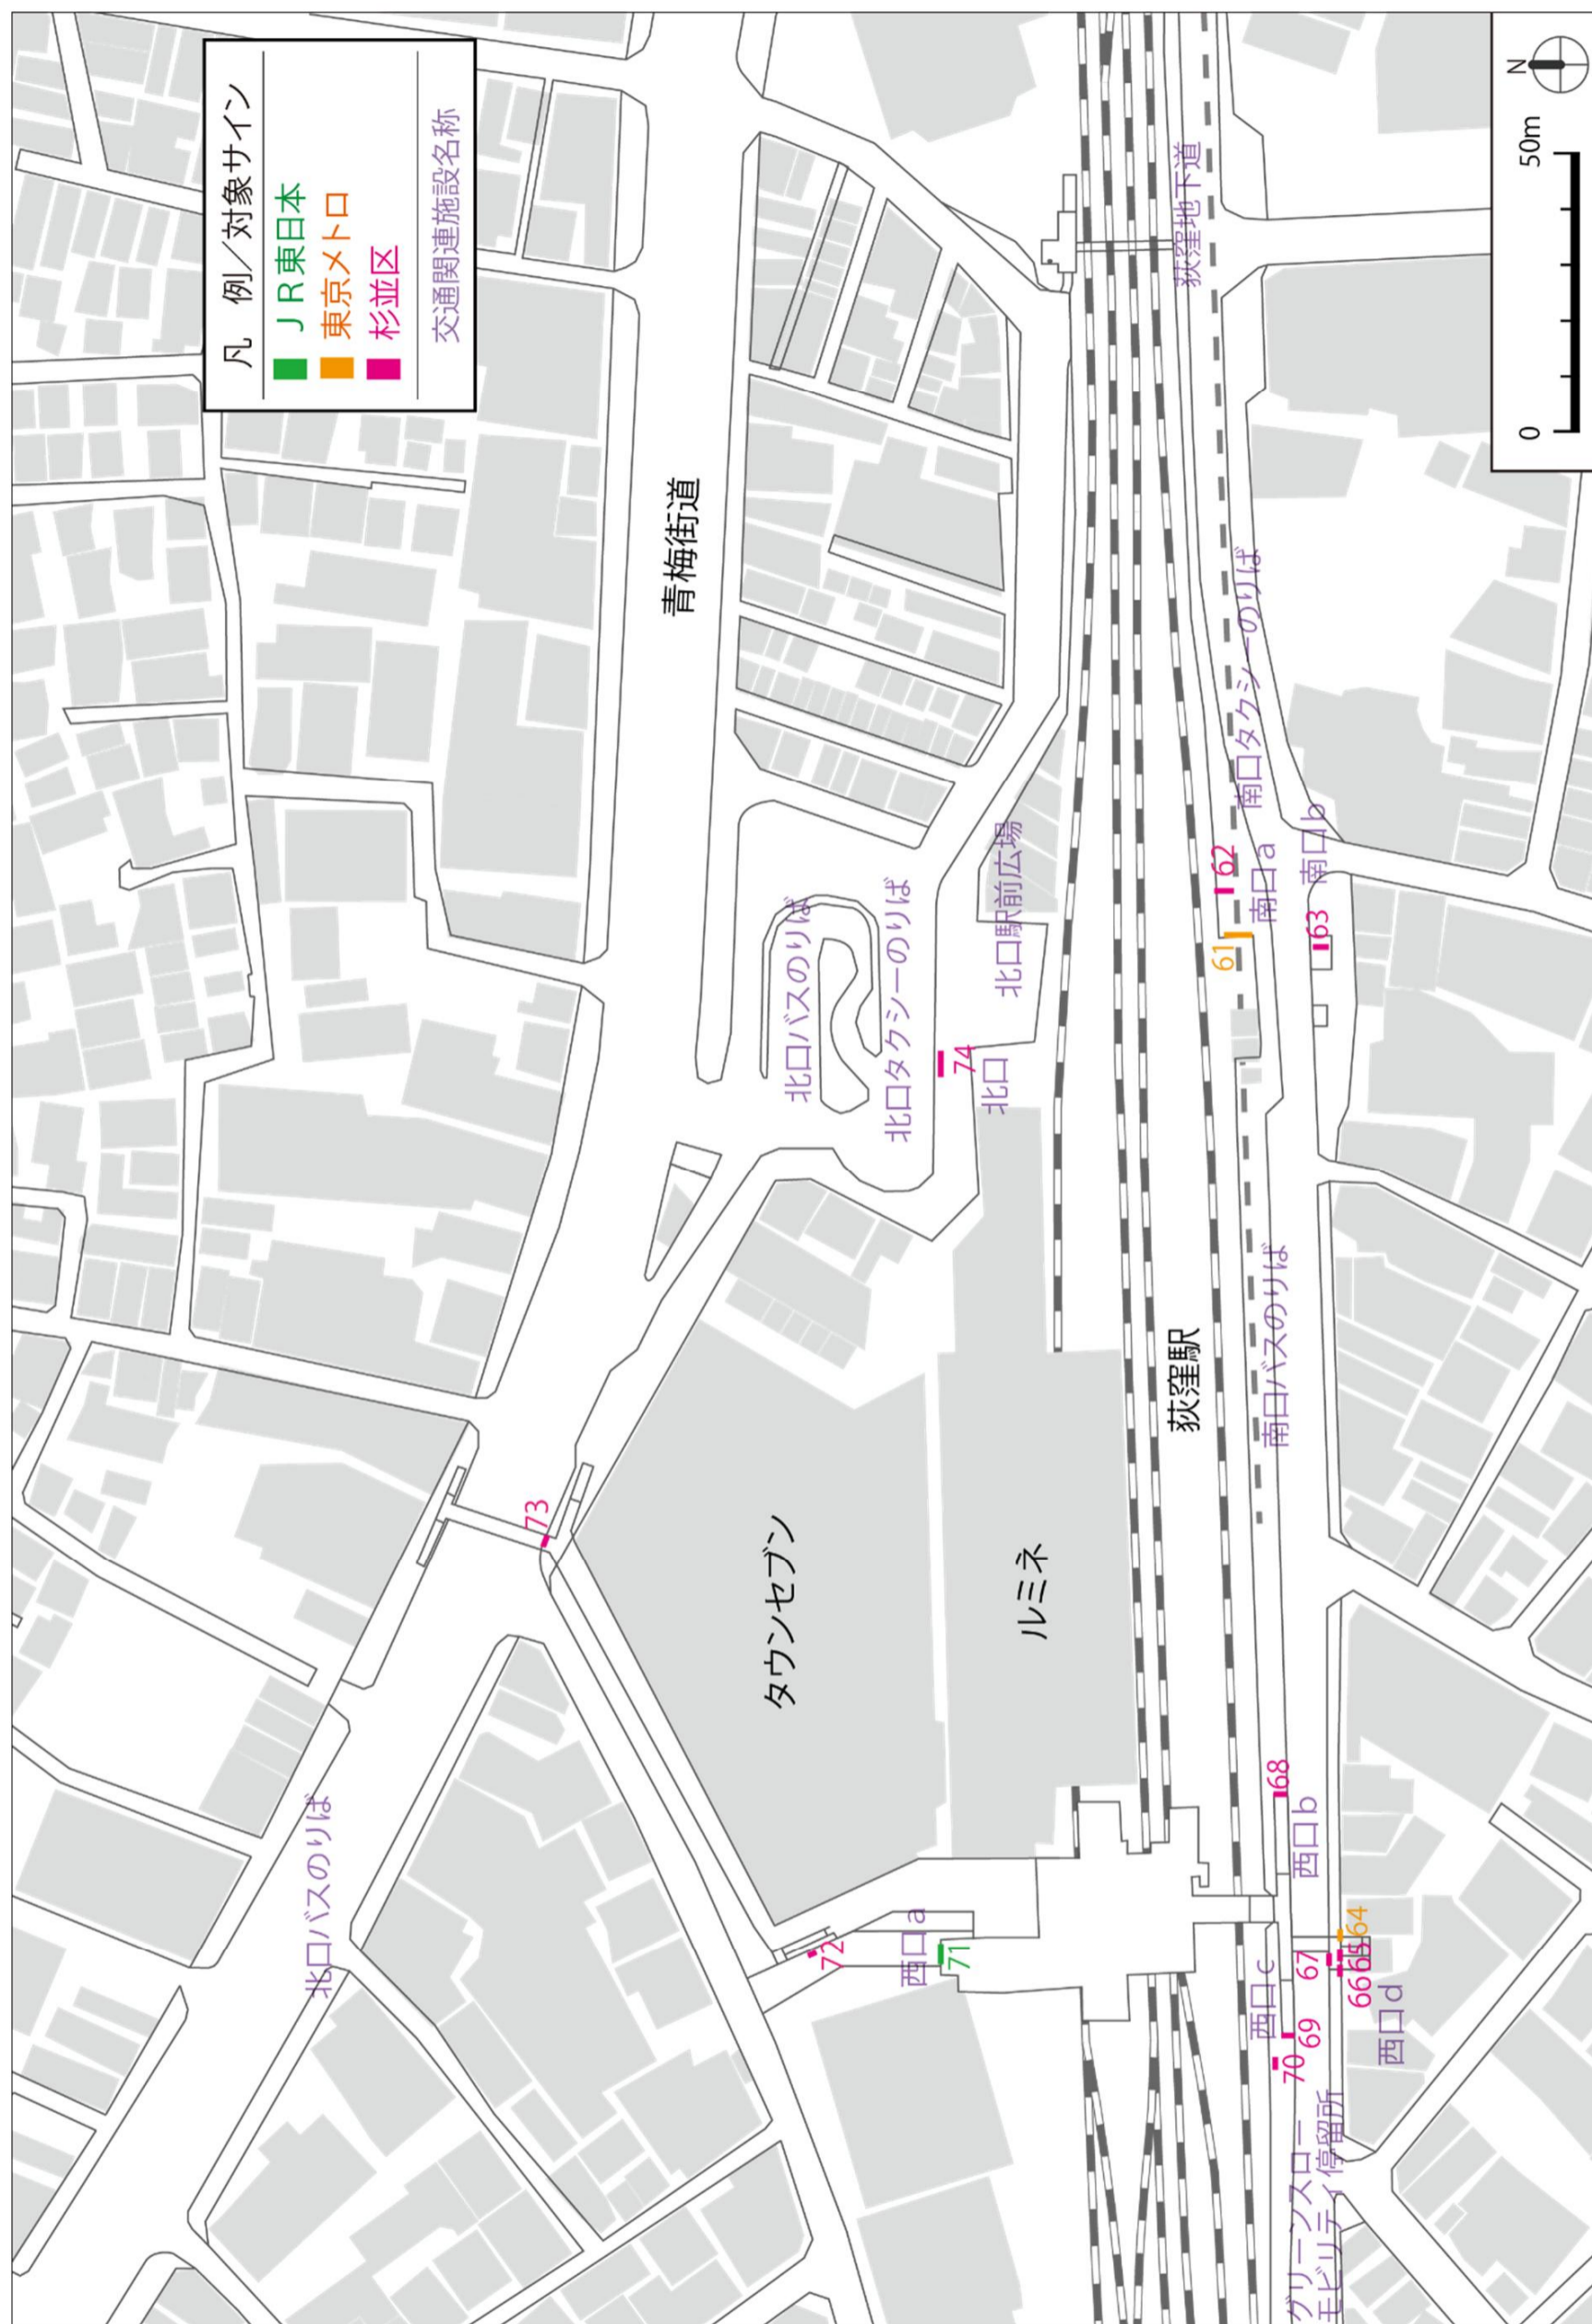

※自立式案内板（No.62, No.67, No.70, No.72, No.73, No.74）については、今後の関係者と協議の結果、設置場所を変更する可能性があります。

《設置場所別の整備対象サイン/設置者/種別/対応/更新方法/設置方式/面数/大きさ/掲載内容》

サインNO 番号	サイン 場所	サイン 設置者	サイン 種別	対応	更新方法	設置 方式	面 数	大きさ(mm)		掲載内容					備考
								幅	高さ	構内図	周辺図	誘導	位置	現在地	
1	B1F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	2480	350	-	-	○		○	
2	B1F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	2480	350	-	-	○		○	
3	B1F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	1	680	350	-	-	○			
4	B1F	JR	指示	新規設置		吊り下げ(非内照)	1	1280	350	-	-	○		○	北側の表示なし
5	B1F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	2480	350	-	-	○			
6	B1F	JR	指示	全部更新	シール撤去貼り替え	壁付け	1	5000	300	-	-	○			
7	B1F	JR	指示	整備済み	-	壁付け	1	500	300	-	-	○			第1期新規整備
8	B1F	JR	図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	500	500	○					第1期新規整備 構内図の部分更新
9	B1F	JR	同定	全部更新	シール上貼り	壁付け	1	2500	900				○		階段の上下表記追加
10	地上階	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	1	680	250			○			
11	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3000	200			○			第1期EV番号のみシール対応
12	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3000	200			○			第1期EV番号のみシール対応
13	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3500	200			○		○	第1期EV番号のみシール対応
14	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	2600	200			○		○	第1期EV番号のみシール対応
15	B1F	メトロ	同定	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ	2	1600	200				○		
16	B1F	メトロ	同定	全部更新	既存サイン撤去新設	既設案内板	1	430	1820				○		トイレ内レイアウト図を設置者により追加
17	B1F	メトロ	指示 図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	500	520			○			第1期新規整備 構内図(下段)のみ部分更新
							1	500	500	○					
18	B1F	メトロ	図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	680	500	○					第1期新規整備 構内図の部分更新
19	B1F	メトロ	指示	整備済み	-	壁付け	1	500	520			○			第1期新規整備
20	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	500	1600			○			
21	B1F	メトロ	指示	全部更新	シール上貼り	壁付け	2	1530	340			○			第1期EV番号のみシール対応 既存サイン下部は対象外
22	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	500	1600			○		○	
23	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	500	1600			○			
24	B1F	メトロ	同定	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	3500	900			○			
25	B1F	メトロ	指示	全部更新	シール上貼り	壁付け	2	1530	340			○			第1期EV番号のみシール対応 既存サイン下部は対象外
26	B1F	メトロ	指示 図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	500	360			○			第1期新規整備 構内図(下段)のみ部分更新
							1	500	500	○					
27	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3500	200			○		○	第1期EV番号のみシール対応
28	B1F	メトロ	図解 指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	1030	1600	○					第1期新規整備の構内図(下段)は部分更新、指示サインは全部更新
							1	1630	1600			○		○	
29	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3500	200			○		○	第1期EV番号のみシール対応
30	B1F	メトロ	図解 指示	部分更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	1030	1600	○					第1期新規整備の構内図(下段)は部分更新、指示サインは全部更新
							1	1630	1600			○		○	

《設置場所別の整備対象サイン/設置者/種別/対応/更新方法/設置方式/面数/大きさ/掲載内容》

サインNO 番号	サイン 場所	サイン 設置者	サイン 種別	対応	更新方法	設置 方式	面 数	大きさ(mm)		掲載内容					備考
								幅	高さ	構内図	周辺図	誘導	位置	所在地	
31	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3000	200			○	○	第1期EV番号のみシール対応	
32	B1F	メトロ	指示	整備済み	-	壁付け	1	600	500			○		第1期新規整備	
33	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3500	200			○	○	第1期EV番号のみシール対応	
34	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3500	200			○		第1期EV番号のみシール対応	
35	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3000	200			○		第1期EV番号のみシール対応	
36	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	2	3000	200			○		第1期EV番号のみシール対応	
37	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	440	2210			○		第1期EV番号のみシール対応	
38	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	500	1600			○			
39	B1F	メトロ	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ(非内照)	1	3500	200			○		北側のみ更新	
40	B1F	メトロ	指示	全部更新	シール上貼り	壁付け	2	1530	340			○		第1期EV番号のみシール対応 既存サイン下部は対象外	
41	B1F	メトロ	指示 図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	500	360			○		第1期新規整備 構内図(下段)のみ部分更新	
							1	500	520	○					
42	B1F	メトロ	指示	整備済み	-	壁付け	1	500	350			○		第1期新規整備	
43	B1F	メトロ	指示	整備済み	-	壁付け	1	500	185			○		第1期新規整備	
44	地上階	杉並区	指示	整備済み	-	壁付け	1	500	280			○		第1期新規整備	
45	地上階	メトロ	同定	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	1500	900			○			
46	地上階	メトロ	指示 同定	全部更新	既存パネル撤去新設	吊り下げ	1	2000	250			○	○		
47	2F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	吊り下げ(非内照)	1	740	350			○			
48	2F	JR	指示 図解	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	400	300			○		第1期新規整備 構内図(下段)のみ部分更新	
							1	400	450	○					
49	2F	JR	指示	全部更新	既存サイン撤去新設	壁付け(非内照)	1	1280	500			○			
50	2F	杉並区	指示	全部更新	シール上貼り	吊り下げ(非内照)	2	3479	500			○	○	既存サイン上に方向毎に金属での仕切り板(縦)有り	
51	2F	杉並区	指示	全部更新	シール上貼り	吊り下げ(非内照)	2	2550	500			○	○	既存サイン上に方向毎に金属での仕切り板(縦)有り	
52	2F	杉並区	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	300	700			○			
53	2F	杉並区	指示	全部更新	既存パネル撤去新設	壁付け	1	300	1300			○			
54	2F	杉並区	指示	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	1650	400			○		出口表記を含む上部のみ更新	
55	2F	杉並区	指示	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	1000	400			○		出口表記を含む上部のみ更新	
56	2F	杉並区	指示	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	1000	400			○		出口表記を含む上部のみ更新	
57	2F	杉並区	指示	整備済み	-	壁付け	1	650	350			○		第1期新規整備	
58	2F	杉並区	指示	整備済み	-	壁付け	1	650	350			○		第1期新規整備	
59	2F	杉並区	指示	整備済み	-	壁付け	1	420	240			○		第1期新規整備	
60	2F	杉並区	指示	部分更新	シール上貼り	壁付け	1	420	240			○		出口表記を含む上部のみ更新	
61	地上階	メトロ	同定	全部更新	既存パネル撤去新設	既設案内板	1	2500	900			○			

《設置場所別の整備対象サイン/設置者/種別/対応/更新方法/設置方式/面数/大きさ/掲載内容》

サインNO 番号	サイン 場所	サイン 設置者	サイン 種別	対応	更新方法	設置 方式	面 数	大きさ(mm)		掲載内容					備考
								幅	高さ	構内図	周辺図	誘導	位置	現在地	
62	道路等	杉並区	図解 指示	新規 設置		自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定
63	B1F	杉並区	同定	全部 更新	シール 上貼り	壁付け	1	2660	850				○		階段の上下表記追加
64	地上階	メトロ	同定	全部 更新	既存サイン 撤去新設	壁付け	1	300	620				○		西口dの利用時間等の説明分 を追加
65	地上階	杉並区	指示 同定	全部 更新	既存パネル 撤去新設	壁付け	1	2100	300			○	○		
66	地上階	杉並区	指示	整備 済み	-	壁付け	1	300	550			○			第1期新規整備
67	道路等	杉並区	図解 指示	新規 設置		自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定
68	地上階	杉並区	同定	新規 設置		壁付け	1	280	350				○		階段入口の壁面正面に設置
							1	660	600				○		道路側階段壁面に設置
69	地上階	杉並区	同定	新規 設置		壁付け	1	280	350				○		階段入口の壁面正面に設置
							1	660	600				○		道路側階段壁面に設置
70	道路等	杉並区	図解 指示	新規 設置		自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定
71	地上階	JR	同定	全部 更新	既存サイン 撤去新設	壁付け (非内照)	1	2480	400				○		
72	道路等	杉並区	図解 指示	全部 更新	既存サイン 撤去新設	自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定
73	道路等	杉並区	図解 指示	新規 設置		自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定
74	道路等	杉並区	図解 指示	新規 設置		自立式 案内板	1	600	2000		○	○			周辺図はバス乗り場案内を掲 載予定

※自立式案内板（No.62, No.67, No.70, No.72, No.73, No.74）については、今後の関係者と協議の結果、設置場所を変更する可能性があります。

《設置場所別の現況写真/更新方法/設置者》

<p>1 / 全部更新 / JR</p> 	<p>2 / 全部更新 / JR</p> 	<p>3 / 全部更新 / JR</p> 
<p>4 / 新規設置 / JR</p> 	<p>5 / 全部更新 / JR</p> 	<p>6 / 全部更新 / JR</p> 
<p>7 / 整備済み / JR</p> 	<p>8 / 部分更新 / JR</p> 	<p>9 / 全部更新 / JR</p> 
<p>10 / 全部更新 / JR</p> 	<p>11 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>12 / 全部更新 / メトロ</p> 
<p>13 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>14 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>15 / 全部更新 / メトロ</p> 

《設置場所別の現況写真/更新方法/設置者》

16 / 全部更新 / メトロ	17 / 部分更新 / メトロ	18 / 部分更新 / メトロ
		
19 / 整備済み / メトロ	20 / 全部更新 / メトロ	21 / 全部更新 / メトロ
		
22 / 全部更新 / メトロ	23 / 全部更新 / メトロ	24 / 全部更新 / メトロ
		
25 / 全部更新 / メトロ	26 / 部分更新 / メトロ	27 / 全部更新 / メトロ
		
28 / 全部更新 / メトロ	29 / 全部更新 / メトロ	30 / 部分更新 / メトロ
		

《設置場所別の現況写真/更新方法/設置者》

<p>31 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>32 / 整備済み / メトロ</p> 	<p>33 / 全部更新 / メトロ</p> 
<p>34 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>35 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>36 / 全部更新 / メトロ</p> 
<p>37 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>38 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>39 / 全部更新 / メトロ</p> 
<p>40 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>41 / 部分更新 / メトロ</p> 	<p>42 / 整備済み / メトロ</p> 
<p>43 / 整備済み / メトロ</p> 	<p>44 / 整備済み / 杉並区</p> 	<p>45 / 全部更新 / メトロ</p> 

《設置場所別の現況写真/更新方法/設置者》

<p>46 / 全部更新 / メトロ</p> 	<p>47 / 全部更新 / JR</p> 	<p>48 / 部分更新 / JR</p> 
<p>49 / 全部更新 / JR</p> 	<p>50 / 全部更新 / 杉並区</p> 	<p>51 / 全部更新 / 杉並区</p> 
<p>52 / 全部更新 / 杉並区</p> 	<p>53 / 全部更新 / 杉並区</p> 	<p>54 / 部分更新 / 杉並区</p> 
<p>55 / 部分更新 / 杉並区</p> 	<p>56 / 部分更新 / 杉並区</p> 	<p>57 / 整備済み / 杉並区</p> 
<p>58 / 整備済み / 杉並区</p> 	<p>59 / 整備済み / 杉並区</p> 	<p>60 / 部分更新 / 杉並区</p> 

《設置場所別の現況写真/更新方法/設置者》

61 / 全部更新 / メトロ	62 / 新規設置 / 杉並区	63 / 全部更新 / 杉並区
		
64 / 全部更新 / メトロ	65 / 全部更新 / 杉並区	66 / 整備済み / 杉並区
		
67 / 新規設置 / 杉並区	68 / 新規設置 / 杉並区	69 / 新規設置 / 杉並区
		
70 / 新規設置 / 杉並区	71 / 全部更新 / JR	72 / 全部更新 / 杉並区
		
73 / 新規設置 / 杉並区	74 / 新規設置 / 杉並区	
		

※自立式案内板 (No.62, No.67, No.70, No.72, No.73, No.74) については、今後の関係者と協議の結果、設置場所を変更する可能性があります。

## Ⅱ. エレベーターサインの整備

### (1) エレベーターサイン計画

各サインの基本的な考え方、レイアウトイメージ（表示内容）、整備対象（配置、設置者、種別等）については、次の通りとします。

※詳細なサインレイアウトについては、別添資料参照

#### 基本的な考え方

- ・利用者が遠くからでも視認しやすい位置にエレベーター（ピクト）及び設定した番号を記載したサインを各エレベーターのりばに設置します。
- ・現在地及び行き先が判断できるように、各階の情報を記載したサインを設置します。

#### サインレイアウトイメージ

##### ◆エレベーター／位置情報




##### ◆エレベーター／各階情報




**整備対象**

《位置図/配置イメージ（地下1階・2階）》

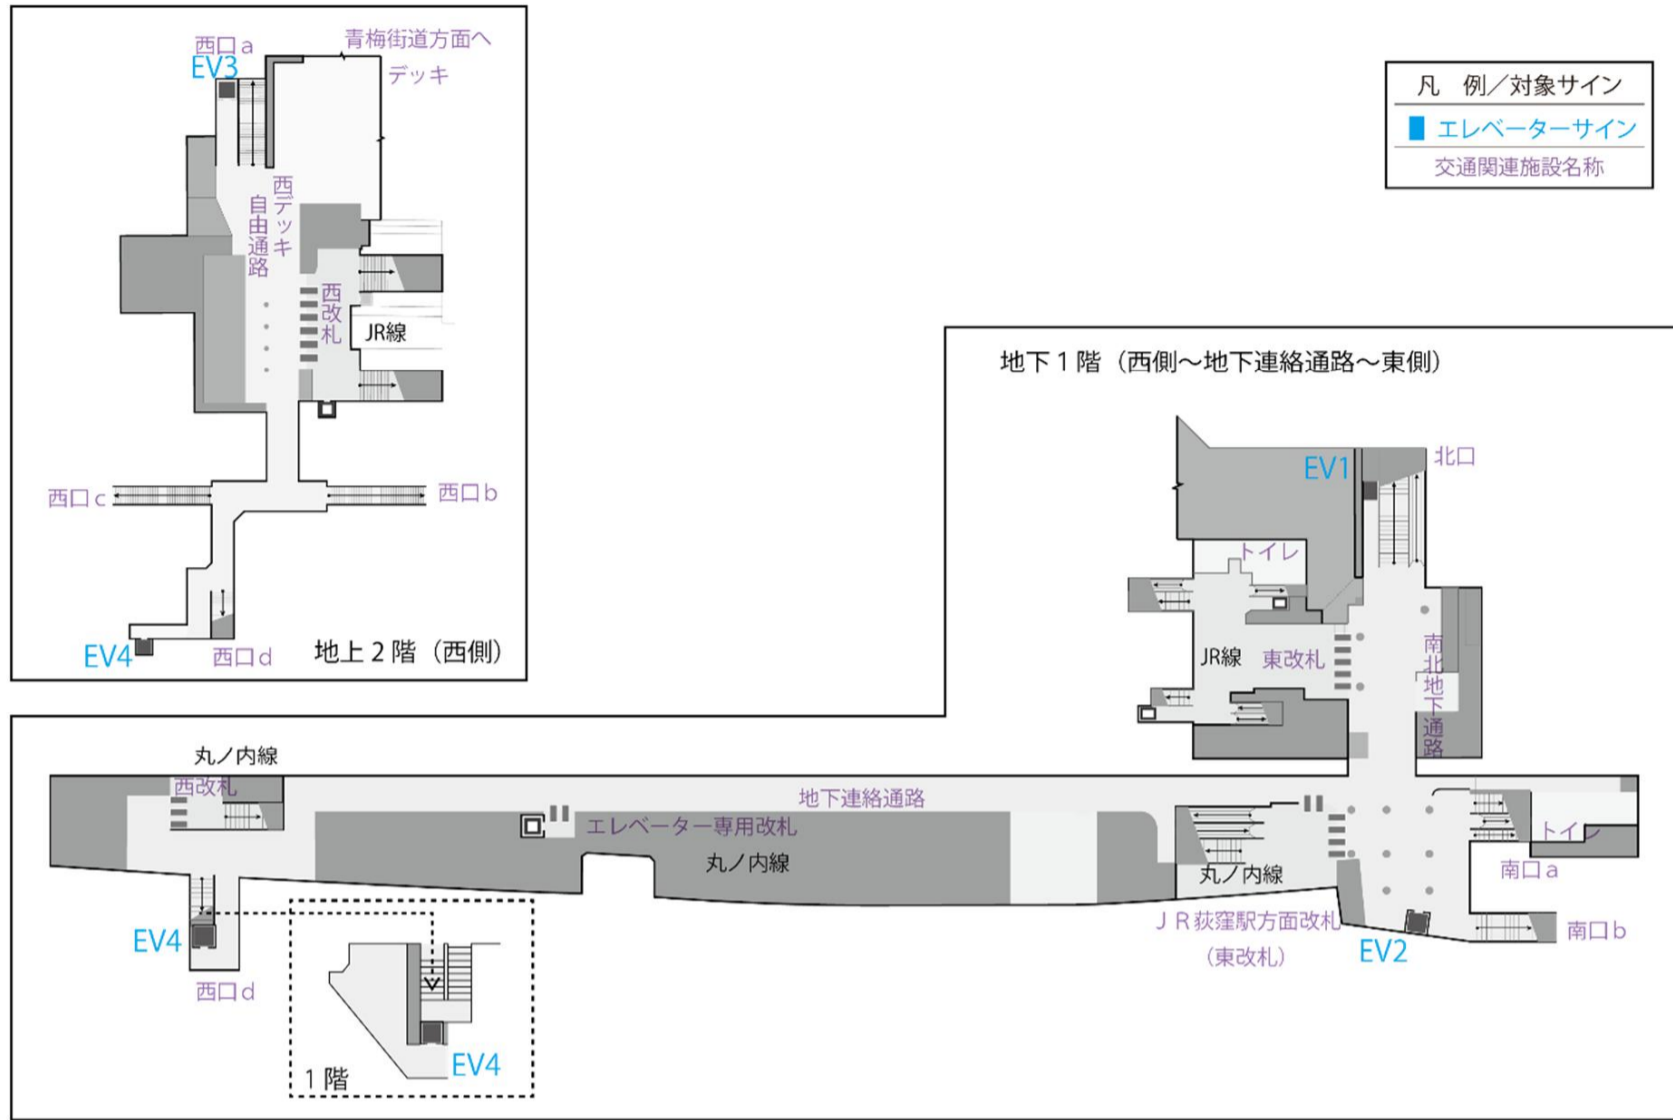

**【地下階】**

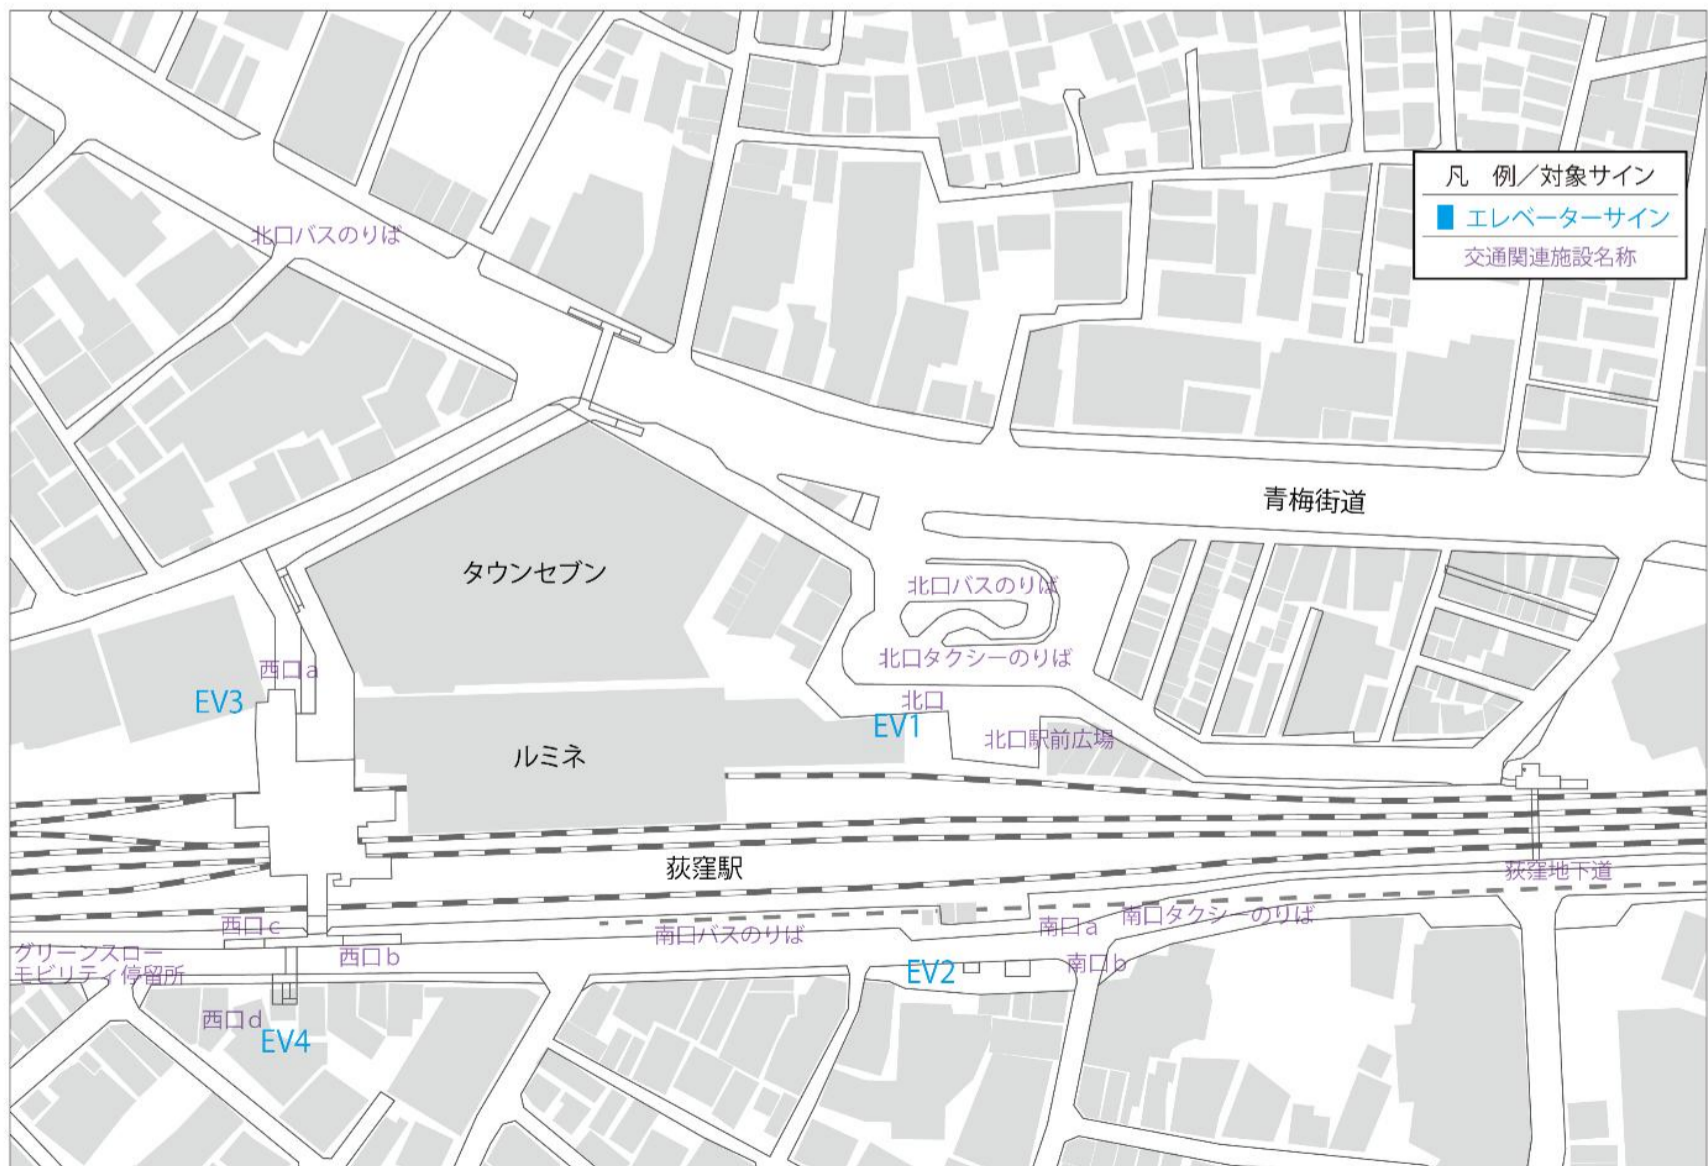

《設置場所別の整備対象サイン/設置者/種別/設置位置/対応/更新方法/面数/大きさ/掲載内容》

サインNO 番号	サイン 場所	サイン 設置者	サイン 種別	設置 位置	対応	更新方法	設置 方式	面数	大きさ(mm)		掲載内容		備考	
									幅	高さ	位置	階数		
EV 1	B1F	JR	EV サイン	①上段	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	1200	250	○	-	第1期整備済みの「北口バス のりば A,B」の「A,B」の記載 を削除	
	B1F	JR	EV サイン	②左正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	300	1200	○	○		
	地上階	JR	EV サイン	③上段	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	1200	250	○	-		第1期新規整備
	地上階	JR	EV サイン	④左正面	整備 済み	-	壁付け	1	300	1200	○	○		第1期新規整備 路線マーク掲載順の変更
EV 2	B1F	杉並区	EV サイン	①上段	整備 済み	-	壁付け	1	800	300	○	-	第1期新規整備	
	B1F	杉並区	EV サイン	②左正面	整備 済み	-	壁付け	1	400	1200	○	○	第1期新規整備	
	地上階	杉並区	EV サイン	③上段	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	900	350	○	-	第1期新規整備 路線マーク掲載順の変更	
	地上階	杉並区	EV サイン	④左正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	400	800	○	○	第1期新規整備 路線マーク掲載順の変更	
	地上階	杉並区	EV サイン	⑤背面	整備 済み	-	壁付け	1	420	250	○		第1期新規整備	
EV 3	地上階	杉並区	EV サイン	①上段	整備 済み	-	壁付け	1	1200	250	○	-	第1期新規整備	
	地上階	杉並区	EV サイン	②右正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	300	1200	○	○	第1期新規整備 「西口 a」の記載を追加	
	2F	杉並区	EV サイン	③上段	整備 済み	-	壁付け	1	900	250	○	-	第1期新規整備	
	2F	杉並区	EV サイン	④左正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	300	1080	○	○	第1期新規整備 「西口 a」の記載を追加	
EV 4	B2F	杉並区	EV サイン	①右正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	420	635	○	○	第1期新規整備 「西口 d」の記載を追加 路線マーク掲載順序の変更	
	地上階	杉並区	EV サイン	②左正面 上段	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	600	850	○	○	第1期新規整備 「西口 d」の記載を追加	
	2F	杉並区	EV サイン	③左正面	部分 更新	シール 上貼り	壁付け	1	420	635	○	○	第1期新規整備 「西口 d」の記載を追加	

《設置場所別の現況写真/設置者/階数別/設置位置/更新方法》

	<p>B1F/①上段/部分更新 B1F/②左正面/部分更新</p>	<p>地上階/③上段/部分更新 地上階/④左正面/整備済み</p>	
EV1 / JR			
	<p>B1F/①上段/整備済み B1F/②左正面/整備済み</p>	<p>地上階/③上段/部分更新 地上階/④左正面/部分更新</p>	<p>地上階/⑤背面/整備済み</p>
EV2 / 杉並区			
	<p>地上階/①上段/整備済み 地上階/②右正面/部分更新</p>	<p>2F/③上段/整備済み 2F/④左正面/部分更新</p>	
EV3 / 杉並区			
	<p>B2F/①右正面/部分更新</p>	<p>地上階/②左正面上段/部分更新</p>	<p>2F/③左正面/部分更新</p>
EV4 / 杉並区			

### Ⅲ. 整備の手順とスケジュール

#### 整備手順の基本的な考え方

- ・原則、整備手順及び調整したスケジュールにあわせて、各サイン設置者が整備します。実施整備にあたっては、東京観光財団の「区市町村観光インフラ整備支援補助金」を活用して整備を行います。
- ・サインの連続性を確保するため、可能な限り同時期に整備することとします。

サイン種別	サイン設置者	令和8年度				令和9年度			
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
案内サイン ・ 誘導サイン ・ エレベーターサイン	杉並区					準備期間			
	JR東日本	準備期間							
	東京メトロ								

※原則、整備スケジュールに沿って整備を進めますが、やむを得ない理由により整備スケジュールの調整が必要になった場合は、各サイン設置者間の協議の上、スケジュール変更を可能とします。

※杉並区が整備するサインの内、道路等に設置する自立式案内板については、令和9年度に整備する予定とします。
