資料７

校舎配置案ごとのステップ図

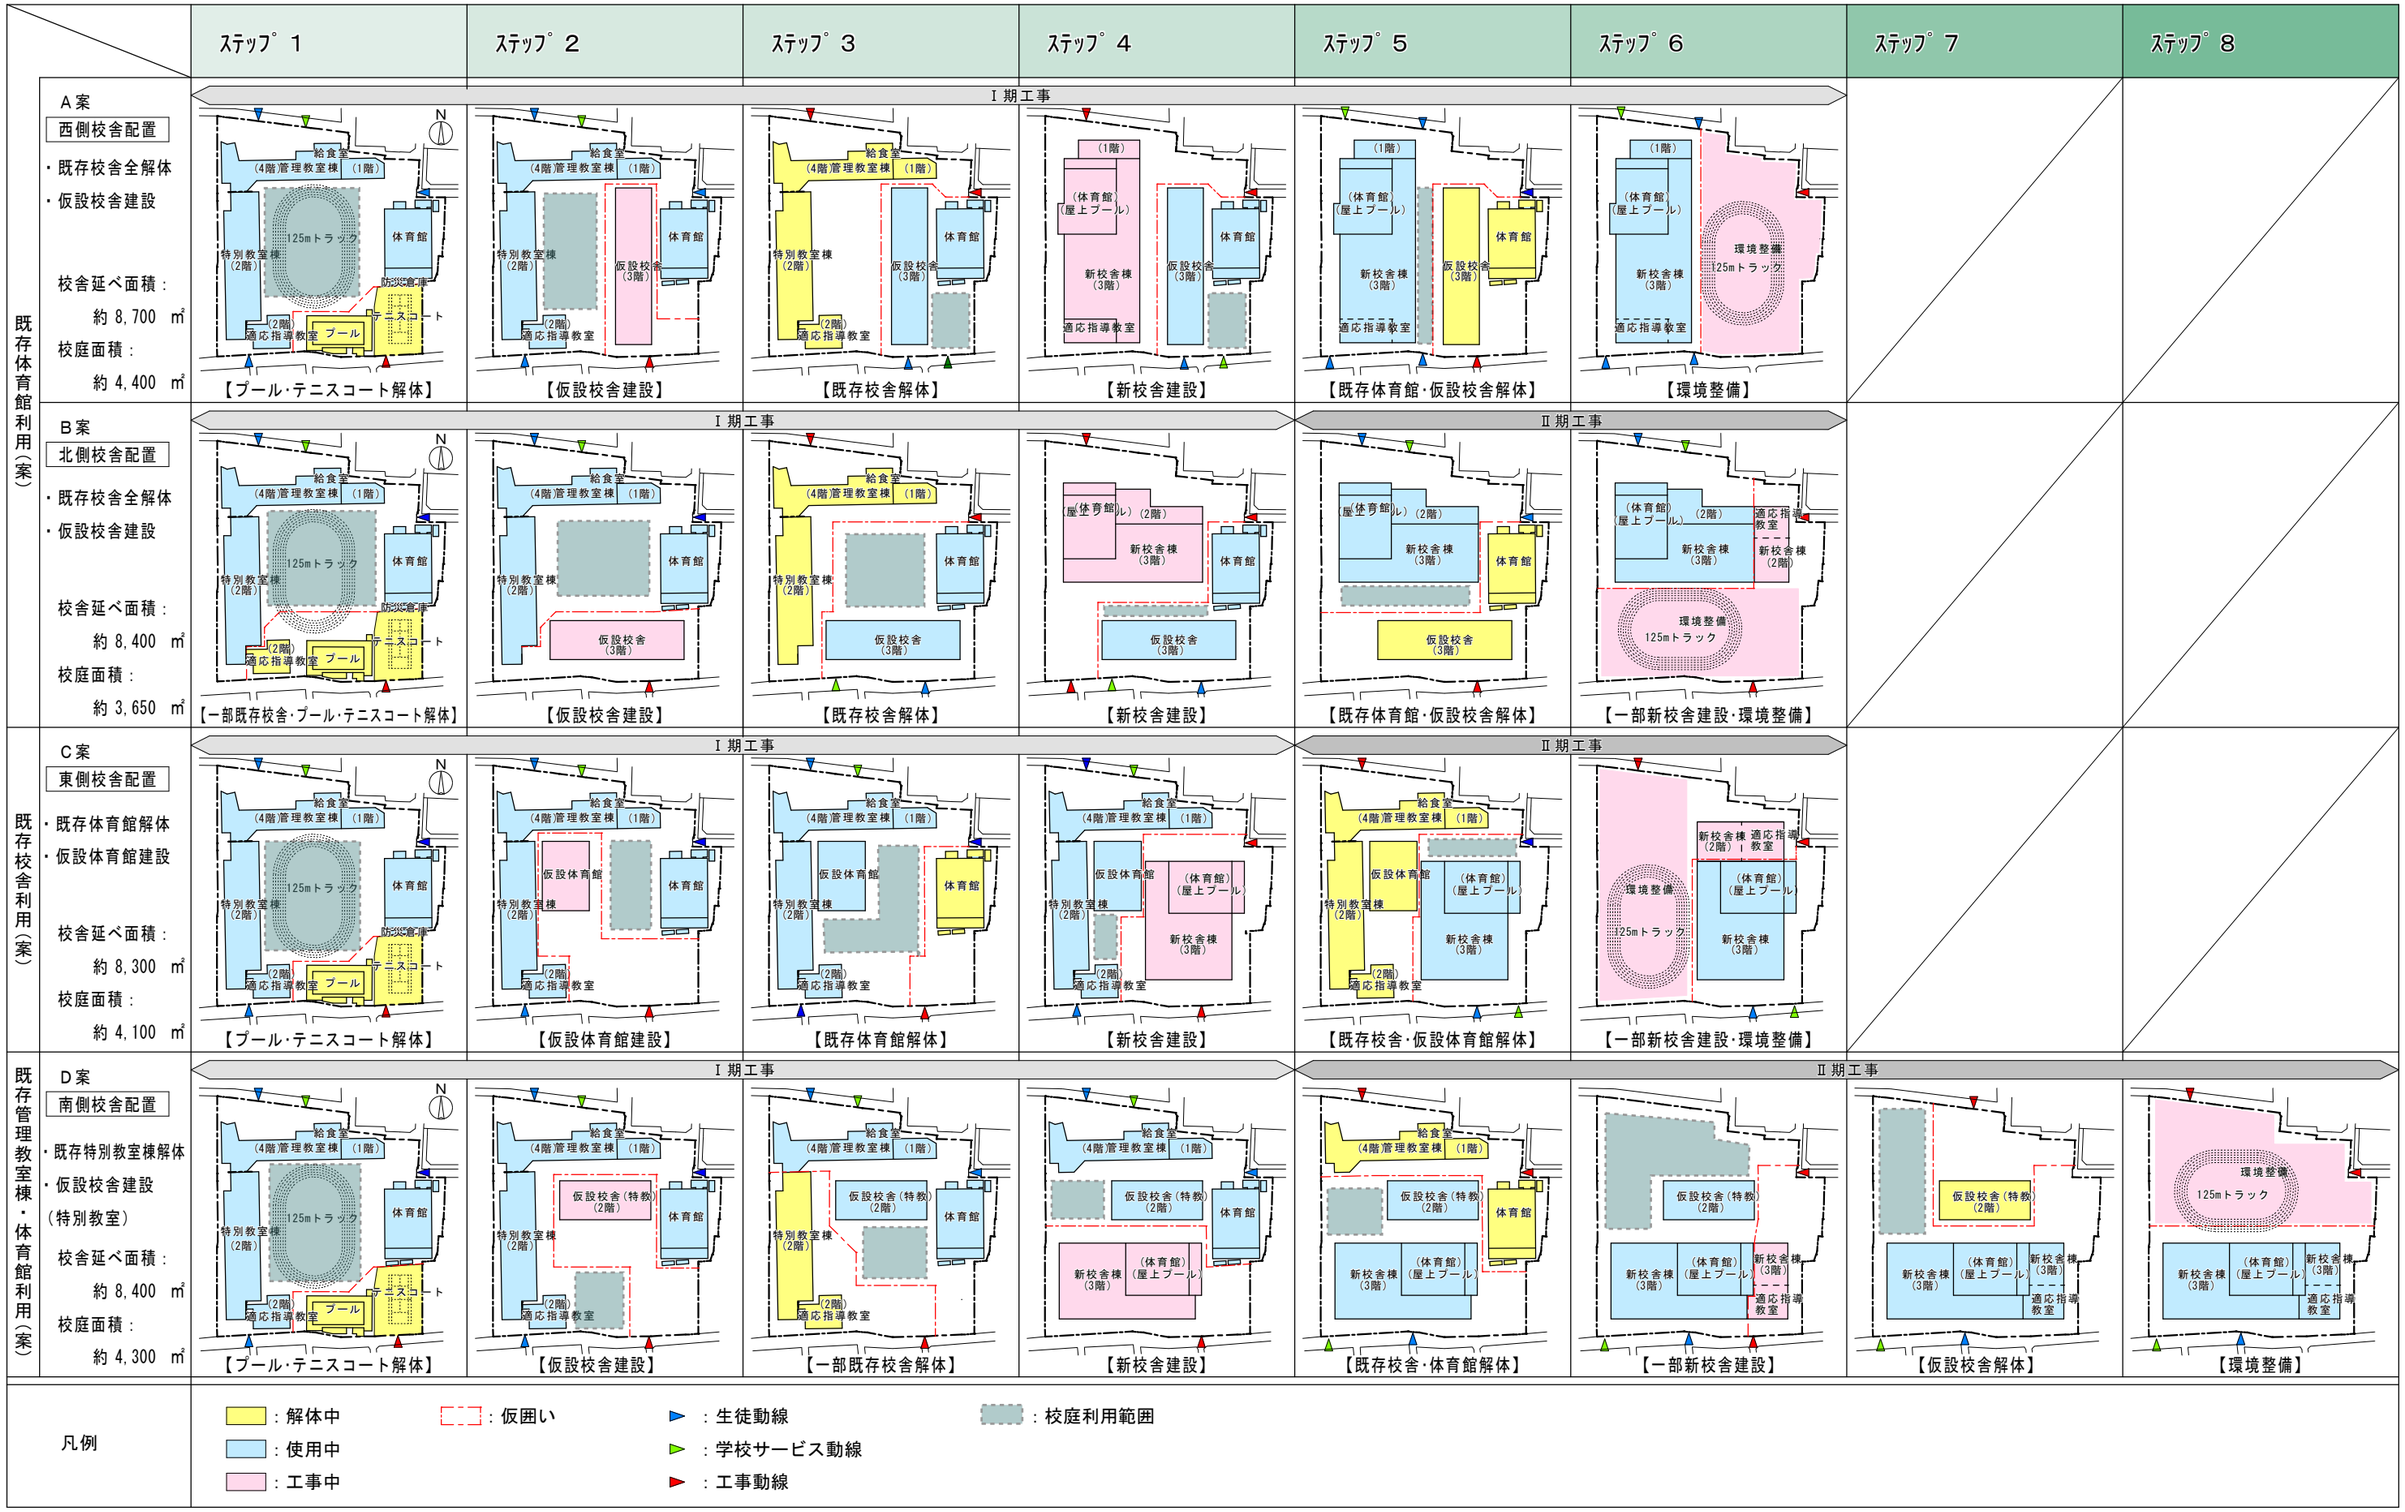

杉並区立天沼中学校及び併設１施設改築工事に伴う基本設計	Title 校舎配置案ごとのステップ図	Scale 1／3000	No.

工事ステップ図（Ａ案）（参考図）

既存

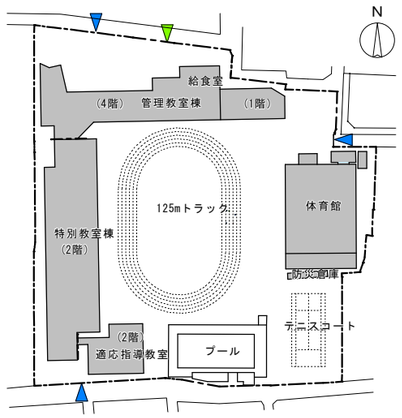

STEP1. ﾌﾟｰﾙ･ﾃﾆｽｺｰﾄ解体

（令和8年10月～令和9年2月末）

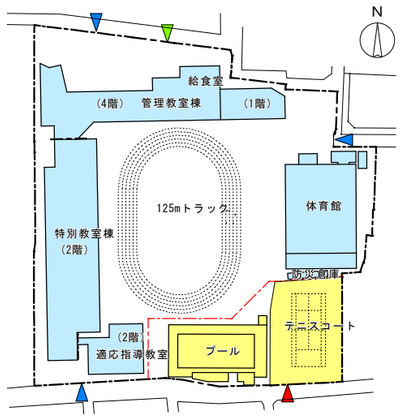

STEP2. 仮設校舎建設

（令和9年4月～令和10年1月末）

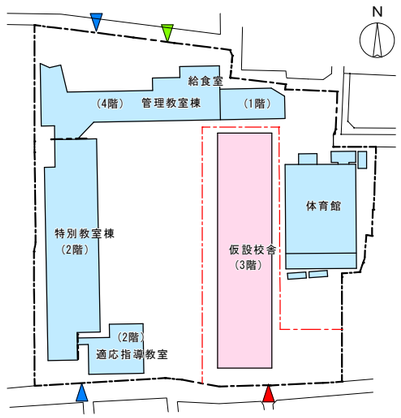

STEP3. 既存校舎解体

（令和10年4月～令和10年11月末）

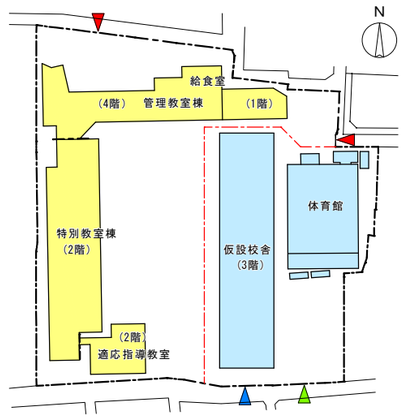

STEP4. 新校舎建設

（令和10年12月～令和13年6月末）

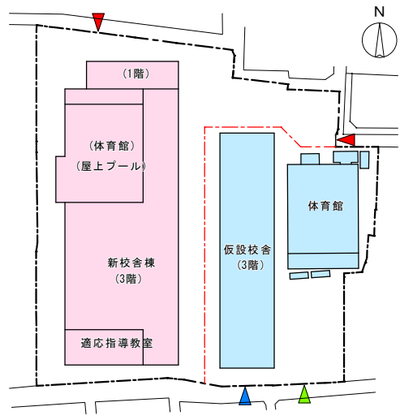

STEP5. 仮設校舎･既存体育館解体

（令和13年9月～令和14年2月末）

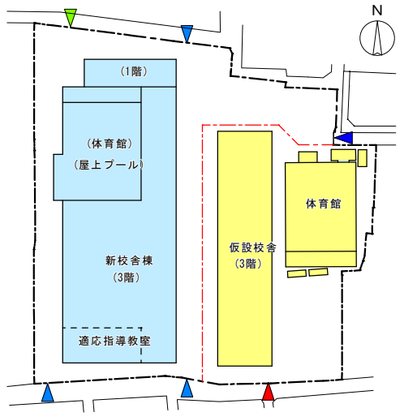

STEP6. 環境整備工事

（令和14年3月～令和14年9月末）

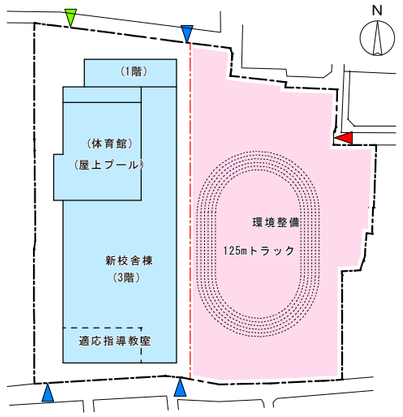

凡例

- ：解体中
- ：使用中
- ：工事中
- ：仮囲い
- ：生徒動線
- ：学校サービス動線
- ：工事動線

0　10　20　50(m)

杉並区立天沼中学校及び併設１施設改築工事に伴う基本設計	Title	工事ステップ図（Ａ案）（参考図）	Scale	1／2000	No.

工事ステップ図（Ｂ案）（参考図）

既存

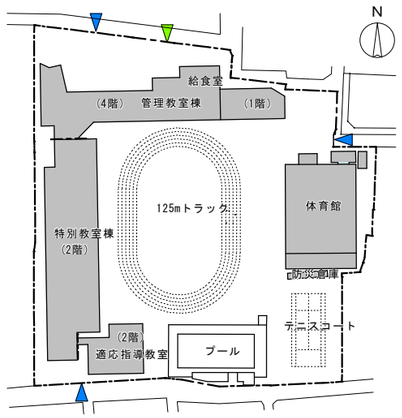

STEP1. 一部既存校舎・ﾌﾟｰﾙ・ﾃﾆｽｺｰﾄ解体

（令和8年10月～令和9年2月末）

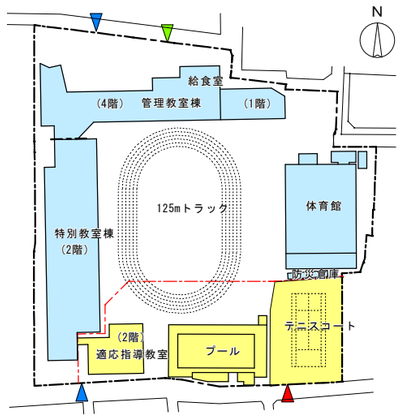

STEP2. 仮設校舎建設

（令和9年4月～令和10年1月末）

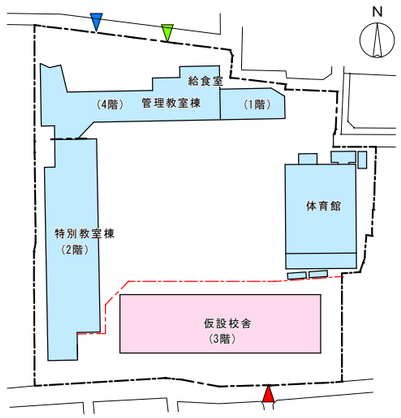

STEP3. 既存校舎解体

（令和10年4月～令和10年11月末）

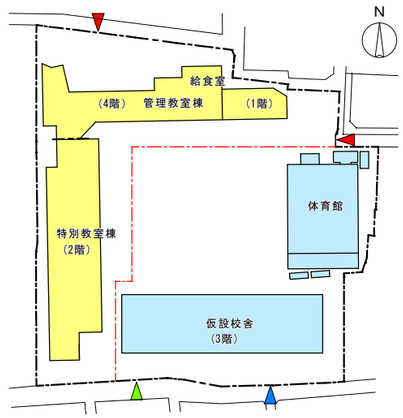

STEP4. 新校舎建設

（令和10年12月～令和12年10月末）

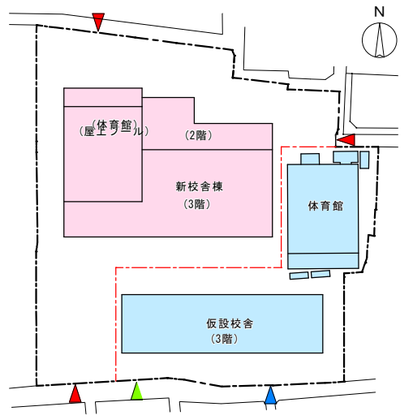

STEP5. 仮設校舎・既存体育館解体

（令和13年1月～令和13年6月末）

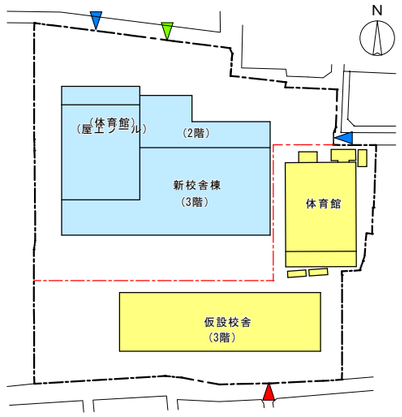

STEP6. 一部新校舎建設・環境整備工事

（令和13年7月～令和14年9月末）

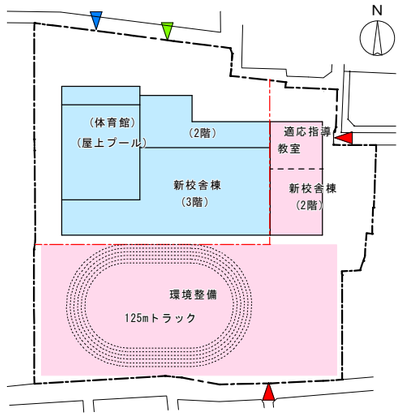

凡例

- ：解体中
- ：使用中
- ：工事中
- ：仮囲い
- ：生徒動線
- ：学校サービス動線
- ：工事動線

0 10 20 50(m)

杉並区立天沼中学校及び併設１施設改築工事に伴う基本設計	Title 工事ステップ図（Ｂ案）（参考図）	Scale 1／2000	No.

既存

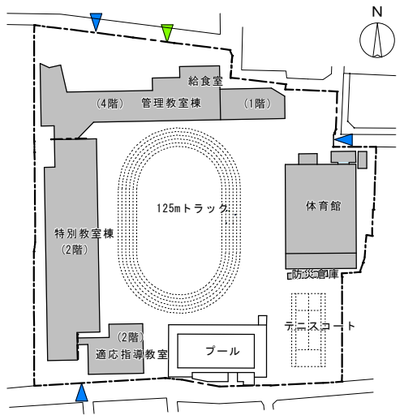

STEP1. ﾌﾟｰﾙ･ﾃﾆｽｺｰﾄ解体

（令和8年10月～令和9年2月末）

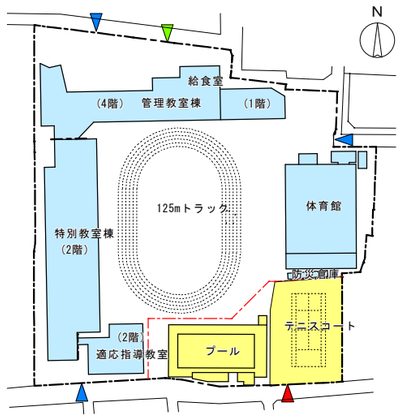

STEP2. 仮設体育館建設

（令和9年4月～令和9年11月末）

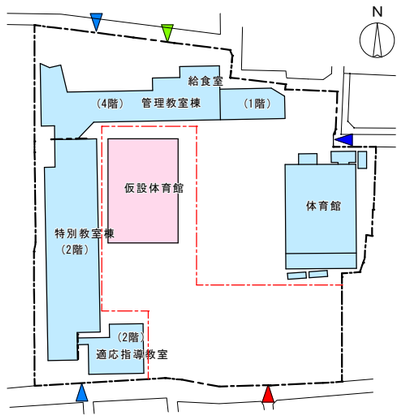

STEP3. 既存体育館解体

（令和10年2月～令和10年5月末）

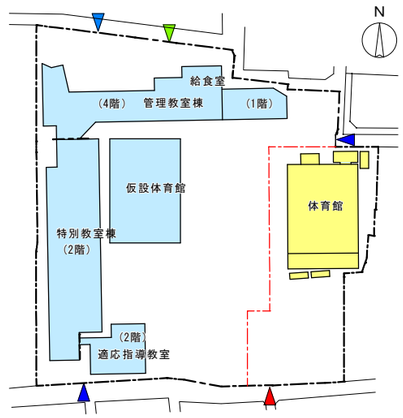

STEP4. 新校舎建設

（令和10年6月～令和12年4月末）

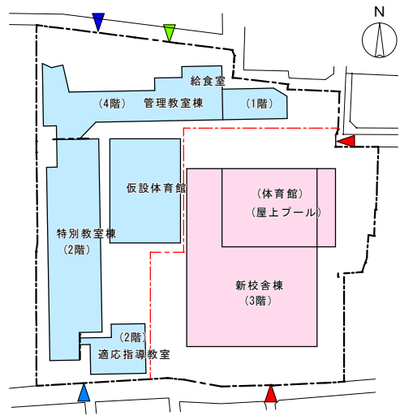

STEP5. 既存校舎･仮設体育館解体

（令和12年7月～令和13年2月末）

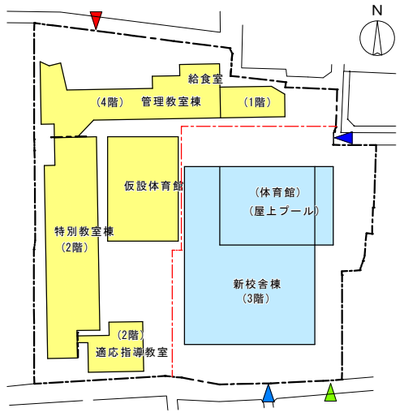

STEP6. 一部新校舎建設･環境整備工事

（令和13年3月～令和14年5月末）

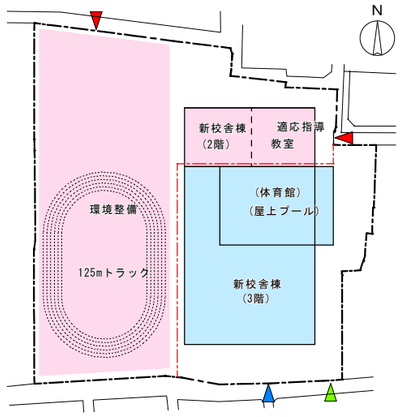

凡例

- ：解体中
- ：使用中
- ：工事中
- ：仮囲い
- ：生徒動線
- ：学校サービス動線
- ：工事動線

0　10　20　50(m)

工事ステップ図（Ｄ案）（参考図）

既存

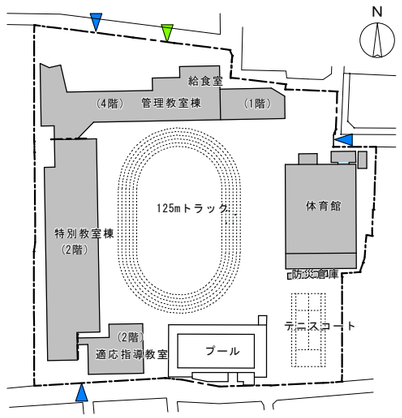

STEP1. ﾌﾟｰﾙ･ﾃﾆｽｺｰﾄ解体

（令和8年10月～令和9年2月末）

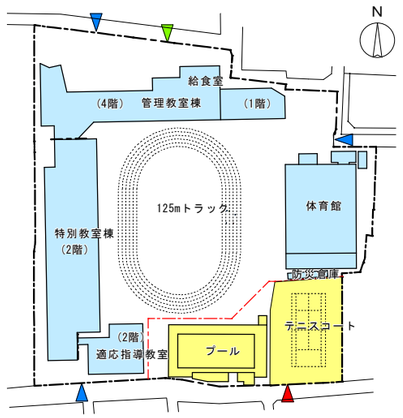

STEP2. 仮設校舎建設

（令和9年4月～令和9年11月末）

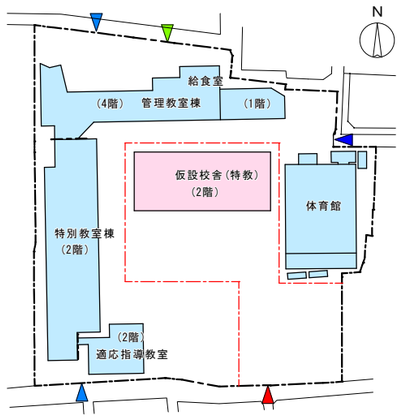

STEP3. 一部既存校舎解体

（令和10年2月～令和10年7月末）

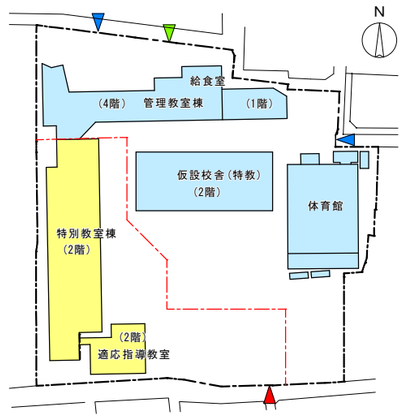

STEP4. 新校舎建設

（令和10年8月～令和12年6月末）

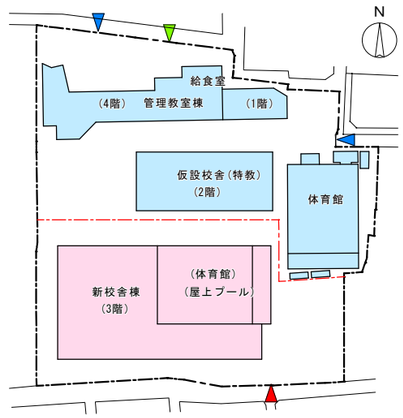

STEP5. 既存校舎･既存体育館解体

（令和12年9月～令和13年2月末）

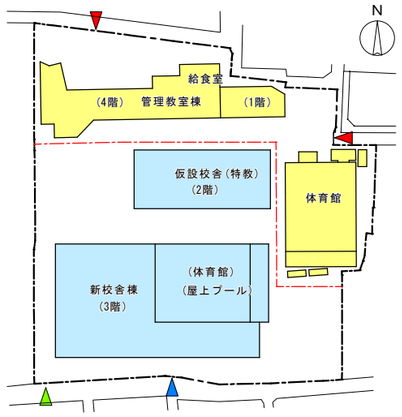

STEP6. 一部新校舎建設

（令和13年3月～令和14年5月末）

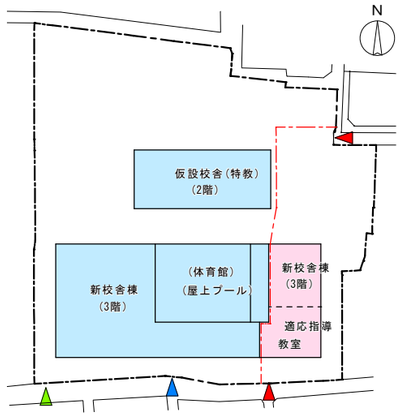

STEP7. 仮設校舎解体

（令和14年7月～令和14年10月末）

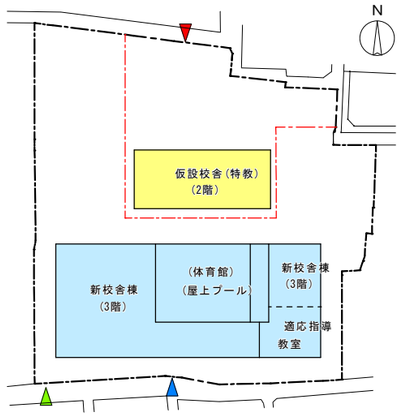

STEP8. 環境整備工事

（令和14年11月～令和15年5月末）

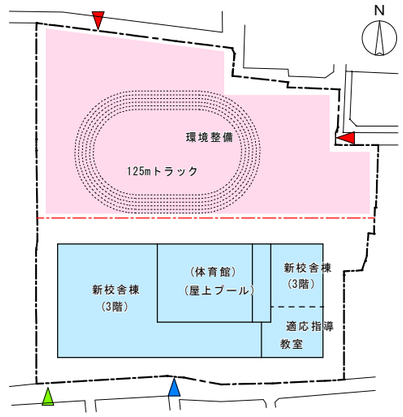

凡例

- ：解体中
- ：使用中
- ：工事中
- ：仮囲い
- ：生徒動線
- ：学校サービス動線
- ：工事動線

0　10　20　50(m)

杉並区立天沼中学校及び併設１施設改築工事に伴う基本設計	Title	工事ステップ図（Ｄ案）（参考図）	Scale	1／2000	No.
