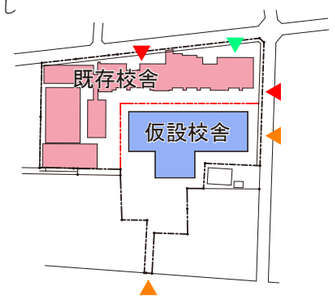
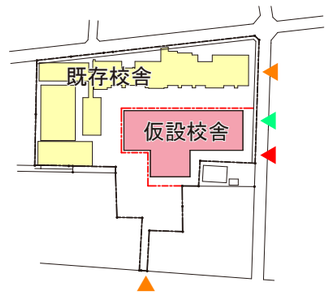
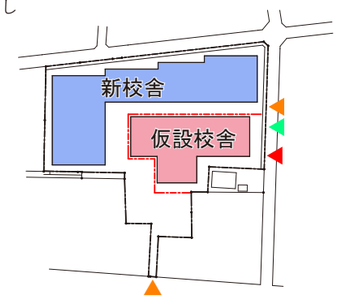
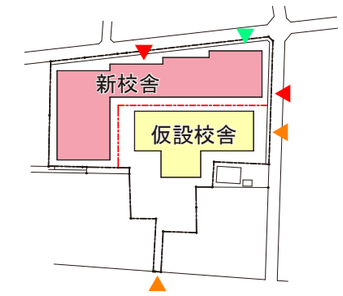
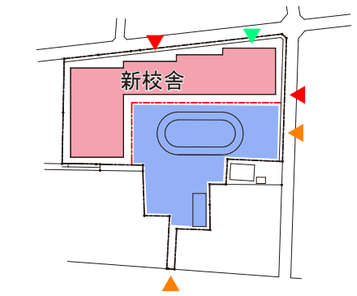
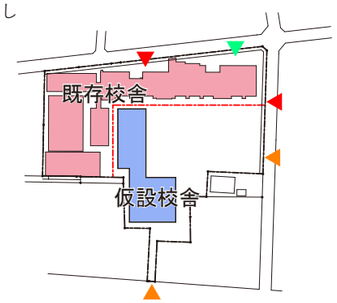
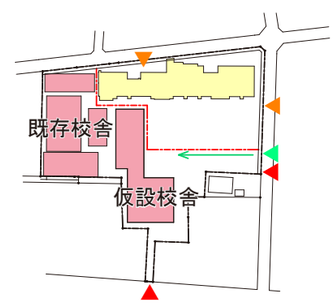
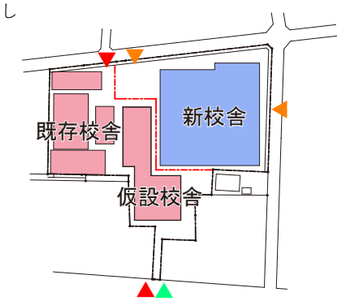
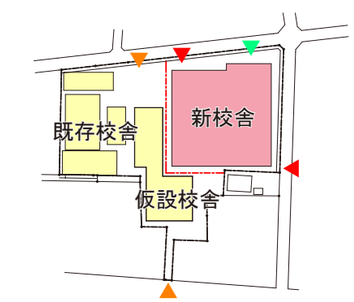
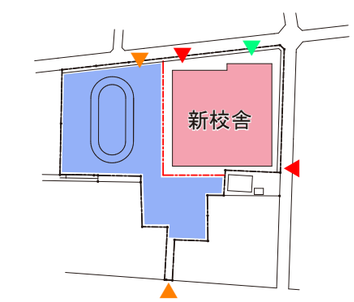
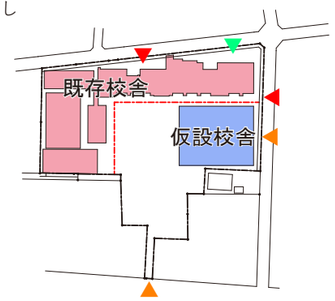
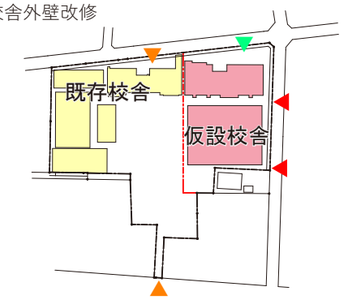
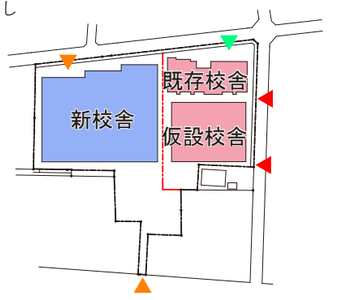
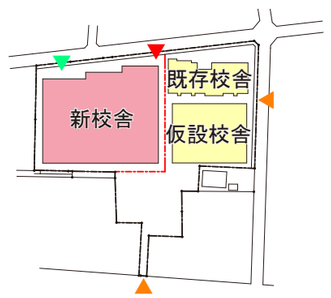
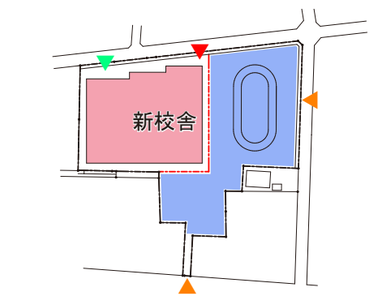
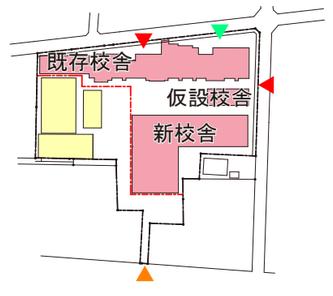
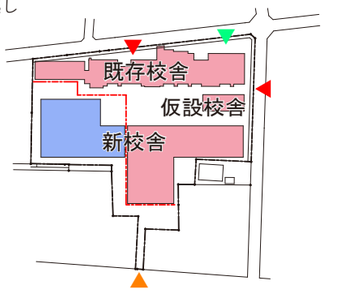
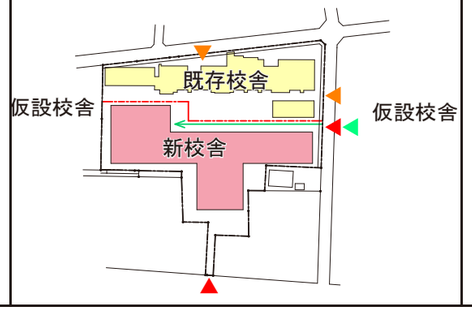
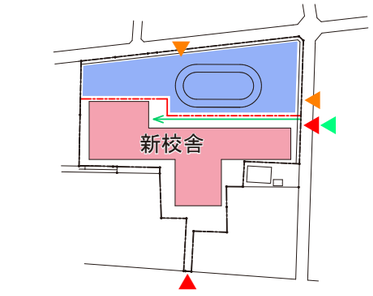
建替え計画

資料７－１

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
A案 北側校舎	・仮設校舎建設 ・引越し 	・既存校舎解体 	・新校舎建設 ・引越し 	・仮設校舎解体 	・環境整備 
B案 東側校舎	・仮設校舎A棟分建設 ・引越し 	・既存校舎A棟解体 	・新校舎建設 ・引越し 	・仮設・既存校舎B~D棟ﾌﾞｰﾙ解体 	・環境整備 
C案 西側校舎	・仮設校舎A棟半分B~D棟分建設 ・引越し 	・既存校舎A棟半分B~D棟ﾌﾞｰﾙ解体 ・既存校舎外壁改修 	・新校舎建設 ・引越し 	・仮設・既存校舎A棟半分解体 	・環境整備 
D案 南側校舎	・仮設校舎D棟分+新校舎建設（半分） ・引越し 	・既存校舎C~D棟ﾌﾞｰﾙ解体 	・新校舎建設（半分） ・引越し 	・仮設・既存校舎（A～B棟）解体 	・環境整備 
凡例	工事中 使用中 解体中	生徒出入口 工事出入口 学校サービス出入口	仮囲い 給食配送車搬入ルート	N	

杉並区立桃井第一小学校及び併設１施設改築工事に伴う基本設計業務委託　　建替え計画　　ＮＳ

株式会社　奥野設計


※本資料は検討段階のものであり、各種手続き・届出等により変更となる可能性があります。

建替え計画　A 案（北側校舎案）

資料７－２


Step 1　仮設校舎建設

・仮設校舎建設
・引越し

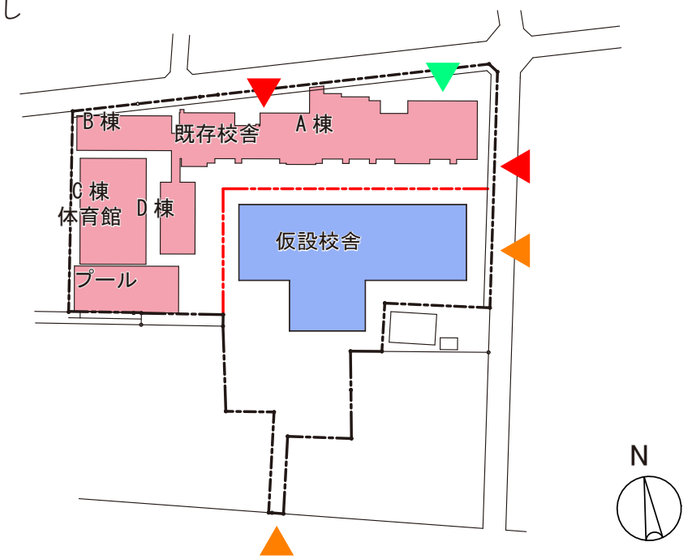


Step 2　既存校舎解体

・既存校舎解体

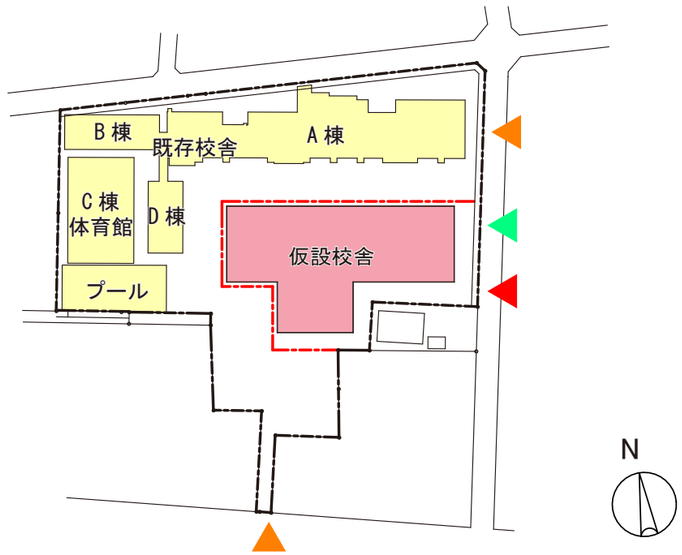


Step 3　新校舎建設

・新校舎建設
・引越し

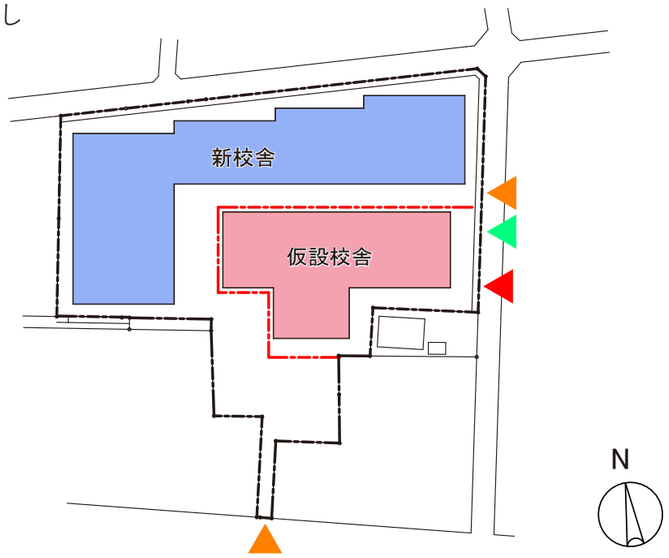


Step 4　仮設校舎解体

・仮設校舎解体

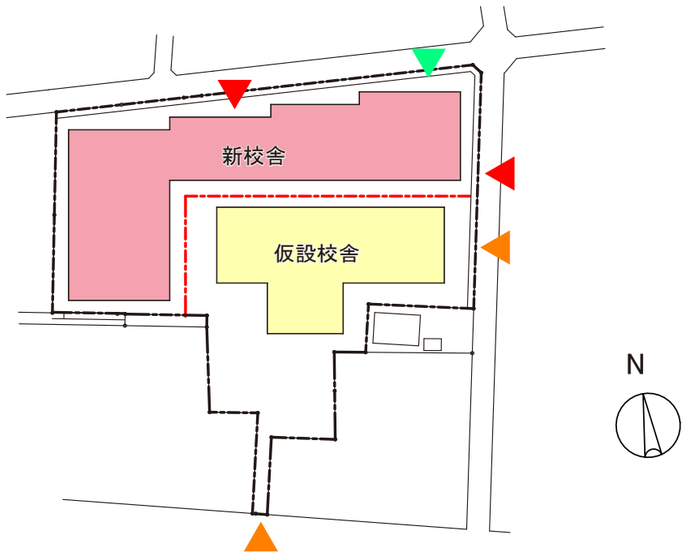

Step 5　環境整備

・環境整備

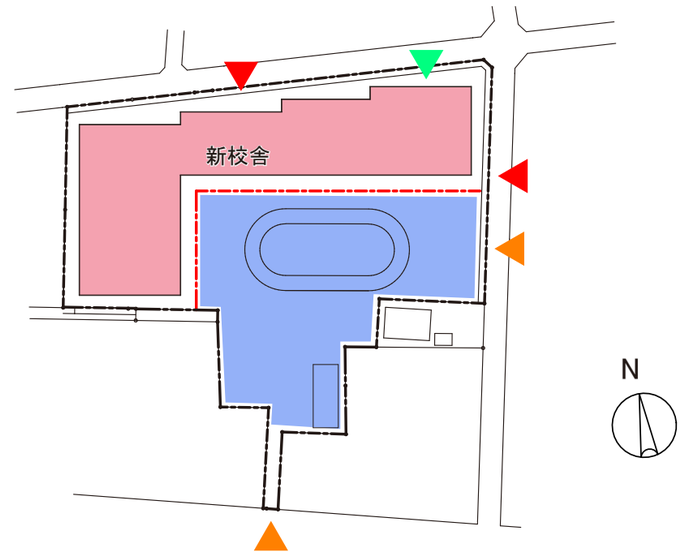

凡例

工事中	生徒出入口	仮囲い
使用中	工事出入口	給食配送車搬入ルート
解体中	学校サービス出入口	


N

建替え計画　B 案（東側校舎案）

資料７－３


Step 1　仮設校舎建設

・仮設校舎（A棟分）建設
・引越し

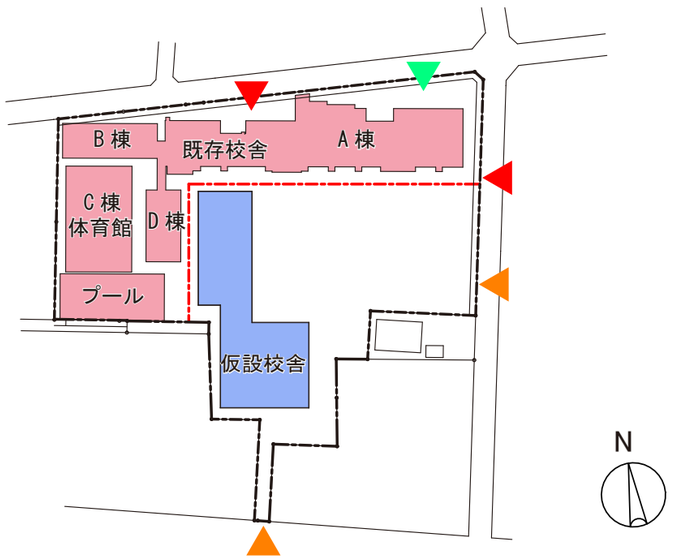


Step 2　既存校舎解体

・既存校舎（A棟）解体

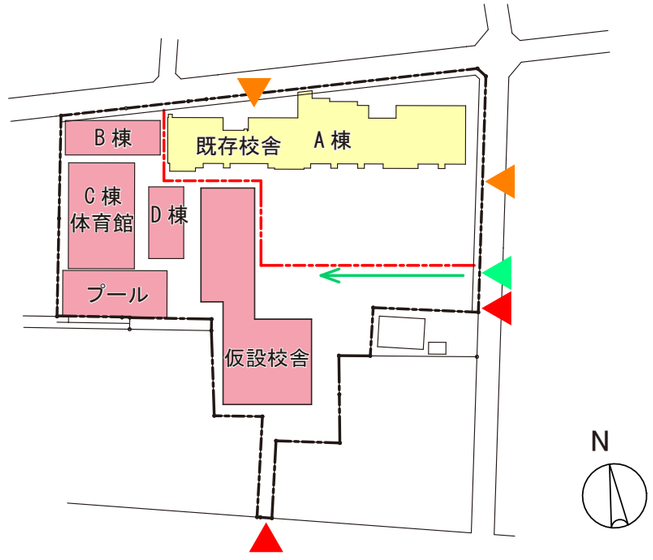


Step 3　新校舎建設

・新校舎建設
・引越し

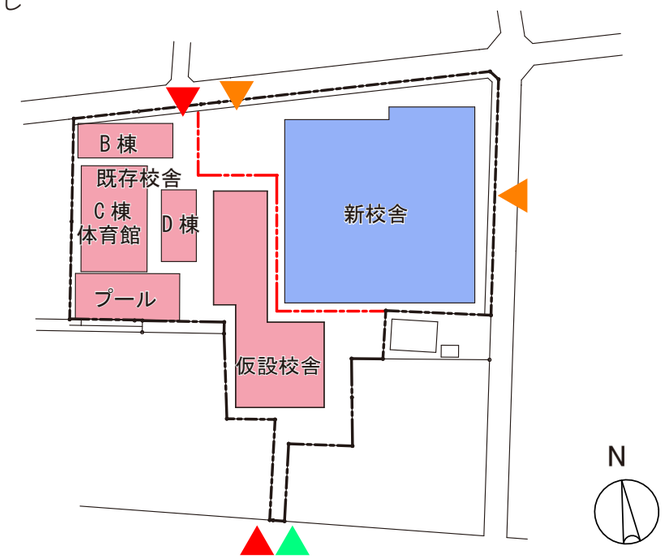


Step 4　仮設・既存校舎解体

・仮設・既存校舎（B~D棟、プール）解体

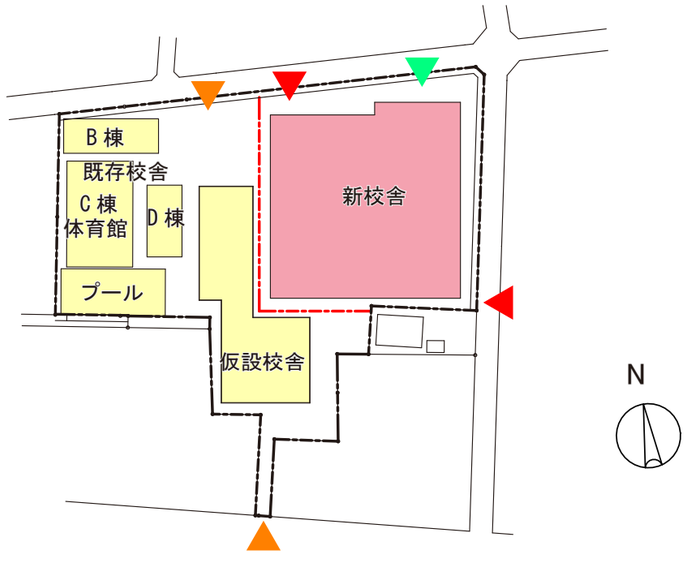

Step 5　環境整備

・環境整備

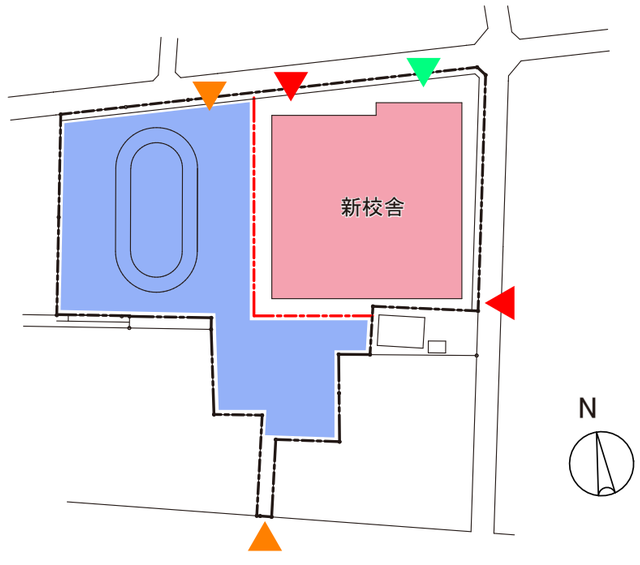

凡例


工事中	生徒出入口	仮囲い
使用中	工事出入口	給食配送車搬入ルート
解体中	学校サービス出入口	

建替え計画　C 案（西側校舎案）

資料７－４


Step 1　仮設校舎建設

・仮設校舎（A棟半分、B~D棟分）建設
・引越し

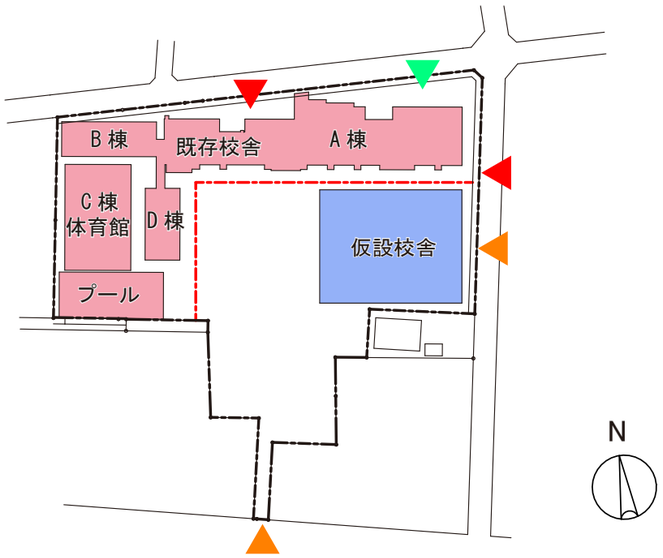


Step 2　既存校舎解体

・既存校舎（A棟半分、B~D棟、プール）解体
・既存校舎外壁改修

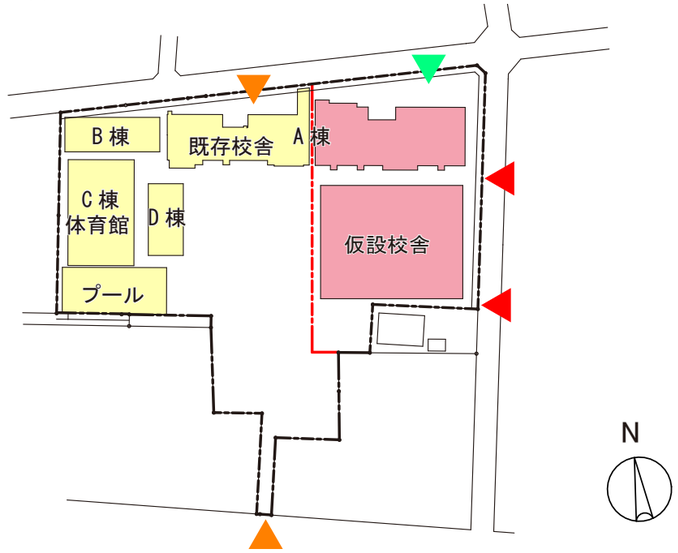


Step 3　新校舎建設

・新校舎建設
・引越し

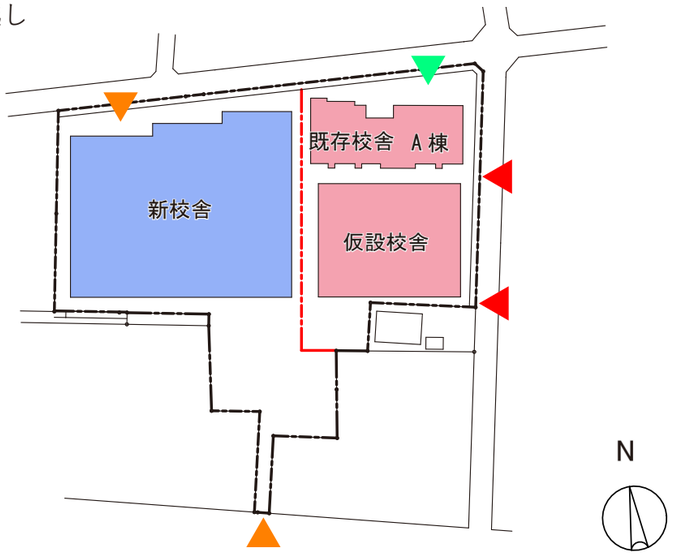


Step 4　仮設・既存校舎解体

・仮設・既存校舎（A棟半分）解体

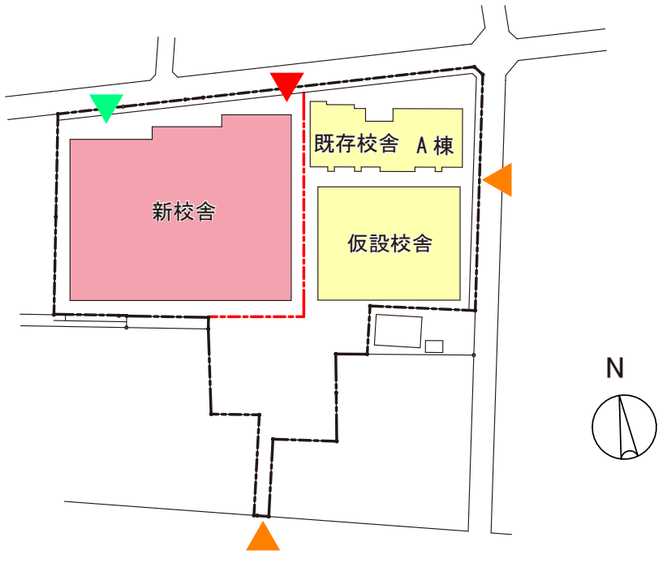

Step 5　環境整備

・環境整備

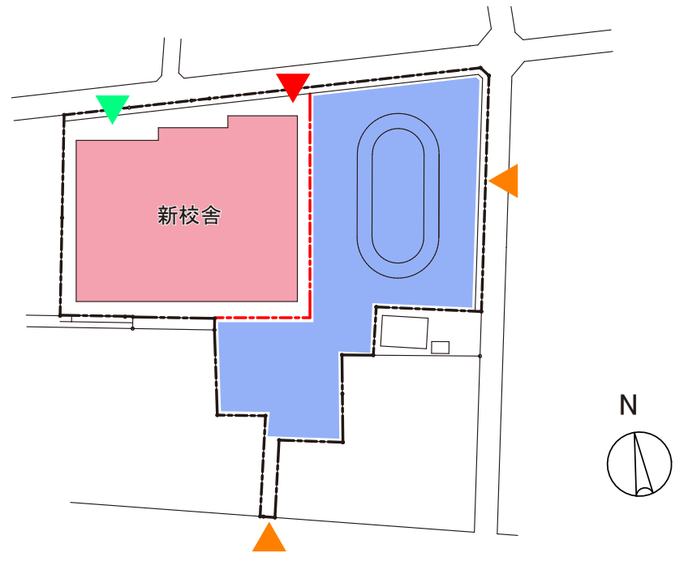

凡例


	工事中		生徒出入口		仮囲い
	使用中		工事出入口		給食配送車搬入ルート
	解体中		学校サービス出入口		

建替え計画　D 案（南側校舎案）

資料７－５


Step 1　新校舎、仮設校舎建設

・新校舎（半分）仮設校舎（D棟分）建設
・引越し

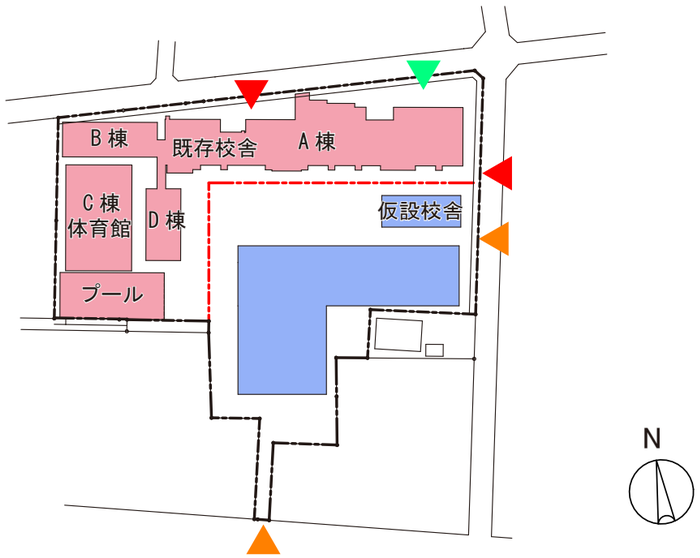


Step 2　既存校舎解体

・既存校舎（C~D棟、プール）解体

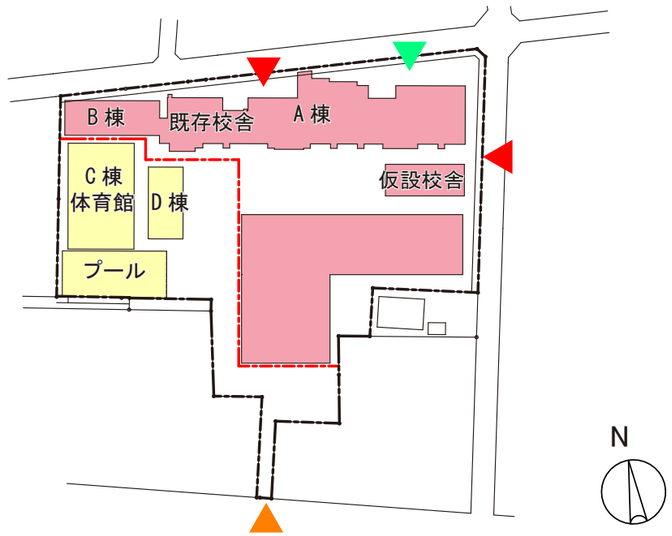


Step 3　新校舎建設

・新校舎建設（半分）
・引越し

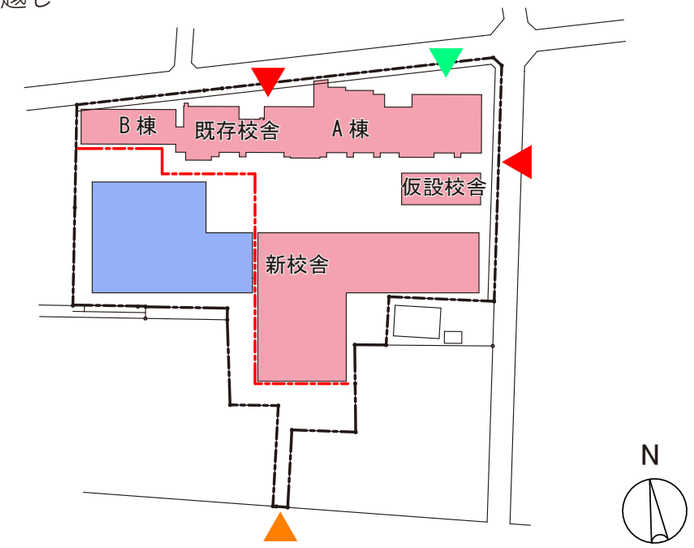


Step 4　仮設・既存校舎解体

・仮設・既存校舎（A棟）解体

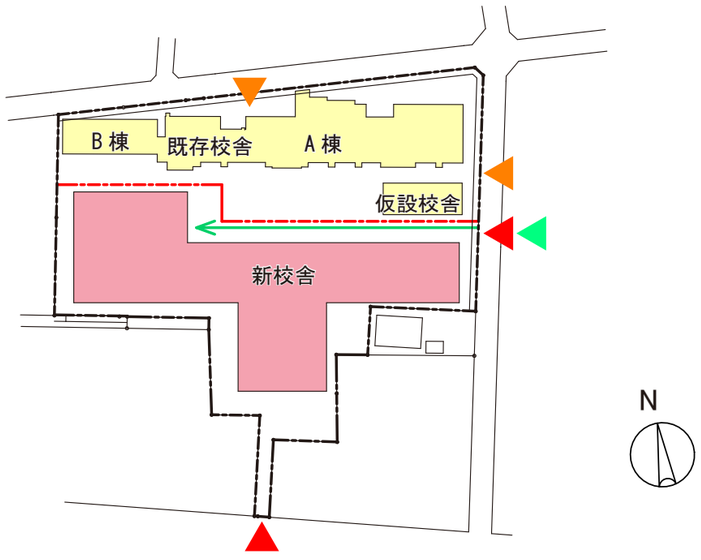

Step 5　環境整備

・環境整備

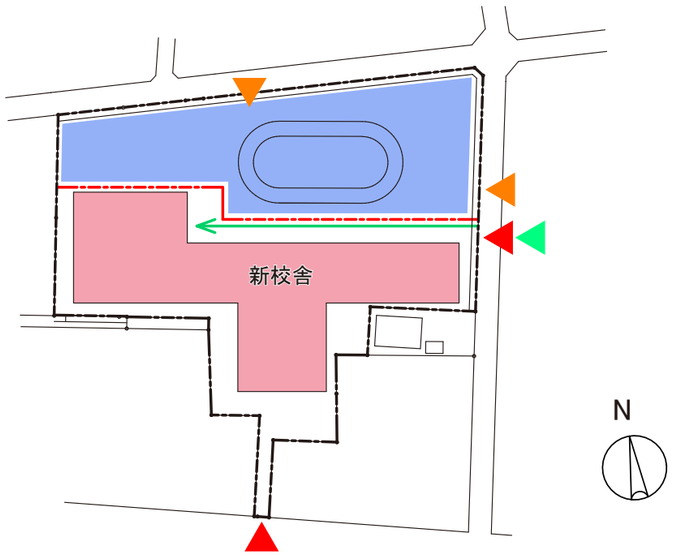

凡例

工事中	生徒出入口	仮囲い
使用中	工事出入口	給食配送車搬入ルート
解体中	学校サービス出入口	
